MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO- RESISTENCIA-LOTE 1

LMCN No.30/2025 ID N°: 475,979 CONTRATO Nº 29/2025

EMPRESA CONTRATISTA: PSL PROVISION DE SERVICIO LOGISTICO

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:05

PERIODO: 06 DE MARZO 2026 - 05 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE PRESENTACION	5/4/2026
FECHA DE INICIO	5/11/2025
PLAZO INICIAL (DIAS)	60
DIAS DE LLUVIA	23
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	83
DIAS TRANSCURRIDOS	152
DIAS DE RETRAZO (PERIODO CERTIF 3)	10
DIAS DE RETRAZO (PERIODO CERTIF 4)	28
DIAS DE RETRAZO (PERIODO CERTIF 5)	31
TOTAL DE DIAS DE RETRAZO	69
FECHA FIN DE PLAZO	26/1/2026

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO- RESISTENCIA-LOTE 1	268.885.000	51,82%	48,18%	100,00%	139.333.376	129.551.624	268.885.000
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	0,05% x dia MULTAS	134.443				**5.108.815**	**4.167.718**	**9.276.533**
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	53.777.000	51,82%	48,18%	100,00%	27.866.675	25.910.325	53.777.000
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	13.444.250	51,82%	48,18%	100,00%	6.966.669	6.477.581	13.444.250
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**67.221.250**	59,42%	54,38%	113,80%	**39.942.159**	**36.555.624**	**76.497.783**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**99.391.217**	**92.996.001**	**192.387.218**

SON GUARANÍES: NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL UNO.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

CERTIFICADO 5 CONST EMPEDRADO LOTE 1 ID 475979

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO- RESISTENCIA-LOTE 1
LMCN No.30/2025 ID N°: 475,979 CONTRATO N° 29/2025
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:05
PERIODO: 06 DE MARZO 2026 - 05 DE ABRIL DE 2026

FECHA DE PRESENTACION	5/4/2026
FECHA DE INICIO	5/11/2025
PLAZO INICIAL (DIAS)	60
DIAS DE LLUVIA	23
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	83
DIAS TRANSCURRIDOS	152
DIAS DE RETRAZO (PERIODO CERTIF 3)	10
DIAS DE RETRAZO (PERIODO CERTIF 4)	28
DIAS DE RETRAZO (PERIODO CERTIF 5)	31
TOTAL DE DIAS DE RETRAZO	69
FECHA FIN DE PLAZO	26/1/2026

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	m2	2671	2.080	5.555.680	2.671,00		2.671,00	5.555.680		5.555.680	100,00%		100,00%
2	Desmonte de terreno - Desmonte de cañerias / traslado y/o reposición de cañerías averiadas desmontes varios	m2	2671	1.456	3.888.976	2.671,00		2.671,00	3.888.976		3.888.976	100,00%		100,00%
3	Cartel con impresion	Unid	1	1.907.848	1.907.848		1,00	1,00		1.907.848	1.907.848		100,00%	100,00%
4	Preparacion de obra - Preparación de terreno para caja de empedrado	m2	2671	3.120	8.333.520	2.671,00		2.671,00	8.333.520		8.333.520	100,00%		100,00%
5	Relleno y compactacion de terreno	m3	800	37.648	30.118.400	300,00	500,00	800,00	11.294.400	18.824.000	30.118.400	37,50%	62,50%	100,00%
6	Construcción de cordón - Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	655	72.800	47.684.000	520,00	135,00	655,00	37.856.000	9.828.000	47.684.000	79,39%	20,61%	100,00%
7	Construccion de cordon - Provision y colocacion de cordón simple prefabricado de hormigón	ml	46	44.200	2.033.200		46,00	46,00		2.033.200	2.033.200		100,00%	100,00%
8	Construccion de cuneta - Construccion de baden de H°A° de 20 cm. de espesor ancho 2,00m.	m3	10,8	1.976.000	21.340.800		10,80	10,80		21.340.800	21.340.800		100,00%	100,00%
9	Relleno y compactacion de terreno - Relleno lateral de contencion de cordon	m2	120	28.080	3.369.600	60,00	60,00	120,00	1.684.800	1.684.800	3.369.600	50,00%	50,00%	100,00%
10	Construcción de empedrado - Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50%)	m2	2671	44.200	118.058.200	1.600,00	1.071,00	2.671,00	70.720.000	47.338.200	118.058.200	59,90%	40,10%	100,00%
11	Construcción de empedrado - Compactación manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final	m2	2671	3.224	8.611.304		2.671,00	2.671,00		8.611.304	8.611.304		100,00%	100,00%
12	Construcción de empedrado - Ripiado final con ripio basáltico, piedra VI	m2	2671	3.328	8.889.088		2.671,00	2.671,00		8.889.088	8.889.088		100,00%	100,00%
13	Construccion de muro - Muro de P.B.C	m3	4,5	416.000	1.872.000		4,50	4,50		1.872.000	1.872.000		100,00%	100,00%
14	Limpieza de obra- retiro de escombros y entrega de obra	m2	2671	2.704	7.222.384		2,671,00	2.671,00		7.222.384	7.222.384		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**268.885.000**				**139.333.376**	**129.551.624**	**268.885.000**	**51,82%**	**48,18%**	**100,00%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO-RESISTENCIA-LOTE 1

LMCN No.30/2025 ID N°: 475,979 CONTRATO N° 29/2025

EMPRESA CONTRATISTA: PSL PROVISION DE SERVICIO LOGISTICO

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:05

PERIODO: 06 DE MARZO 2026 - 05 DE ABRIL DE 2026

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 05 días del mes de abril del año 2026, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA PSL PROVISION SERVICIO Y LOGISTICA, REPRESENTADA POR el ABOG. LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO y la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	m2	2.671,00	2671,00		2671,00
2	Desmonte de terreno - Desmonte de cañerias / traslado y/o reposición de cañerías averiadas desmontes varios	m2	2.671,00	2671,00		2671,00
3	Cartel con impresion	Unid	1,00		1,00	1,00
4	Preparacion de obra - Preparación de terreno para caja de empedrado	m2	2.671,00	2671,00		2671,00
5	Relleno y compactacion de terreno	m3	800,00	300,00	500,00	800,00
6	Construcción de cordón - Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	655,00	520,00	135,00	655,00
7	Construccion de cordon - Provision y colocacion de cordón simple prefabricado de hormigón	ml	46,00		46,00	46,00
8	Construccion de cuneta - Construccion de baden de H°A° de 20 cm. de espesor ancho 2,00m.	m3	10,80		10,80	10,80
9	Relleno y compactacion de terreno - Relleno lateral de contencion de cordon	m2	120,00	60,00	60,00	120,00
10	Construcción de empedrado - Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50%)	m2	2.671,00	1600,00	1.071,00	2671,00
11	Construcción de empedrado - Compactación manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final	m2	2.671,00		2.671,00	2671,00
12	Construcción de empedrado - Ripiado final con ripio basáltico. piedra VI	m2	2.671,00		2.671,00	2671,00
13	Construccion de muro - Muro de P.B.C	m3	4,50		4,50	4,50
14	Limpieza de obra- retiro de escombros y entrega de obra	m2	2.671,00		2.671,00	2671,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO- RESISTENCIA-LOTE 1

LMCN No.30/2025 ID N°: 475,979 CONTRATO N° 29/2025

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA:	OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO- RESISTENCIA-LOTE 1
MONTO TOTAL DE OBRA Gs	**268.885.000**
TIEMPO DE EJECUCION	**60 días**

ITEM	DESCRIPCIÓN	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	Monto	%
		30 días	60 días	90 días	120 días	150 días		
1	Replanteo y marcación						5.555.680	2,07
2	Desmonte de terreno - Desmonte de cañerias / traslado y/o reposición de cañerias averiadas						3.888.976	1,45
3	Cartel con impresion						1.907.848	0,71
4	Preparacion de obra - Preparación de terreno para caja de empedrado						8.333.520	3,10
5	Relleno y compactacion de terreno						30.118.400	11,20
6	Construcción de cordón - Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormiqón						47.684.000	17,73
7	Construccion de cordon - Provision y colocacion de cordón simple prefabricado de hormiqón						2.033.200	0,76
8	Construccion de cuneta - Construccion de baden de H°A° de 20 cm. de espesor ancho 2.00m.						21.340.800	7,94
9	Relleno y compactacion de terreno - Relleno lateral de contencion de cordon						3.369.600	1,25
10	Construcción de empedrado - Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO						118.058.200	43,91
11	Construcción de empedrado - Compactación manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final						8.611.304	3,20
12	Construcción de empedrado - Ripiado final con ripio basáltico, piedra VI						8.889.088	3,31
13	Construccion de muro - Muro de P.B.C						1.872.000	0,70
14	Limpieza de obra- retiro de escombros y entrega de						7.222.384	2,69
	TOTAL						268.885.000	#####

Contractual					
Monto Bruto Mensual Contractual	134.442.500	134.442.500	0	0	0
Porcentaje Avance Mensual Contractual	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Certificado					
Monto Bruto Mensual Certificado	17.778.176	14.560.000	65.582.400	41.412.800	129.551.624
Porcentaje Avance Mensual Certificado	6,61%	5,41%	24,39%	15,40%	48,18%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	6,61%	12,03%	36,42%	51,82%	100,00%

	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4	Mes5
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	50,00%	100,00%			
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	6,61%	12,03%	36,42%	51,82%	100,00%

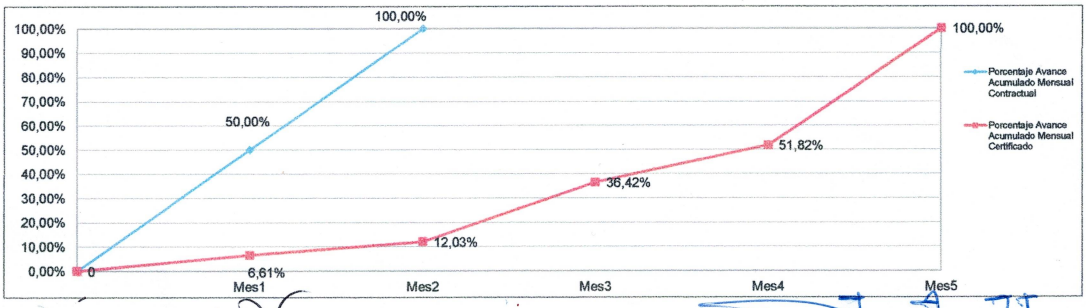

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego N. Yardez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570
