MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

(0767) 240 219 - 0985 700977
municipalidad@bellavista.gov.py
0404/2024 www.bellavista.gov.py
Ruta VI-Km 45-Bella Vista-Itapúa-Paraguay

Bella Vista, 09 de Octubre de 2024

Señor:
Euclides De Godois
Intendente Municipal
Bella Vista
Presente:

Tenemos a bien dirigimos a Usted a fin de poner a su consideración el siguiente:

INFORME TECNICO FINANCIERO

Con Referencia: REGULARIZACION ASFALTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO SECTOR BARRIO SAN JOSE A BARRIO FLORIDA, **Contrato N° 12-2024 ID: 442.356**, que está siendo Ejecutada por la Empresa TECNOEDIL S.A CONSTRUCTORA, representada por el Sr Rolando Rios Tomboly, con un Plazo de 30 días corridos.

En Fecha la obra se encuentra con un avance de 100 %, cumpliendo con lo establecido en los planos y Contratos.

INFORME FINANCIERO

Contrato Adjudicado – Fecha 21/08/2024 ..... 804.724.200.-

Certificado N°1 – Recepción Provisoria de Obra 764.487.990.-

Saldo a Cobrar 40.236.210.-

Obs:

Fondo de Reparo 5% 40.236.210.-

Pago a efectuarse en concepto de Certificado N° 1 – Recepción Provisoria de Obra, la suma de Guaraníes Setecientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos noventa **(Gs 764.487.990).**

Sin otro Particular le Saludo Atentamente

Ing. Rene Ayala
Fiscal de Obras

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

Recibido: 14/11/2024

ARCHIVOS FOTOGRAFICOS

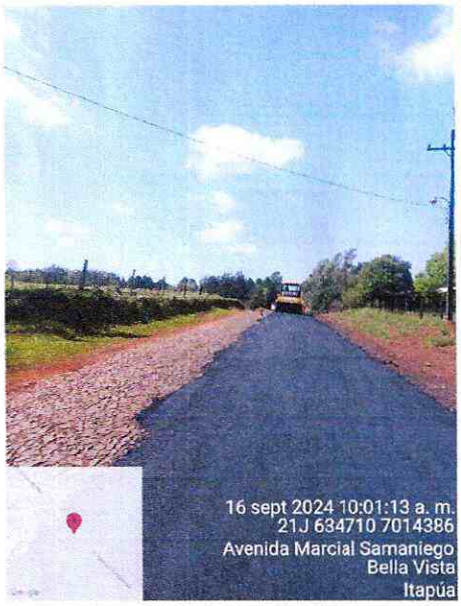

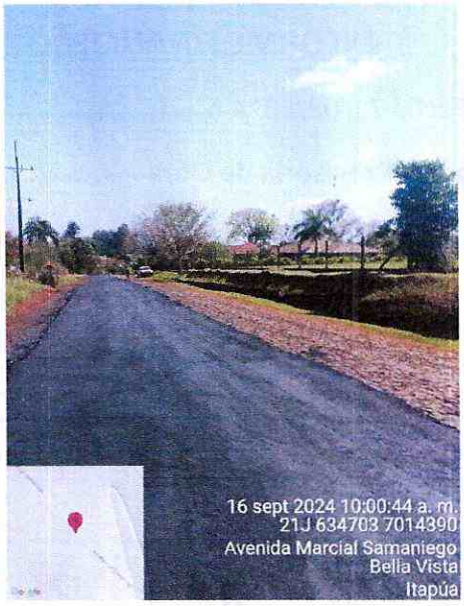

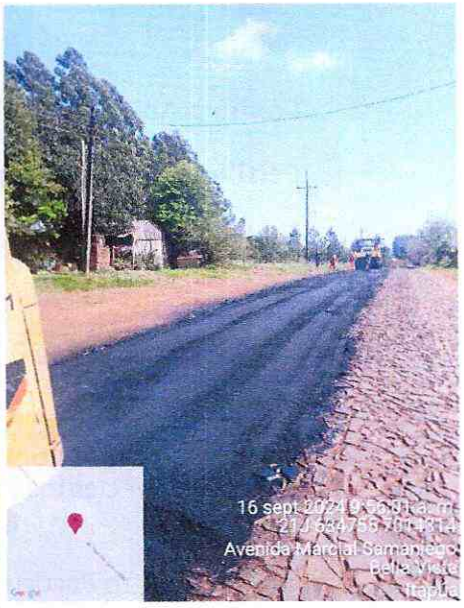

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ing. René Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

MUNICIPALIDAD
Bella Vista
ITAPÚA - PARAGUAY

(0767) 240 219 - 0985 700977
municipalidad@bellavista.gov.py
0404/2024 www.bellavista.gov.py
Ruta VI-Km 45-Bella Vista-Itapúa-Paraguay

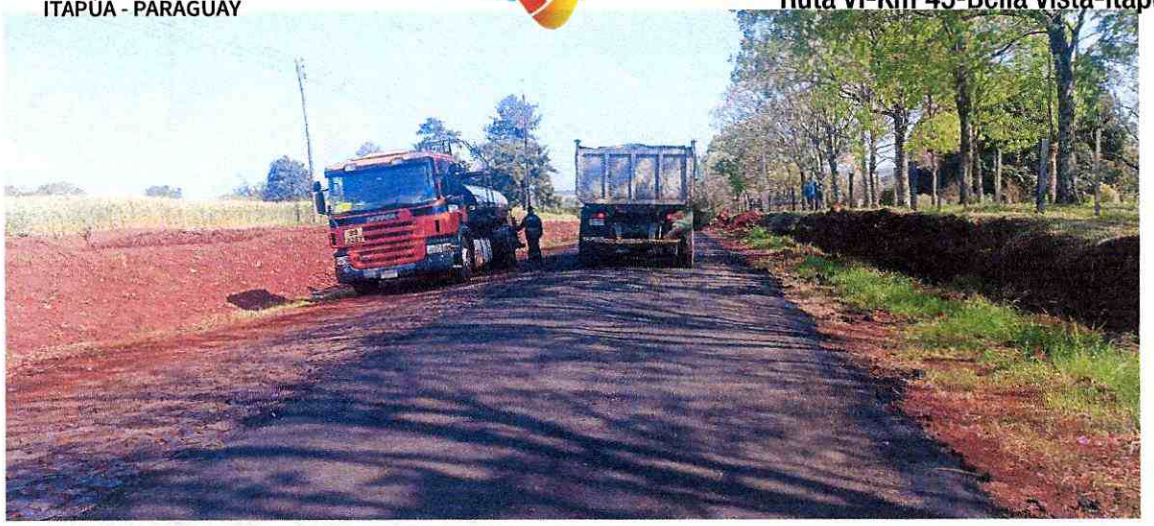

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD

Ing. René Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

ACTA DE MEDICION

En la localidad de Bella Vista, a los 28 días del mes de septiembre del año 2024, se reunen los representantes de la Fiscalización de Obras y de la Empresa Contratista **TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA**, a los efectos de realizar las mediciones del Certificado de Obras Nº 01, correspondiente de las Obras de REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE - AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO, SECTOR BARRIO SAN JOSÉ A BARRIO FLORIDA- BELLA VISTA

REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE - AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO, SECTOR BARRIO SAN JOSÉ A BARRIO FLORIDA- BELLA VISTA

UBICACION: Municipio de Bella Vista.

PLANILLA 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Limpieza de obra	m2	18.900,00	-	18.900,00	18.900,00
2	Mantenimiento/reparación	m2	18.900,00	-	18.900,00	18.900,00

Ing. Claudia Benitez
TECNOEDIL S.A.

Ing. Claudia Benitez
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Representante Técnico

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
1918
MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ing. René Ayala
Director de Dpto. de obras
Municipalidad de Bella Vista

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista

REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA SOBRE EMPEDRADO EXISTENTE - AVENIDA GENERAL MARCIAL SAMANIEGO, SECTOR BARRIO SAN JOSÉ A BARRIO FLORIDA- BELLA VISTA

CONTRATISTA : TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA

FECHA DE PRESENTACIÓN	1/10/2024
FECHA DE INICIO	1/9/2024
PLAZO INICIAL	30 días
DÍAS DE LLUVIA	-
PLAZO PRORROGADO	
DIAS TRANSCURRIDOS	28días

CERTIFICADO Nº 1

ITEM	RUBRO	UNID.	CANT.	SEGÚN CONTRATO		CANTIDADES			MONTOS		
				P. UNIT.	P. TOTAL	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Limpieza de obra	m2	18.900,00	1.332	25.174.800	-	18.900,00	18.900,00	-	25.174.800	25.174.800
2	Mantenimiento/reparación	m2	18.900,00	41.246	779.549.400	-	18.900,00	18.900,00	-	779.549.400	779.549.400
TOTAL CONTRATO					804.724.200						

Total certificación	-	804.724.200	804.724.200
Deducción de anticipo 20%		-	-
Retención fondo de reparo 5%		40.236.210	40.236.210
Total Neto a cobrar	**-**	**764.487.990**	**764.487.990**

Son Guaranies: Setecientos Sesenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Novecientos Noventa.....

Ing. Claudia Benítez
TECNOEDIL S.A

Ing. Claudia Benítez
TECNOEDIL S.A. CONSTRUCTORA
Representante Técnico

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALIDAD DE BELLA VISTA

Ing. René Ayala
Director de Dpto. de obras
Municipalidad de Bella Vista

Ing. Rene Ayala Maidana
Dirección de Obras y Servicios
Municipalidad de Bella Vista
