GOBERNACION DE ITAPÚA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 1

Mes: Diciembre - Enero

CONCURSO DE OFERTAS Nº: 31/2023 - "Construcción de Empedrado en Obligado Km. 17, Calle Fulgencio Yegros." - Plurianual con ID: 435.864									
Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	CONCURSO DE OFERTAS Nº: 31/2023 - "Construcción de Empedrado en Obligado Km. 17, Calle Fulgencio Yegros." - Plurianual con ID: 435.864	100%	215.289.413	0,00%	0	15,37%	33.096.534	15,37%	33.096.534
A	**Total por Contrato**	**100%**	**215.289.413**	**0,00%**	**0**	**15,37%**	**33.096.534**	**15,37%**	**33.096.534**

Certificado Básico Nº	**1**
Mes:	**Diciembre - Enero**
Contrato N°:	**93/23**
Monto Básico:	**215.289.413**
Contratista:	**JL Y COMPAÑÍA S.A**
Fecha de Inicio:	**18-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**120 dias**
Fecha de terminación prevista:	**15-abr-24**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.

B	Deducciones a la fecha			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	43.057.883	0	6.619.307	6.619.307
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**43.057.883**	**0**	**6.619.307**	**6.619.307**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				26.477.227	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**26.477.227**	

SON GUARANIES: Veintiseis millones cuatrocientos setenta y siete mil doscientos veintisiete.

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

JL Y COMPAÑÍA S.A
Contratista-Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaria de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

2000000

(2)

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Diciembre - Enero

CONCURSO DE OFERTAS Nº: 31/2023 - "Construcción de Empedrado en Obligado Km. 17, Calle Fulgencio Yegros." - Plurianual con ID: 435.864			
CONTRATISTA:	JL Y COMPAÑÍA S.A	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	215.289.413	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	15-abr-24
CONTRATO N°:	93/23	**PRÓRROGA:**	.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120 dias	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	.

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
CONCURSO DE OFERTAS Nº: 31/2023 - "Construcción de Empedrado en Obligado Km. 17, Calle Fulgencio Yegros." - Plurianual con ID: 435.864							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1,00	1.053.816	1.053.816	0,005	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,005	0,005	0,00	1,00	1,00	0	1.053.816	1.053.816
2	Movilización, carteles de seguridad y señalización de obra	Unidad Medida Global	1,00	3.661.882	3.661.882	0,017	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,017	0,017	0,00	1,00	1,00	0	3.661.882	3.661.882
3	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación.	Metro lineal	500,00	7.604	3.802.000	0,018	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,018	0,018	0,00	500,00	500,00	0	3.802.000	3.802.000
4	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	700,00	18.638	13.046.600	0,061	0,00%	50,00%	50,00%	-	0,030	0,030	0,00	350,00	350,00	0	6.523.300	6.523.300
5	Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	15	35.864	537.960	0,002	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,002	0,002	0,00	15,00	15,00	0	537.960	537.960
6	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado.	Metros cuadrados	3350,00	29.463	98.701.050	0,458	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7	Provisión de tierra para colchón de empedrado - Construcción de empedrado.	Metros cúbicos	3350,00	4.801	16.083.350	0,075	0,00%	6,33%	6,33%	-	0,005	0,005	0,00	212,16	212,16	0	1.018.596	1.018.596
8	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado - Construcción de empedrado.	Metros cuadrados	3350,00	2.267	7.594.450	0,035	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
9	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck=180 kg/cm²). Construcción de empedrado.	Metros cúbicos	45,00	968.277	43.572.465	0,202	0,00%	33,33%	33,33%	-	0,067	0,067	0,00	15,00	15,00	0	14.524.155	14.524.155
10	Alcantarillado Tubular de 1,20 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. - Construcción de empedrado.	Metro lineal	12,00	910.402	10.924.824	0,051	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11	Losa de H°A° (fck=210 kg/cm²), doble armadura con malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de alcantarillado celular y tubos. - Construcción de empedrado.	Metros cúbicos	2,59	1.883.700	4.878.783	0,023	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Muro de piedra bruta colocada esp. 50cm - Construcción de empedrado.	Metros cúbicos	17,55	426.358	7.482.583	0,035	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Limpieza inicial y final de obra.	Metros cuadrados	3350,00	1.179	3.949.650	0,018	0,00%	50,00%	50,00%	-	0,009	0,009	0,00	1.675,00	1.675,00	0	1.974.825	1.974.825
Total					**215.289.413**	**100%**				**0,00%**	**15,37%**	**15,37%**				**0**	**33.096.534**	**33.096.534**

J. L. Y COMPAÑIA S.A.
RUC 80[illegible]42-0
JL Y COMPAÑÍA S.A
Contratista-Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPUA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

(2)

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Diciembre - Enero

CONCURSO DE OFERTAS Nº: 31/2023 - "Construcción de Empedrado en Obligado Km. 17, Calle Fulgencio Yegros." - Plurianual con ID: 435.864

Contrato N°: 93/23			
Monto del Contrato:	215.289.413	**Fecha de terminación prevista:**	15-abr-24
Plazo Contractual:	120 dias	**Prórroga:**	.
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	.

CUADRO DE AVANCE								
MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	8.517.698	8.517.698	10.000.000	10.000.000	3,96%	3,96%	4,64%	4,64%
Enero	12.959.529	21.477.227	23.096.534	33.096.534	6,02%	9,98%	10,73%	15,37%
Febrero	86.508.991	107.986.218			40,18%	50,16%		
Marzo	74.447.730	182.433.948			34,58%	84,74%		
Abril	32.855.465	215.289.413			15,26%	100,00%		

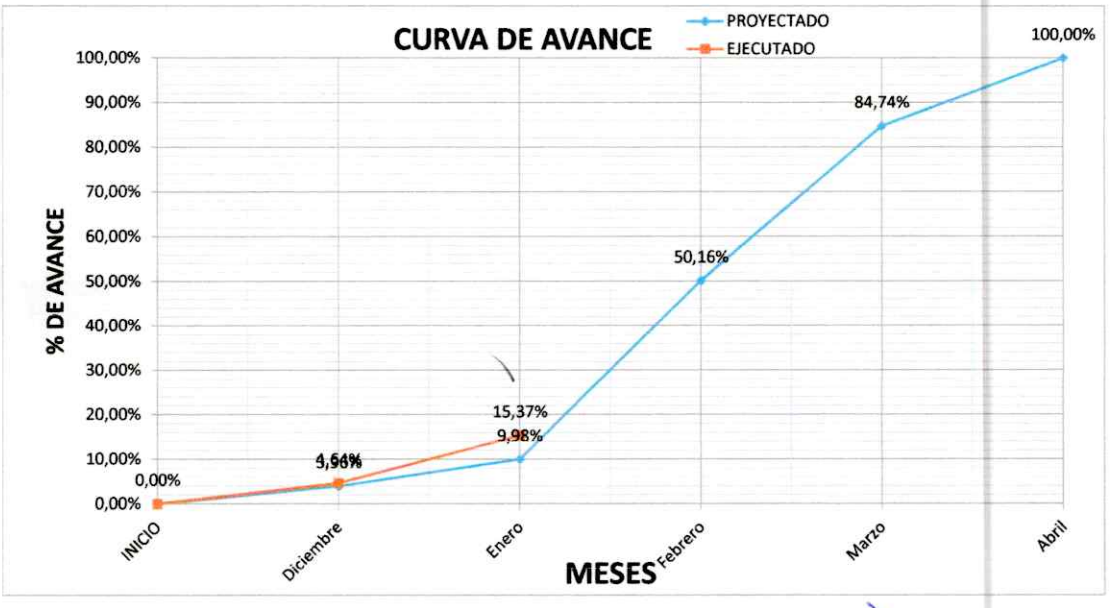

J. L. Y COMPAÑÍA S.A.
RUC: 80077342-0

JL Y COMPAÑÍA S.A
Contratista-Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernacion de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 1

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Diciembre - Enero

CONCURSO DE OFERTAS Nº: 31/2023 - "Construcción de Empedrado en Obligado Km. 17, Calle Fulgencio Yegros." - Plurianual con ID: 435.864			
CONTRATISTA:	JL Y COMPAÑÍA S.A	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA GS:	215.289.413	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	15-abr-24
CONTRATO N°:	93/23	**PRÓRROGA:**	.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120 días	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	.

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

CONCURSO DE OFERTAS Nº: 31/2023 - "Construcción de Empedrado en Obligado Km. 17, Calle Fulgencio Yegros." - Plurianual con ID: 435.864						PLAZO DE EJECUCIÓN					TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	
1	Cartel de Obra (2x1,5)	Unidad	1,00	1.053.816	1.053.816	1.053.816					0,49%
2	Movilización, carteles de seguridad y señalización de obra	Unidad Medida Global	1,00	3.661.882	3.661.882	3.661.882					1,70%
3	Relevamiento topografico, incluye replanteo y marcación.	Metro lineal	500,00	7.604	3.802.000	3.802.000					1,77%
4	Apertura de caja y traslado de materiales sobrantes.	Metros cúbicos	700,00	18.638	13.046.600		4.523.300	8.523.300			6,06%
5	Terraplen: Relleno de tierra y compactación, capas de 25cm.	Metros cúbicos	15	35.864	537.960			537.960			0,25%
6	Empedrado de piedra basalto - Construcción de empedrado.	Metros cuadrados	3350,00	29.463	98.701.050			49.350.525	49.350.525		45,85%
7	Provisión de tierra para colchón de empedrado - Construcción de empedrado.	Metros cúbicos	3350,00	4.801	16.083.350		746.911	7.668.220	7.668.219		7,47%
8	Compactación de empedrado (sellado, 1ra, 2da y 3ra compactación final). Incluye relleno de tierra sobre empedrado - Construcción de empedrado.	Metros cuadrados	3350,00	2.267	7.594.450					7.594.450	3,53%
9	Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck=180 kg/cm²). Construcción de empedrado.	Metros cúbicos	45,00	968.277	43.572.465		5.714.493	20.428.986	17.428.986		20,24%
10	Alcantarillado Tubular de 1,20 m de diámetro, incluye provisión, excavación, colocación de tubos y base de H° pobre. - Construcción de empedrado.	Metro lineal	12,00	910.402	10.924.824					10.924.824	5,07%
11	Losa de H°A° (fck=210 kg/cm²), doble armadura con malla Ø 8 cada 20cm, sobre linea de alcantarillado celular y tubos. - Construcción de empedrado.	Metros cúbicos	2,59	1.883.700	4.878.783					4.878.783	2,27%
12	Muro de piedra bruta colocada esp. 50cm - Construcción de empedrado.	Metros cúbicos	17,55	426.358	7.482.583					7.482.583	3,48%
13	Limpieza inicial y final de obra.	Metros cuadrados	3350,00	1.179	3.949.650		1.974.825			1.974.825	1,83%
	Total				**215.289.413**						100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						8.517.698	12.959.529	86.508.991	74.447.730	32.855.465	**215.289.413**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						3,96%	6,02%	40,18%	34,58%	15,26%	**100%**

J. L. Y COMPAÑÍA S.A.
RUC: 80077[illegible]-0

JL Y COMPAÑÍA S/A
Contratista-Representante Legal

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaria de Obras Publicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

9000000.0

6

FISCALIZACIÓN DE OBRAS
INFORME DE CERTIFICADO Nº01 – MES DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024

SOLICITANTE / BENEFICIARIO: Calle Fulgencio Yegros - Obligado
OBRA: Construcción de 500,00 ml de pavimento pétreo tipo empedrado

UBICACIÓN: Km 17 - Calle Fulgencio Yegros	**DISTRITO:** Obligado	**COORDENADAS UTM:** 626948 - 7016123	**MONTO DE LA OBRA:** 215.289.413 gs.
EMPRESA CONTRATISTA: JL y cñia S.A. – Ing. Diego Jara Estigarribia	**Nº DE TELÉFONO:** 0983-578-600 – Ing. Diego Jara	**Nº CONTRATO / ID:** 93/2023 / 435.864	**FECHA DE INICIO:** 18/12/23
MODALIDAD / LOTE: LCO Nº 31/2023 / Lote: 2	**PLAZO CONTRACTUAL:** 120 DÍAS CALENDARIO	**TERMINACIÓN PREVISTA:** 16/04/24	**PRÓRROGA:** - **TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:** -

FECHA DE VISITA: 30 de enero 2024
AVANCE DE OBRA: 15,37%

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra con buen avance, dentro del plazo de ejecución cumpliendo con el avance previsto por encima de la curva proyectada.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

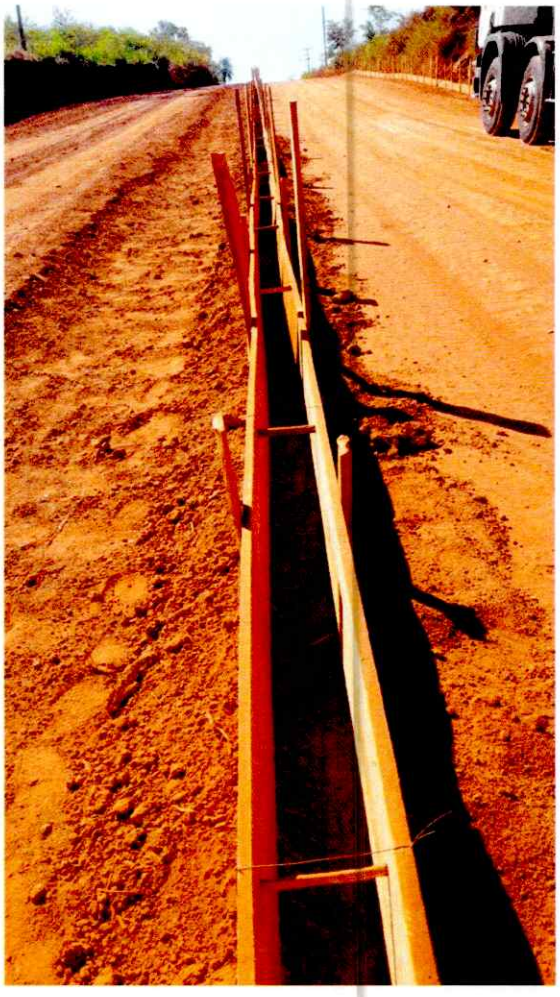

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
