ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BÁSICO N° 4

CONTRATO N° 90/2023.

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ITAPUA POTY – CRUCE LORITO – PLURIANUAL.

CONTRATISTA: ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA

En el distrito de Itapúa Poty, Departamento de Itapúa, República del Paraguay a los 28 días del mes de mayo de dos mil veinticuatro, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa el Arq. Diego Saldívar, encargado de la verificación y fiscalización de la obra y el Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia, representante técnico de la empresa DJ Ingeniería, para la CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN ITAPÚA POTY – CRUCE LORITO – PLURIANUAL. Que suscriben la presente acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados en los meses de abril y mayo. - .

En la verificación realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscriben la presente acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicado más arriba.

DJ INGENIERIA
C.I.: 3030337-0

Contratista
ING. DIEGO MARCELO JARA ESTIGARRIBIA
Representante Técnico

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras

GOBERNACION DE ITAPÚA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 4

Mes: Abril - Mayo

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 46/2023 - "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty - Cruce Lorito -Plurianual con ID: 437.094									
Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 46/2023 - "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty - Cruce Lorito -Plurianual con ID: 437.094	100%	175.758.179	69,11%	121.469.115	30,89%	54.289.064	100,00%	175.758.179
A	**Total por Contrato**	**100%**	**175.758.179**	**69,11%**	**121.469.115**	**30,89%**	**54.289.064**	**100,00%**	**175.758.179**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	35.151.636	24.293.823	10.857.813	35.151.636
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**35.151.636**	**24.293.823**	**10.857.813**	**35.151.636**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				43.431.251	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**43.431.251**	

Certificado Básico Nº	**4**
Mes:	**Abril - Mayo**
Contrato N°:	**90/23**
Monto Básico:	**175.758.179**
Contratista:	**ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA**
Fecha de Inicio:	**18-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**90 dias**
Fecha de terminación prevista:	**16-mar-24**
Prórroga:	**73 dias**
Fecha de terminación con prórroga:	**28-may-24**

SON GUARANIES: Cuarenta y tres millones cuatrocientos treinta y un mil doscientos cincuenta y uno.

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA
C.I. 3030337-0
Contratista-Representante Legal

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 4

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Abril - Mayo

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 46/2023 - "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty - Cruce Lorito -Plurianual con ID: 437.094			
CONTRATISTA:	ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	175.758.179	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	16-mar-24
CONTRATO N°:	90/23	**PRÓRROGA:**	73 dias
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 dias	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	28-may-24

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 46/2023 - "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty - Cruce Lorito -Plurianual con ID: 437.094						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.	Metro lineal	360,00	7.614	2.741.040	0,016	100,00%	0,00%	100,00%	0,016	-	0,016	360,00	0,00	360,00	2.741.040	0	2.741.040
2	Cartel metálico con soporte.	Unidad	1,00	1.176.244	1.176.244	0,007	100,00%	0,00%	100,00%	0,007	-	0,007	1,00	0,00	1,00	1.176.244	0	1.176.244
3	Servicio de señalizacion de caminos - Carteles de señalización	Unidad	2,00	5.404.062	10.808.124	0,061	100,00%	0,00%	100,00%	0,061	-	0,061	2,00	0,00	2,00	10.808.124	0	10.808.124
4	Preparación de obra - Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de cala. Terraplén.	Metros cúbicos	756,00	22.959	17.357.004	0,099	100,00%	0,00%	100,00%	0,099	-	0,099	756,00	0,00	756,00	17.357.004	0	17.357.004
5	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada (esp. 0.20 m), Incluye estacionamiento de equipo.	Metros cúbicos	504	38.273	19.289.592	0,110	70,66%	29,34%	100,00%	0,078	0,032	0,110	356,11	147,89	504,00	13.629.209	5.660.383	19.289.592
6	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	2434,00	38.811	94.465.974	0,537	63,85%	36,15%	100,00%	0,343	0,194	0,537	1.554,00	880,00	2.434,00	60.312.294	34.153.680	94.465.974
7	Colocación de hormigón armado - CORDON ESCONDIDO DE H°. SEGÚN DETALLE.	Metros cúbicos	21,00	965.325	20.271.825	0,115	76,19%	23,81%	100,00%	0,088	0,027	0,115	16,00	5,00	21,00	15.445.200	4.826.625	20.271.825
8	Relleno y compactación de terreno - Compactación, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	Metros cuadrados	2434,00	2.646	6.440.364	0,037	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,037	0,037	0,00	2.434,00	2.434,00	0	6.440.364	6.440.364
9	Limpieza de obra	Metros cuadrados	2434,00	1.318	3.208.012	0,018	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,018	0,018	0,00	2.434,00	2.434,00	0	3.208.012	3.208.012
Total					**175.758.179**	**100%**				**69,11%**	**30,89%**	**100,00%**				**121.469.115**	**54.289.064**	**175.758.179**

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA
Contratista/Representante

INGENIERIA
RUC: 3030337-0

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Municipalidad de Itapúa

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 4

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Abril - Mayo

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 46/2023 - "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty - Cruce Lorito -Plurianual con ID: 437.094			
CONTRATISTA:	ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA	**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA GS:	175.758.179	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	16-mar-24
CONTRATO N°:	90/23	**PRÓRROGA:**	73 dias
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 dias	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	28-may-24

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 46/2023 - "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty - Cruce Lorito -Plurianual con ID: 437.094							PLAZO DE EJECUCIÓN					TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
1	Replanteo y marcación - Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topografico.	Metro lineal	360,00	7.614	2.741.040	2.741.040						1,56%
2	Cartel metálico con soporte.	Unidad	1,00	1.176.244	1.176.244	1.176.244						0,67%
3	Servicio de señalizacion de caminos - Carteles de señalización de desvío.	Unidad	2,00	5.404.062	10.808.124	5.404.062	5.404.062					6,15%
4	Preparación de obra - Movimiento de suelo (perfilado) y preparación de caja. Terraplén.	Metros cúbicos	756,00	22.959	17.357.004		3.593.154	13.763.850				9,88%
5	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada (esp. 0.20 m). Incluye estacionamiento de equipo.	Metros cúbicos	504	38.273	19.289.592		3.827.300	7.731.146	3.500.000	3.500.000	731.146	10,98%
6	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	2434,00	38.811	94.465.974			47.232.987	27.232.987	10.000.000	10.000.000	53,75%
7	Colocación de hormigón armado - CORDON ESCONDIDO DE H°. SEGÚN DETALLE.	Metros cúbicos	21,00	965.325	20.271.825		5.309.288	5.000.000	5.000.000	4.962.537		11,53%
8	Relleno y compactación de terreno - Compactación, inicial, diaria y final. Incluye estacionamiento de equipo.	Metros cuadrados	2434,00	2.646	6.440.364						6.440.364	3,66%
9	Limpieza de obra	Metros cuadrados	2434,00	1.318	3.208.012						3.208.012	1,83%
Total					175.758.179							100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						9.321.346	18.133.804	73.727.983	35.732.987	18.462.537	20.379.522	175.758.179
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						5,30%	10,32%	41,95%	20,33%	10,50%	11,60%	100%

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA
Contratista-Representante Legal

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapua

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 4

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Abril - Mayo

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 46/2023 - "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty - Cruce Lorito -Plurianual con ID: 437.094

Contrato N°: 90/23			
Monto del Contrato:	175.758.179	**Fecha de terminación prevista:**	16-mar-24
Plazo Contractual:	90 dias	**Prórroga:**	73 dias
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	28-may-24

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	9.321.346	9.321.346	10.000.000	10.000.000	5,30%	5,30%	5,69%	5,69%
Enero	18.133.804	27.455.150	26.355.787	36.355.787	10,32%	15,62%	15,00%	20,69%
Febrero	73.727.983	101.183.133	52.503.464	88.859.251	41,95%	57,57%	29,87%	50,56%
Marzo	35.732.987	136.916.120	32.609.864	121.469.115	20,33%	77,90%	18,55%	69,11%
Abril	18.462.537	155.378.657	24.000.000	145.469.115	10,50%	88,40%	13,66%	82,77%
Mayo	20.379.522	175.758.179	30.289.064	175.758.179	11,60%	100,00%	17,23%	100,00%

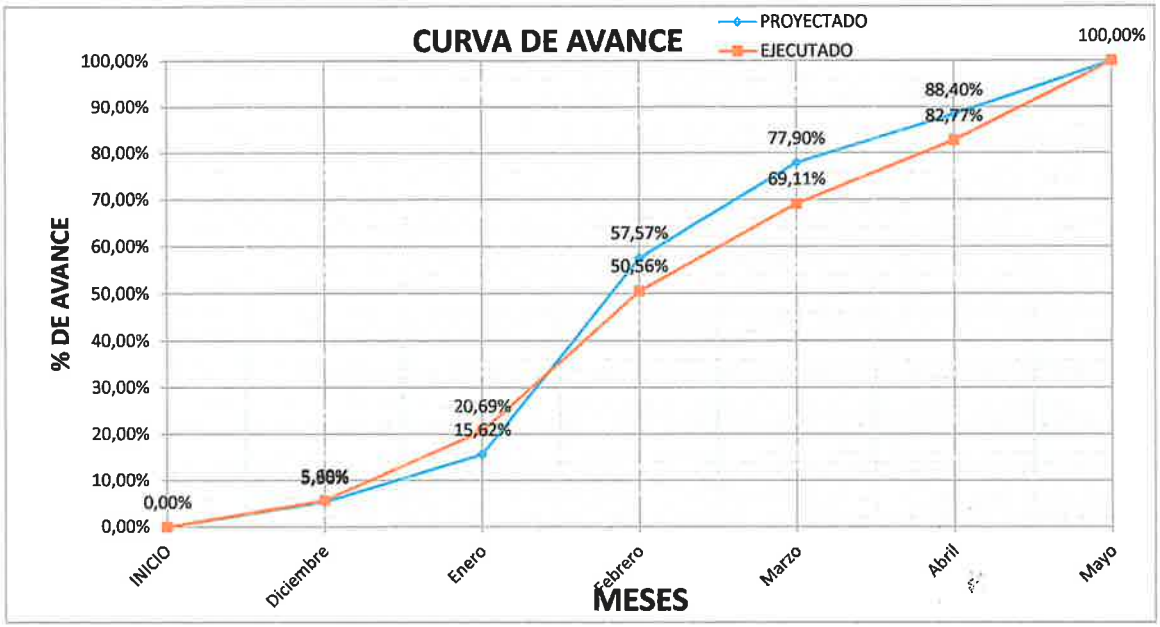

ING. DIEGO M. JARA ESTIGARRIBIA
Contratista-Representante Legal

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441
Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapua

Lote 5692999874 , Cons.: 12

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **NUMERO 4270178617208**

FECHA 25/06/2024

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	3030337	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	JARA ESTIGARRIBIA DIEGO MARCELO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 25/07/2024 NÚMERO DE CONTROL : 9BB10985

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427130303379BB10985

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 3030337 NRO. CERTIFICADO: 437940

FECHA EMISION: 17-06-2024 VENCIMIENTO: 14-07-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 3030337 Nro. Certificado: 437940

Razon Social: JARA ESTIGARRIBIA, DIEGO MARCELO

Actividad(es): ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE INGENIERÍA
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
OTRAS ACTIVIDADES DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS E INDUSTRIAL
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA N.C.P
OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P

Fecha de Inscripcion: 04-07-2019 Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0554-40-0329 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a través de nuestro sitio: http://servicios.ips.gov.py/constancia/

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: CONTRATACIÓN DIRECTA N° 46/23

OBRA: "Construcción de Empedrado en Itapúa Poty – Cruce Lorito – Plurianual - ID N° 437.094

BENEFICIARIO: Acceso Principal a Cruce Lorito

FISCAL DE OBRAS: Arq. Diego Saldivar

FECHA DE VISITA: 28 de mayo 2024

AVANCE DE OBRA: 100%

UBICACION	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE OBRA
Cruce Lorito	Itapúa Poty	----------	175.758.179
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE/ ITEM**
Diego Jara Estigarribia	021-505291	90/23	----------
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**PRORROGAS**
90 días	18/12/2023	17/03/2024	19 días – ***Res. N° 633/2024*** 21 días – ***Res. N° 686/2024*** 33 días – ***Res. N° 351/2024***

OBSERVACIONES GENERALES:

En fecha 28 de mayo de 2024, se realizó la verificación in situ correspondiente de la obra ya mencionada más arriba, constatando que se encuentra con una ejecución de 100% fecha medida.

Salvedades:

- Limpieza final de obra.
- Relleno de tierra en laterales de cordones.

Obs.: Se anexa imágenes de avance de Obra.

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 3441
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
