MEMORANDUM

A: ABOG. RICHARD RAMIREZ, Gobernador de Misiones

PARA: SR. ROQUE GONZALEZ, SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

DE< ARQ. NORMA MEDINA, FISCALIZACION

Referencia: Certificación de Obras –CERTIFICADO 04

FECHA< 05 DE JULIO DE 2025

CC: Lic. QUINTIN GONZALEZ

Adjunto van las planillas de certificación de obra 04, CONTRATO NO. 32/2024 Informe mensual de obra, registro ejecutadas por la empresa JAVIER GONZALEZ;

Grupo 1 - Pavimentación pétrea, canalización a cielo abierto y otras obras complementarias. DISTRITO DE SAN MIGUEL- COMPAÑÍA DE ARAZAPE

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario
1	Grupo 1 - Pavimentación pétrea, canalización a cielo abierto y otras obras complementarias. DISTRITO DE SAN MIGUEL- COMPAÑÍA DE ARAZAPE	UN	1,00	643.784.493

Hemos verificado y constatado el avance de las obras, según las especificaciones técnicas y encontramos un avance acumulado ejecutado del 86,26 %. Se adjuntan informe 04 y planillas.

Se recomienda el pago de este certificado. /

GOBERNACIÓN DE MISIONES
Fiscalización de Obras
Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

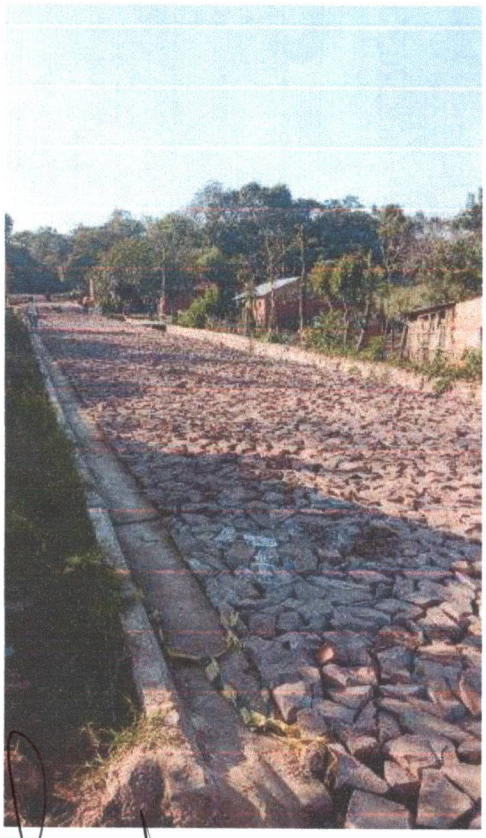

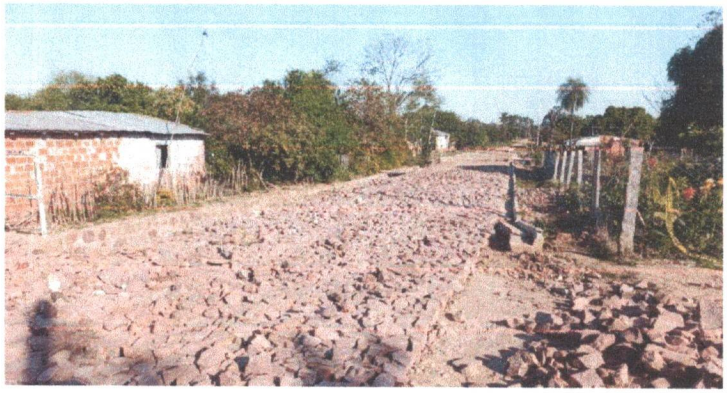

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES - RESUMEN DE CERTIFICACION 04

Grupo 1 - Pavimentacion petrea, canalizacion a cielo abierto y otras obras complementarias. DISTRITO DE SAN MIGUEL- COMPAÑÍA DE ARAZAPE

CONTRATO Nº 32 /2024
MONTO DE CONTRATO GS. 643.784.493.-
CONTRATISTA: Construcciones del Futuro de Javier Gonzalez
FECHA: 27 DE JUNIO de 2025

ITEM	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Total	Precio Total	Certificado de Obras N°1	Certificado de Obras N°2	Certificado de Obras N°3	Certificado de Obras N°4	ACUMULADO	Avance %
1	Grupo 1 - Pavimentacion petrea, canalizacion a cielo abierto y otras obras complementarias. DISTRITO DE SAN MIGUEL- COMPAÑÍA DE ARAZAPE	UN	1,00	643.784.493		43.291.088	271.928.321	197.896.187,00	42.228.922	555.344.518	86,26%
	ACOPIO DEE MATERIAL				193.135.348						
				643.784.493	193.135.348	**43.291.088**	**271.928.321**	**197.896.187**	**42.228.922**	**555.344.518**	86,26%

RESUMEN GENERAL DEL 1ER. CERTIFICADO DEL 16 DE Noviembre DE 2024		
MONTO TOTAL DE OBRA CONTRATADO		**643.784.493**
MONTO DE 1ER. CERTIFICADO		**43.291.088**
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5% DE LA CERTIFICACION		2.164.554
		41.126.534
MONTO FINAL A PAGAR CON EL DESCUENTO DE FONDOS DE REPARO		
MONTO TOTAL DE FACTURAS PRESENTADAS POR ACOPIO	30,00%	193.135.348
MONTO DE OBRA EJECUTADA CERTIFICADO 01		41.126.534
MONTO GENERAL A PAGAR		**234.261.882**

RESUMEN GENERAL DEL 2do. CERTIFICADO DEL 28 DE DICIEMBRE DE2024		
MONTO TOTAL DE OBRA CONTRATADO		**643.784.493**
MONTO DE 2DO. CERTIFICADO		**42.228.922**
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5% DE LA CERTIFICACION		2.111.446
		40.117.476
MONTO FINAL A PAGAR CON EL DESCUENTO DE FONDOS DE REPARO Y ACOPIO DE MATERIALES		
Descuento por acopio de materiales	30,00%	12.668.677
MONTO DE OBRA EJECUTADA CERTIFICADO 02		40.117.476
MONTO GENERAL A PAGAR		**27.448.799**

Fiscalización de Obras
Consultora & Constructora

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

CONSTUCCIONES DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8

RESUMEN GENERAL DEL 3er.. CERTIFICADO		
MONTO TOTAL DE OBRA CONTRATADO		**643.784.493**
MONTO DE 3er. CERTIFICADO		**197.896.187**
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5% DE LA CERTIFICACION		9.894.809
		188.001.378
MONTO FINAL A PAGAR CON EL DESCUENTO DE FONDOS DE REPARO Y ACOPIO DE MATERIALES		
Descuento por acopio de materiales	30,00%	59.368.856
MONTO GENERAL A PAGAR		**128.632.522**

RESUMEN GENERAL DEL 4TO. CERTIFICADO		
MONTO TOTAL DE OBRA CONTRATADO		**643.784.493**
MONTO DE 4TO. CERTIFICADO		**42.228.922**
DESCUENTO FONDO DE REPARO 5% DE LA CERTIFICACION		2.111.446
		40.117.476
MONTO FINAL A PAGAR CON EL DESCUENTO DE FONDOS DE REPARO Y ACOPIO DE MATERIALES		
Descuento por acopio de materiales	30,00%	12.668.677
MONTO GENERAL A PAGAR		**27.448.799**

Fiscalización de Consultora & Constructora

CONSTUCCIONES DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

GOBERNACIÓN DE MISIONES - CERTIFICACION 04- LOTE 5

Grupo 1 - Pavimentacion petrea, canalización a cielo abierto y otras obras complementarias. DISTRITO DE SAN MIGUEL- COMPAÑÍA DE ARAZAPE

CONTRATO Nº 32 /2024

MONTO DE CONTRATO GS. 643,784,493.-

CONTRATISTA: Construcciones del Futuro de Javier Gonzalez

FECHA: 25 de junio de 2025

Ítem				Precio unitario		CANTIDAD CERTIFICADA			PRECIO CERTIFICACIÓN			% DE AVANCE
1	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	(IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
1	Marcacion, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGUN LOS PERFILES DE PROYECTO.	Metros cuadrados	2.908,02	2.111	6.138.830	2.908,02		2.908,02	6.138.830	0	6.138.830	100,00%
2	Limpieza, desbroce con maquinas, DESMONTES VARIOS	Unidad Medida Global	1,00	2.658.843	2.658.843	1,00		1,00	2.658.843	0	2.658.843	100,00%
3	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas / desmontes varios	Metros cuadrados	410,54	5.998	2.462.419	360,00	50,54	410,54	2.159.280	303.139	2.462.419	100,00%
4	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad Medida Global	1,00	1.185.030	1.185.030	1,00		1,00	1.185.030	0	1.185.030	100,00%
5	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cuadrados	2.908,02	4.510	13.115.170	2.908,02		2.908,02	13.115.170	0	13.115.170	100,00%
6	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cúbicos	581,60	47.914	27.866.782	581,60		581,60	27.866.782	0	27.866.782	100,00%
7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	2.518,00	61.746	155.476.428	1.270,24	338,64	1.608,88	78.432.239	20.909.665	99.341.904	63,90%
8	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	2.518,00	2.578	6.491.404	89,60	1.500,65	1.590,25	230.989	3.868.676	4.099.665	63,16%
9	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	2.518,00	4.089	10.296.102	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
10	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA	Metros cúbicos	53,22	47.914	2.549.983	0,00	26,61	26,61	0	1.274.992	1.274.992	50,00%
11	Provision y colocacion de cordon (escondido) prefabricado de hormigon 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento). CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	308,18	36.721	11.316.678	178,90	7,10	186,00	6.569.387	260.719	6.830.106	60,35%
12	Cordon cuneta, una sola pieza de H迷laborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, conforme punto 12 de las especificaciones tecnicas. CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	266,11	92.535	24.624.489	180,00	80,20	260,20	16.656.300	7.421.307	24.077.607	97,78%
13	Construccion de muros laterales para canal de PBC 0,65*0,40. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metros cúbicos	410,87	566.913	232.927.544	410,87		410,87	232.927.544	0	232.927.544	100,00%
14	Base fondo de canal de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metros cúbicos	45,66	566.913	25.885.248	45,66		45,66	25.885.248	0	25.885.248	100,00%
15	Excavacion para canal. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metros cúbicos	410,90	46.572	19.136.435	410,90		410,90	19.136.435	0	19.136.435	100,00%
16	Terminacion superior de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metros cúbicos	13,31	1.048.971	13.961.804	10,00		10,00	10.489.710	0	10.489.710	75,13%
17	TERMINACION DE BASE DE FONDO CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metros cúbicos	11,41	1.048.971	11.968.759	10,00		10,00	10.489.710	0	10.489.710	87,64%
18	Relleno lateral de contencion de canal con la misma tierrr de desmonte y apisnado. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metros cúbicos	334,80	35.990	12.049.452	334,80		334,80	12.049.452	0	12.049.452	100,00%
19	Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metro lineal	20,00	79.880	1.597.600	20,00		20,00	1.597.600	0	1.597.600	100,00%

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

CONSTUCCIONES DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8

20	Desmonte de TUBOS DE HORMIGON. Retiro Y DESALIJO. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Unidad	2,00	2.194.500	4.389.000	2,00		2,00	4.389.000	0	4.389.000	100,00%
21	Canal de hormigon tope con el muro de piedra en los laterales, espesor 0,10 y losa de aproximacion de 1 metro de ancho. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metros cúbicos	8,00	1.048.971	8.391.768	8,80		8,80	9.230.945	0	9.230.945	110,00%
22	LOSA DE HORMIGON ARMADOconforme al punto 22 de las especificaciones tecnicas - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	3,63	2.566.834	9.317.607	3,63		3,63	9.317.607	0	9.317.607	100,00%
23	Vigas de Hormigon armado segun plano. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	1,20	2.566.834	3.080.201	1,20		1,20	3.080.201	0	3.080.201	100,00%
24	BASE DE LOSA, conforme al punto 24 de las especificaciones tecnicas - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	18,61	673.934	12.541.912	14,30		14,30	9.637.256	0	9.637.256	76,84%
25	BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,20 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	9,20	673.934	6.200.193	8,80		8,80	5.930.619	0	5.930.619	95,65%
26	TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	2,30	1.048.971	2.412.633	2,20	0,10	2,30	2.307.736	104.897	2.412.633	100,00%
27	LOSA DE HORMIGON ARMADO DE INGRESO VEHICULAR. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	4,86	2.566.834	12.474.813	0,00	3,15	3,15	0	8.085.527	8.085.527	64,81%
28	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros	Unidad Medida Global	1,00	3.267.366	3.267.366	0,50		0,50	1.633.683	0	1.633.683	50,00%
				TOTAL	643.784.493				513.115.596	42.228.922	555.344.518	86,26%

La presente medición fue presentada por el contratista y verificada en presencia del mismo, con la presencia de representante de la Contratista y la Fiscalización representada por la Arq. Norma Medina y la Secretaria de Obras por el Sr. Roque Gonzalez. Los datos registrados corresponden a cantidades de obras implantadas conforme a las EETT consignadas en el PBC del llamado. Se ha realizado la verificación y medición de trabajos ejecutados, constatándose que el avance de las obras están acordes a las especificaciones técnicas.
Esta acta de medición fue consignada en tres copias, en fecha 25 de junio de 2025, el sitio de obra.

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

CONSTUCCIONES DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8

GOBERNACIÓN DE MISIONES - CERTIFICACION 03- LOTE 5

Grupo 1 - Pavimentacion petrea, canalización a cielo abierto y otras obras complementarias. DISTRITO DE SAN MIGUEL- COMPAÑÍA DE ARAZAPE

CONTRATO Nº 32 /2024

MONTO DE CONTRATO GS. 643,784,493.-

CONTRATISTA: Construcciones del Futuro de Javier Gonzalez

FECHA: 30 de enero de 2025

Ítem				Precio unitario		CANTIDAD CERTIFICADA			PRECIO CERTIFICACIÓN			% DE AVANCE
1	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	(IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADA	
1	Marcacion, replanteo, CON EQUIPO DE TEODOLITO, CON JABALINAS O ESTACAS PINTADAS CADA 20 METROS INDICANDO LOS NIVELES DE RELLENO Y/O DESMONTE, Y LA RASANTE FINAL SEGUN LOS PERFILES DE PROYECTO.	Metros cuadrados	2.908,02	2.111	6.138.830	2.908,02		2.908,02	6.138.830	0	6.138.830	100,00%
2	Limpieza, desbroce con maquinas, DESMONTES VARIOS	Unidad Medida Global	1,00	2.658.843	2.658.843	1,00		1,00	2.658.843	0	2.658.843	100,00%
3	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas / desmontes varios	Metros cuadrados	410,54	5.998	2.462.419	360,00	50,54	410,54	2.159.280	303.139	2.462.419	100,00%
4	Cartel de Obra , SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	Unidad Medida Global	1,00	1.185.030	1.185.030	1,00		1,00	1.185.030	0	1.185.030	100,00%
5	Preparacion de terreno para caja de empedrado. MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cuadrados	2.908,02	4.510	13.115.170	2.908,02		2.908,02	13.115.170	0	13.115.170	100,00%
6	Relleno y compactacion de suelo base. MOVIMIENTO DE SUELO	Metros cúbicos	581,60	47.914	27.866.782	581,60		581,60	27.866.782	0	27.866.782	100,00%
7	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de arena (ARENA DE RIO 50 %). PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	2.518,00	61.746	155.476.428	1.270,24	338,64	1.608,88	78.432.239	20.909.665	99.341.904	63,90%
8	Compactacion manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final. PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	2.518,00	2.578	6.491.404	89,60	1.500,65	1.590,25	230.989	3.868.676	4.099.665	63,16%
9	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI. PAVIMENTACION PETREA	Metros cuadrados	2.518,00	4.089	10.296.102	0,00		0,00	0	0	0	0,00%
10	Relleno lateral de contension de cordon. PAVIMENTACION PETREA	Metros cúbicos	53,22	47.914	2.549.983	0,00	26,61	26,61	0	1.274.992	1.274.992	50,00%
11	Provision y colocacion de cordon (escondido) prefabricado de hormigon 010*0,25*0,50, en borde de terminacion de empedrado(en las bocacalles donde no se continua el pavimento). CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	308,18	36.721	11.316.678	178,90	7,10	186,00	6.569.387	260.719	6.830.106	60,35%
12	Cordon cuneta, una sola pieza de H‰laborado insitu: de 0,45m. de base mayor x 0,40 de altura, canal de 0.30 m, conforme punto 12 de las especificaciones tecnicas. CORDON DE HORMIGON	Metro lineal	266,11	92.535	24.624.489	180,00	80,20	260,20	16.656.300	7.421.307	24.077.607	97,78%
13	Construccion de muros laterales para canal de PBC 0,65*0,40. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metros cúbicos	410,87	566.913	232.927.544	410,87		410,87	232.927.544	0	232.927.544	100,00%
14	Base fondo de canal de piedra bruta colocada de 0,20 cm de espesor. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metros cúbicos	45,66	566.913	25.885.248	45,66		45,66	25.885.248	0	25.885.248	100,00%
15	Excavacion para canal. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metros cúbicos	410,90	46.572	19.136.435	410,90		410,90	19.136.435	0	19.136.435	100,00%
16	Terminacion superior de muro de PBC, con alisada de hormigon de 0,05 cm de espesor, dosaje 1:3 con piedra triturada de IV, debe coincidir con el canal de tope. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metros cúbicos	13,31	1.048.971	13.961.804	10,00		10,00	10.489.710	0	10.489.710	75,13%
17	TERMINACION DE BASE DE FONDO CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metros cúbicos	11,41	1.048.971	11.968.759	10,00		10,00	10.489.710	0	10.489.710	87,64%
18	Relleno lateral de contencion de canal con la misma tierrr de desmonte y apisnado. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metros cúbicos	334,80	35.990	12.049.452	334,80		334,80	12.049.452	0	12.049.452	100,00%
19	Filtros de caños de PVC perforados de 100mm con manta geotextil cada 20 metros. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metro lineal	20,00	79.880	1.597.600	20,00		20,00	1.597.600	0	1.597.600	100,00%

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Norma Medina
Consultora & Constructora

CONSTUCCIONES DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8

20	Desmonte de TUBOS DE HORMIGON. Retiro Y DESALIJO. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Unidad	2,00	2.194.500	4.389.000	2,00		2,00	4.389.000	0	4.389.000	100,00%
21	Canal de hormigon tope con el muro de piedra en los laterales, espesor 0,10 y losa de aproximacion de 1 metro de ancho. Construccion de canal a cielo abierto de PBC	Metros cúbicos	8,00	1.048.971	8.391.768	8,80		8,80	9.230.945	0	9.230.945	110,00%
22	LOSA DE HORMIGON ARMADOconforme al punto 22 de las especificaciones tecnicas - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	3,63	2.566.834	9.317.607	3,63		3,63	9.317.607	0	9.317.607	100,00%
23	Vigas de Hormigon armado segun plano. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	1,20	2.566.834	3.080.201	1,20		1,20	3.080.201	0	3.080.201	100,00%
24	BASE DE LOSA, conforme al punto 24 de las especificaciones tecnicas - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	18,61	673.934	12.541.912	14,30		14,30	9.637.256	0	9.637.256	76,84%
25	BASE DE CANAL DE AGUA CON PIEDRA BRUTA COLOCADA DE 0,20 CM DE ESPESOR, INCLUYE EXCAVACION. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	9,20	673.934	6.200.193	8,80		8,80	5.930.619	0	5.930.619	95,65%
26	TERMINACION DE BASE DE FONDO DE PONTILLON CON HORMIGON ESPESOR DE 0,05, CON PIEDRA TRITURADA DE IV, DOSAJE 1: 3. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	2,30	1.048.971	2.412.633	2,20	0,10	2,30	2.307.736	104.897	2.412.633	100,00%
27	LOSA DE HORMIGON ARMADO DE INGRESO VEHICULAR. OBRAS COMPLEMENTARIAS - Construccion de pontillon CON BASE DE PIEDRA Y LOSA DE HORMIGON ARMADO	Metros cúbicos	4,86	2.566.834	12.474.813	0,00	3,15	3,15	0	8.085.527	8.085.527	64,81%
28	Limpieza final y pintura de cordones y retiro de los materiales petreos y escombros	Unidad Medida Global	1,00	3.267.366	3.267.366	0,50		0,50	1.633.683	0	1.633.683	50,00%
				TOTAL	643.784.493				513.115.596	42.228.922	555.344.518	86,26%

Roque González
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Misiones

Arq. Norma Medina
nmm
Consultora & Constructora

CONSTUCCIONES
DEL FUTURO
Javier González
R.U.C. 3804810 - 8
