MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.03/2020 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°: 6124- CESAR ZOTTI

ID N°: 375,308 CONTRATO N° 03/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01

PERIODO: JUNIO 2020

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°: 6124- CESAR ZOTTI	99.500.000	0,00%	31,10%	31,10%	-	30.940.000	30.940.000
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	19.900.000	0,00%	31,10%	31,10%	-	6.188.000	6.188.000
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	4.975.000	0,00%	31,10%	31,10%	-	1.547.000	1.547.000
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**24.875.000**	0,00%	31,10%	31,10%	-	**7.735.000**	**7.735.000**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**0**	**23.205.000**	**23.205.000**

SON GUARANIES: VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Lic. Raúl Báez Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.03/2020 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°: 6124- CESAR ZOTTI
ID N°: 375,308 CONTRATO N° 03/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: JUNIO 2020

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.03/2020 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°: 6124- CESAR ZOTTI

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Construccion de Cerco perimetral	Unidad Medida Global	1											
	Trabajos preliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	Unidad Medida Global	1	2.000.000	2.000.000		0,50	0,50		1.000.000	1.000.000		50,00%	50,00%
	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 x 0,50 de Profundidad (Incluye Excavacion)	Metros cúbicos	65,92	280.000	18.457.600		30,00	30,00		8.400.000	8.400.000		45,51%	45,51%
	Cimiento de Ho (Losita de 0,30 x 0,30 x 0,10 m) para Postes	Metros cúbicos	1,5	1.120.000	1.680.000		0,75	0,75		840.000	840.000		50,00%	50,00%
	Nivelacion de Ladrillos Comunes de 0,30, Revocados con Hidrofugo	Metros cuadrados	123,6	125.000	15.450.000		60,00	60,00		7.500.000	7.500.000		48,54%	48,54%
	Provision y Colocacion de Postes de Ho. Ao. Segun Diseño MEC,Incluye alambres de Trinca y Pua mas Accesorios , Tejido	Metro lineal	412	132.000	54.384.000		100,00	100,00		13.200.000	13.200.000		24,27%	24,27%
	Provision y Colocacion de un Porton Metalico Segun diseño MEC con Cerraduras y Tranca del mismo Material (Vehicular)	Unidad	1	2.000.000	2.000.000									
	Provision y Colocacion de Porton Metalico segun Diseño MEC, con Cerraduras y Tranca del mismo material (Peatonal)	Unidad	1	1.440.000	1.440.000									
	Pintura de Postes y Muro de Nivelacion a Latex color a Definir	Unidad Medida Global	1	3.440.000	3.440.000									
	Pintura de Porton con Base Antioxido y Pintura Sintética Final	Unidad Medida Global	1	648.400	648.400									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**99.500.000**					**30.940.000**	**30.940.000**		**31,10%**	**31,10%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Daniel Gauto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION
CONTRATACION DIRECTA C.D. No.03/2020 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°: 6124- CESAR ZOTTI
ID N°: 375,308 CONTRATO N° 03/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 01
PERIODO: JUNIO 2020

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 16 dias de Junio del año 2020, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POYT", REPRESENTADA POR DANIEL GAUTO BENITEZ, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
	Construccion de Cerco perimetral	Unidad Medida	1			
	Trabajos preliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra	Unidad Medida Global	1		0,50	0,50
	Cimiento de Piedra Bruta Colocada, 0,30 x 0,50 de Profundidad (Incluye Excavacion)	Metros cúbicos	65,92		30,00	30,00
	Cimiento de Ho (Losita de 0,30 x 0,30 x 0,10 m) para Postes	Metros cúbicos	1,5		0,75	0,75
	Nivelacion de Ladrillos Comunes de 0,30, Revocados con Hidrofugo	Metros cuadrados	123,6		60,00	60,00
	Provision y Colocacion de Postes de Ho. Ao. Segun Diseño MEC,Incluye alambres de Trinca y Pua mas Accesorios , Tejido de Alambre	Metro lineal	412		100,00	100,00
	Provision y Colocacion de un Porton Metalico Segun diseño MEC, con Cerraduras y Tranca del mismo	Unidad	1		0,00	0,00
	Provision y Colocacion de Porton Metalico segun Diseño MEC, con Cerraduras y Tranca del mismo material (Peatonal)	Unidad	1		0,00	0,00
	Pintura de Postes y Muro de Nivelacion a Latex color a Definir	Unidad Medida Global	1		0,00	0,00
	Pintura de Porton con Base Antioxido y Pintura Sintética Final	Unidad Medida Global	1		0,00	0,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
Daniel Gauto Benitez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONTRATACION DIRECTA C.D. No.03/2020 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°: 6124- CESAR ZOTTI

ID N°: 375,308 CONTRATO N° 03/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA:	CONTRATACION DIRECTA C.D. No.03/2020 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN LA ESCUELA BASICA N°: 6124- CESAR ZOTTI
MONTO TOTAL DE OBRA Gs	**99.500.000**
TIEMPO DE EJECUCION	**90 dias**

ITEM	DESCRIPCIÓN	16/04/2020				16/05/2020				16/06/2020				Monto	%
	0														
	Construccion de Cerco perimetral														
	Trabajos preliminares, desmontes, replanteo, cartel de obra													2.000.000	2,01
	Cimiento de Piedra Bruta Colocado, 0,30 x 0,50 de Profundidad (Incluye Excavacion)													18.457.600	18,55
	Cimiento de Ho (Losita de 0,30 x 0,30 x 0,10 m)													1.680.000	1,69
	Nivelacion de Ladrillos Comunes de 0,30, Revocados con Hidrofugo													15.450.000	15,53
	Provision y Colocacion de Postes de Ho. Ao. Segun Diseño MEC, Incluye alambres de Trinca y Pua mas Accesorios, Tejido de Alambre													54.384.000	54,66
	Provision y Colocacion de un Porton Metalico Segun diseño MEC, con Cerraduras y Tranca del mismo Material (Vehicular)													2.000.000	2,01
	Provision y Colocacion de Porton Metalico segun Diseño MEC, con Cerraduras y Tranca del mismo material (Peatonal)													1.440.000	1,45
	Pintura de Postes y Muro de Nivelacion a Latex color a Definir													3.440.000	3,46
	Pintura de Porton con Base Antioxido y Pintura Sintetico Final													648.400	0,65
	TOTAL													**99.500.000**	100,00

Contractual			
Monto Bruto Mensual Contractual	**32.835.000**	**65.670.000**	**99.500.000**
Porcentajé Avance Mensual Contractual	**33,00%**	**33,00%**	**34,00%**
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	**33,00%**	**66,00%**	**100,00%**

Certificado			
Monto Bruto Mensual Certificado	**0**	**0**	**30.940.000**
Porcentaje Avance Mensual Certificado	**0,00%**	**0,00%**	**31,10%**
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	**0,00%**	**0,00%**	**31,10%**

	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	33,00%	66,00%	100,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	0,00%	0,00%	31,10%

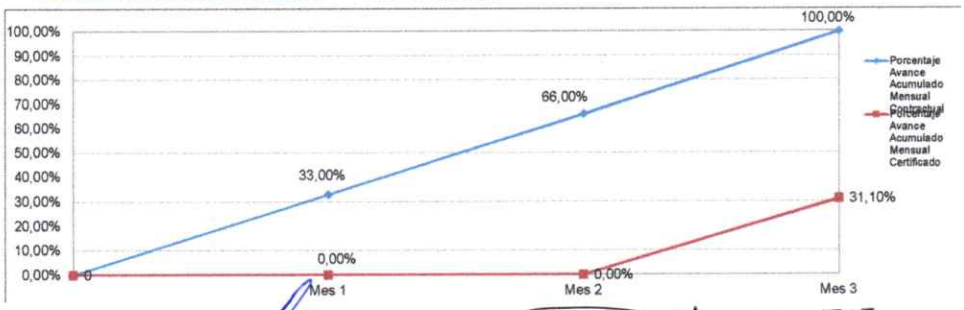

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

Daniel Gauto Benítez
Representante Legal
Cel: 0986 244 165

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto
