Soluciones en Suministro
De Energia de Respaldo
RUC: 80095054-2
CEL: 0984 133046
Lambare - Paraguay

Lambaré, 10 de octubre de 2024

Señores:

SECRETARIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO O BIENES (SEPRELAD)

Atentamente

Ref.: Informe Técnico Contrato N° 03/2023 "Servicios de mantenimiento y reparación de UPS" ID N° 430.273.

Informe Técnico Nro 4

Por la presente tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de informar que se realizó el mantenimiento preventivo, limpieza general y cambio de baterias en fecha 04/10/2024 Sector Sala Servidores y el 10/10/2024 para culminar los trabajos de los siguientes equipos:

- 02 UPS EATON 6KVA:
Item 1.1 Cambio de Batería de UPS Marca EATON de 6KVA
Item 1.2 Mano de obra del Item 1.1

- 01 UPS APC 1KVA:
Item 1.5 Cambio de batería de UPS marca APC Smart-UPS RT 1KVA
Item 1.6 Mano de Obra del ítem 1.5

- 01 UPS EATON 10KVA:
Item 1.3 Cambio de batería de UPS marca EATON 10KVA
Item 1.4 Mano de Obra de ítem 1.3

Los equipos, a excepción de una UPS de 6KVA, quedaron funcionando correctamente. Aguardamos autorización para el retiro de la UPS con fallas.

Alvaro León Silvano
Director de Infraestructura
SEPRELAD

ACA TECHCNICAL SUPPORT

TECHNICAL SUPPORT
www.aca.com.py

RUC: 80095054-2
Cel: 0984 133 046
Trébol 3618 c/ D. Martinez de Irala
Lambaré, Py

Soluciones en Suministro de Energía de Respaldo

Lambaré, 4 de octubre de 2024

Señores
SEPRELAD
Ref.: Contrato N° 03/2023

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UPS marca EATON 6KVA	FECHA	HORARIO
Cambio de batería de UPS marca EATON 6KVA	04/10/2024	15:00 A 15:40HS
Mano de Obra del Ítem 1.1		

UPS marca EATON 6KVA	FECHA	HORARIO
Cambio de batería de UPS marca EATON 6KVA	04/10/2024	15:20 A 15:40HS
Mano de Obra del Ítem 1.1		

UPS marca EATON 10KVA	FECHA	HORARIO
Cambio de batería de UPS marca EATON 10KVA	04/10/2024	15:40 A 16:20HS
Mano de Obra de ítem 1.3		

UPS marca APC Smart-UPS RT 1KVA	FECHA	HORARIO
Cambio de batería de UPS marca APC Smart-UPS RT 1KVA	10/10/2024	09:00 A 09:40 HS
Mano de Obra del ítem 1.5		

DIAGRAMA TÉCNICO

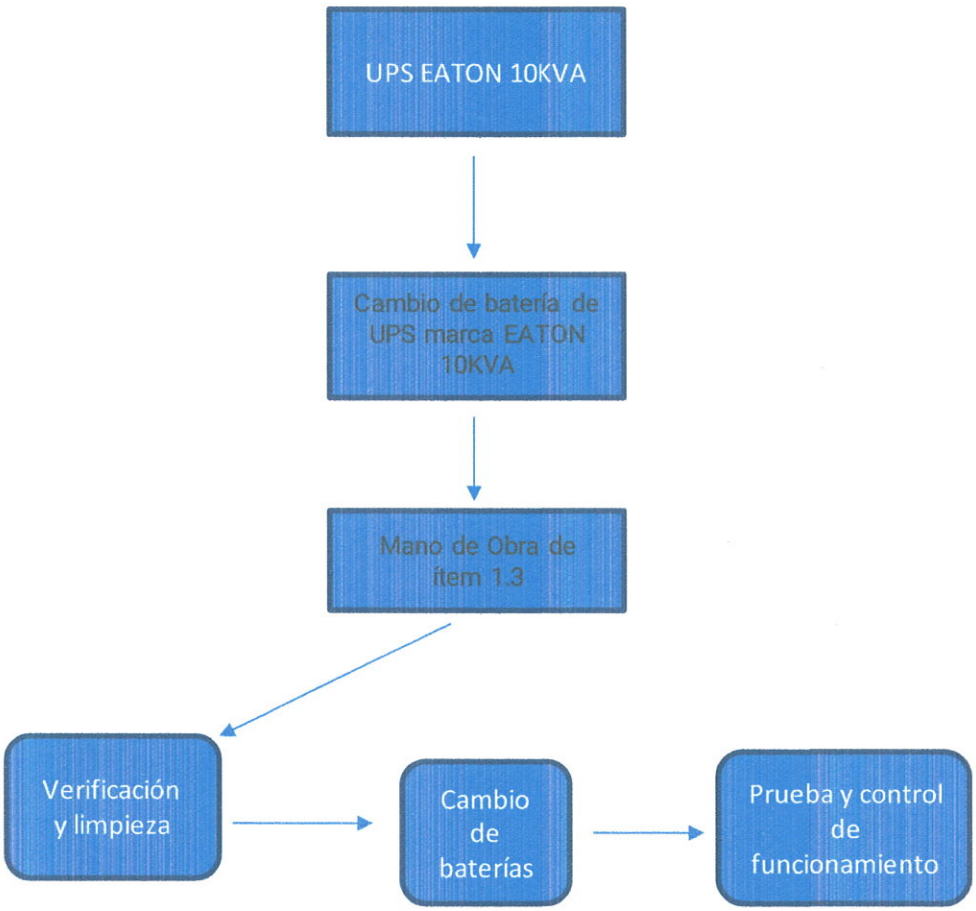

TECHNICAL SUPPORT

DIAGRAMA TÉCNICO

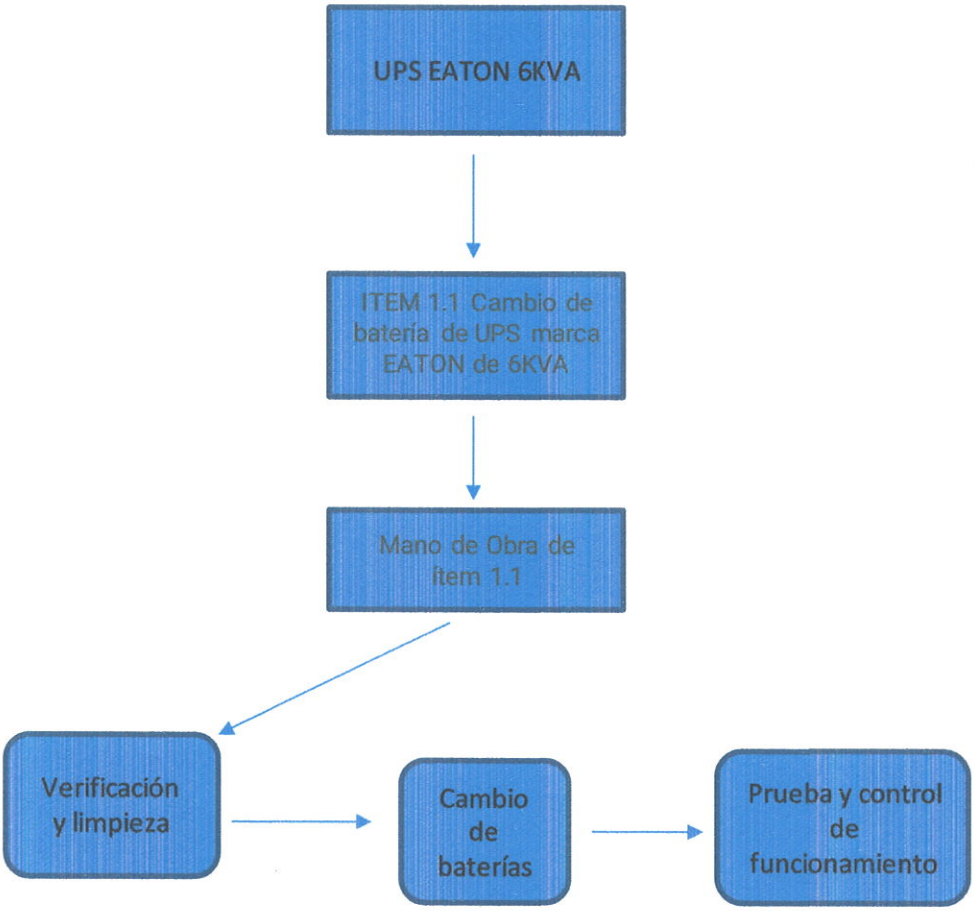

S.A.
TECHNICAL SUPPORT
RUC. 8[illegible]

DIAGRAMA TÉCNICO

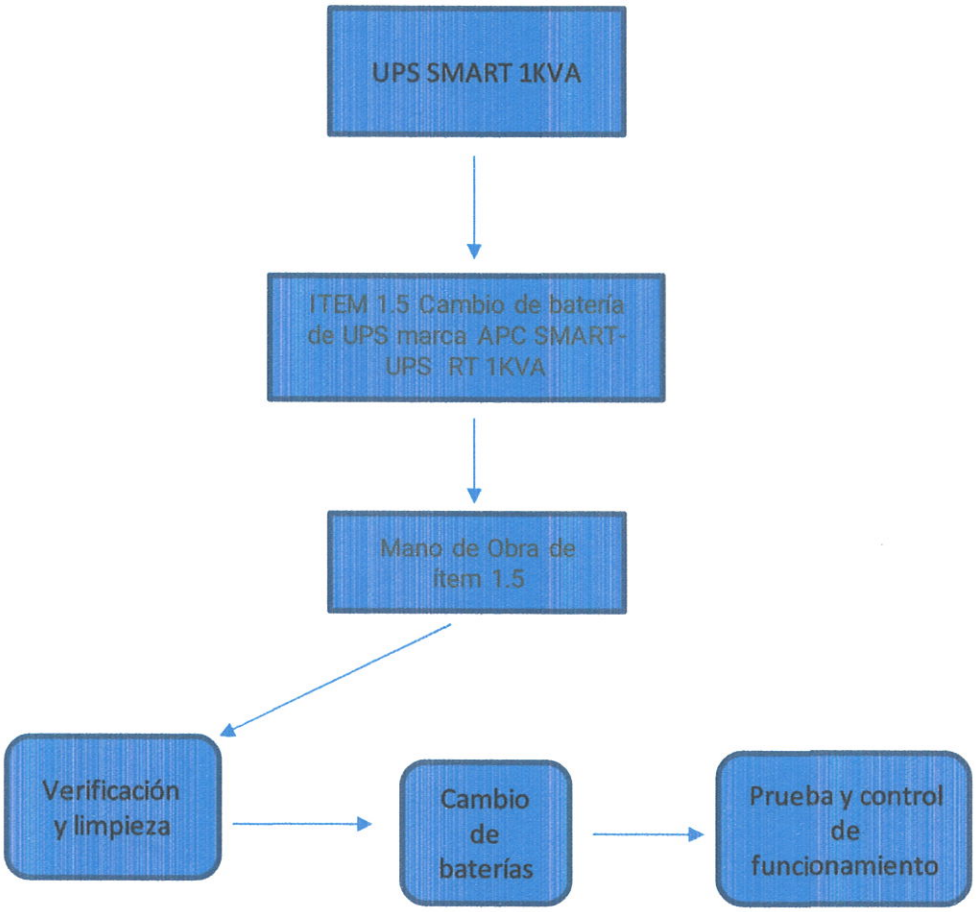

S.A.
TECHNICAL SUPPORT
RUC. 8[illegible]534-2

INSUMOS NECESARIOS

UPS marca EATON 6KVA

- ✓ Soplador
- ✓ Franela
- ✓ Pincel
- ✓ 40 baterías
- ✓ Conectores
- ✓ Destornillador
- ✓ Medidor de batería
- ✓ Tester

UPS marca EATON 10KVA

- ✓ Soplador
- ✓ Franela
- ✓ Pincel
- ✓ 20 baterías
- ✓ Conectores
- ✓ Destornillador
- ✓ Medidor de batería
- ✓ Tester

UPS marca APC Smart-UPS RT 1KVA

- ✓ Soplador
- ✓ Franela
- ✓ Pincel
- ✓ 3 baterías
- ✓ Conectores
- ✓ Destornillador
- ✓ Medidor de baterías
- ✓ Tester

Technical Support
RUC:80095054-2
Cel.:0984133046
Trebol #3618 casi Domingo Martinez de Irala
Lambaré - Paraguay

Soluciones en Suministro de
Energía de Respaldo

Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero
o Bienes (SEPRELAD)
Avd. Federación Rusa y Augusto Roa Basto
RUC: 80020961-3

Presupuesto # S04067

Fecha de cotización: 02/10/2024

Comercial: Administrator

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Precio total
CAMBIO DE BATERIAS DE UPS			
Item 1.3 Cambio de batería de UPS marca EATON 10KVA	20 Unid.	₲ 100.000	₲ 2.000.000
Item 1.4 Mano de Obra de ítem 1.3	20 Unid.	₲ 36.000	₲ 720.000
Item 1.5 Cambio de batería de UPS marca APC Smart-UPS RT 1KVA	3 Unid.	₲ 100.000	₲ 300.000
Item 1.6 Mano de Obra del ítem 1.5	3 Unid.	₲ 36.000	₲ 108.000
Item 1.1 Cambio de Bateria de UPS Marca EATON de 6KVA	40 Unid.	₲ 100.000	₲ 4.000.000
Item 1.2 Mano de obra del Item 1.1	40 Unid.	₲ 36.000	₲ 1.440.000

Total ₲ 8.568.000

Por el Contrato N° 03/2023

Ing. Alvaro León Silvan
Director de Infraestructur
SEPRELAD
