República del Paraguay

Gobernación del II Departamento San Pedro

Tel. (0342) 222 495 – E-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº847 e/Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

SECRETARIA DE EDUCACION

INFORME MENSUAL Nº: 9

NOVIEMBRE 2020

INFORME DE GESTION

PRESENTACION

El Presente Informe tiene como objetivo elevar a la Secretaría de Educación del Gobierno Departamental de San Pedro, y por su intermedio a donde corresponda, las informaciones de los avances, progresos, principales actividades y hechos relevantes ocurridos durante la ejecución de las obras en el ***mes de noviembre de 2020***, con las respectivas certificaciones de cumplimiento de los Contratos Ejecutivos de las siguientes Obras contratadas por el Gobierno Departamental, conforme se aprecia en el siguiente cuadro de datos básicos contractuales.

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

INFORME DE GESTION

DATOS BASICOS CONTRACTUALES

DATOS BASICOS CONTRACTUALES

CONTRATANTE	CONTRATISTA	CONTRATO NRO.	OBJETO DEL CONTRATO				MONTO DEL CONTRATO		PLAZO CONTRACTUAL	FECHA		
			LOCALIDAD	DISTRITO	INSTITUCION	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	PARCIAL	TOTAL		FIRMA DE CONTRATO	ORDEN DE INICIO	PREVISTA DE FINALIZACION
GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO	Ing. Miguel V Zarate MVZ	58	Santa Rosa del Aguaray	Santa Rosa del Aguaray	Colegio Nacional Santa Rosa del Aguaray	Aula Normal de 680 x 580	109.632.870	328.898.610	12 MESES	12-12-19	12-12-19	12-12-20
			Asentamiento La Germania	Nueva Germania	Esc. Bas. Nº: 6441 - Telombo'era	Aula Normal de 680 x 580	109.632.870					
			San Pedro de Y. Mandyjú(Urbana)	San Pedro de Y. Mandyjú	Escuela Especial Div.no Niño Jesus	Aula Normal de 680 x 580	109.632.870					
	Gloria Cantero [CONSTRUCTORA DEL SUR]	59	Compañia Ybype - 4ta. Linea	Lima	Esc. Bas Nº: 4516 San José	Aula Normal de 680 x 580	119.270.924	587.691.381	12 MESES	12-12-19	12-12-19	12-12-20
			Colonia Jejui Poty	Liberacion	Esc. Bas Nº: 6141 San Juan	Aula Normal de 680 x 580	119.270.972					
			Colonia Felicidad	Liberacion	Esc. Bas Nº: 2544 Cnel. Leonardo E. Centurión	Aula Pre Escolar	174.574.876					
						Aula Pre Escolar	174.574.609					
	Fidel Melgarejo Ch. SAN LUCAS CONSTRUCCIONES	60	Guajayvi - Urbana Centro	Guajayvi	Esc. Bas Nº: 657 Gral. Bernardino Caballero	Aula Normal de 680 x 580	102.207.600	515.186.500	12 MESES	12-12-19	12-12-19	12-12-20
			Barrio Virgen de Lourdes	San Estanislao	Esc. Bas Nº: 2846 Virgen de Lourdes	Aula Normal de 680 x 580	102.207.600					
			Calle San José-Bº San Pedro	Guajayvi	Colegio Nacional San José	Sanitario Sexado	50.761.300					
			Asentamiento Norte Poty	General Elizardo Aquino	Colegio Nacional San Luis	Aula Normal de 680 x 580	103.053.200					
			Colonia Naciente	Chore	Colegio Nacional Naciente	Aula Normal de 680 x 580	103.053.200					
			Urbana - Chore		Esc. Bas Nº: 658 - Agustín Barboza	Sanitario Sexado	53.903.600					
	Feliciano Rojas B. CONSTRUCCIONES Y HERRERÍA SAN FERNANDO	61	Asent. 11 de setiembre	Capiívary	Esc. Bas Nº: 4648 - Emiliano R. Fernández	Aula Normal de 680 x 580	120.475.632	416.000.000	12 MESES	12-12-19	12-12-19	12-12-20
			Compañia Añaratengue		Esc. Bas Nº:3735 - San José	Aula Normal de 680 x 580	120.424.368					
			Puerto Rosario	Villa del Rosario	Esc. Bas Nº: 446 - D. Roque Encina	Aula Pre Escolar	176.000.000					
	Facundo Correa EL FAVORITO	62	San Vicente Pancholo	San Vicente Pancholo	Esc. Bas Nº: 7665 - San Estanislao	Aula Pre Escolar	174.574.807	174.574.807	12 MESES	12-12-19	12-12-19	12-12-20
	Mario Núñez R. CONSTRUCTORA D&M	63	General Elizardo Aquino	General Elizardo Aquino	Esc. Bas Nº: 7446 - San Valentín	Aula Pre Escolar	174.571.949	523.724.422	12 MESES	12-12-19	12-12-19	12-12-20
					Esc. Bas Nº: 497 - Virgen del Rosario	Aula Pre Escolar	174.571.949					
					Esc. Bas Nº: 1997 - San Agustín	Aula Pre Escolar	174.580.524					
	Luis T. Molinas LM CONSTRUCCIONES	64	Jurumi	Chore	Esc. Bas Nº: 2711 - San Antonio	Aula Pre Escolar	176.338.170	705.352.673	12 MESES	12-12-19	12-12-19	12-12-20
			Jovenes Unidos		Esc. Bas Nº: 3874 - San José	Aula Pre Escolar	176.338.170					
			Chore		Esc. Bas Nº: 1676 - Cnel. Juan F. López	Aula Pre Escolar	176.338.170					
			Chore - i		Esc. Bas Nº: 1677- San Antonio	Aula Pre Escolar	176.338.163					
	Carlos Ortiz O. TC CONSTRUCCIONES	78	San Estanislao - Urbana	San Estanislao	Centro Rec. Com. Barrio Santa Barbara	Construccion de Tinglado	328.434.600	328.434.600	12 MESES	13-12-19	13-12-19	13-12-20
	Fidel Melgarejo Ch. SAN LUCAS CONSTRUCCIONES	79	Compañia Escalera	Villa del Rosario	Colegio Nacional Wilhelm Allgier	Construccion de Tinglado	499.320.000	499.320.000	12 MESES	13-12-19	13-12-19	13-12-20
	Christian Martinez CM GROUP	80	Gral. F. Isidoro Resquín	Gral. F. Isidoro Resquín	Colegio Nacional Gral. Francisco I. Resquín	Construccion de Tinglado	337.938.494	337.938.494	12 MESES	13-12-19	13-12-19	13-12-20

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

INFORME DE GESTION

AVANCE FISICO - NOVIEMBRE 2020

AVANCE FISICO - NOVIEMBRE 2020

FECHA	LOCALIDAD	DISTRITO	INSTITUCION	OBRA	AVANCES/OBSERVACIONES
06-11-20	San Estanislao - Urbana	San Estanislao	Facultad de filosofia	Aula con estructura de HºAº	Estructura de HºAº , Mamposteria,concluidos
27-11-20	San Pedro de Y. Mandyju - Urbana	San Pedro de Y. Mandyju	Facultad de filosofia	Aula con estructura de HºAº	Estructura de HºAº , Mamposteria,concluidos

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

INFORME DE GESTION

DOCUMENTACION FOTOGRAFICA – NOVIEMBRE 2020

Facultad de Filosofía – Santani

Vistas de los avances de la construcción

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC N° 3185

INFORME DE GESTION

TRABAJOS EN GABINETE

CERTIFICADOS

Fueron elaborados Certificados e informes de avances de las obras verificadas durante el mes.

OTRAS ACTIVIDADES

VISITAS GUIADAS A ZONAS DE OBRAS

GRAL FRANCISCO ISIDORO RESQUIN

FECHA: 06-11-20

ITACURUBI DEL ROSARIO

FECHA: 06-11-20

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

INFORME DE GESTION

ESCUELA MUNICIPAL SANTA ROSA – SANTA ROSA DEL AGUARAY

FECHA: 24-11-20

COLEGIO NACIONAL LIBERACION

FECHA: 24-11-20

COMUNIDAD INDIGENA NARANJITO – SANTA ROSA DEL AGUARAY

FECHA: 26-11-20

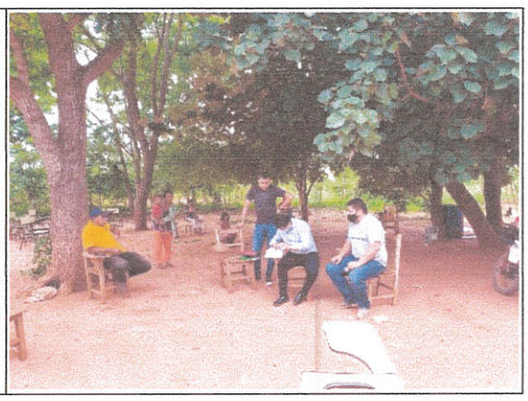

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

INFORME DE GESTION

COMUNIDAD INDIGENA HUGUA POTY – CHORE

FECHA: 26-11-20

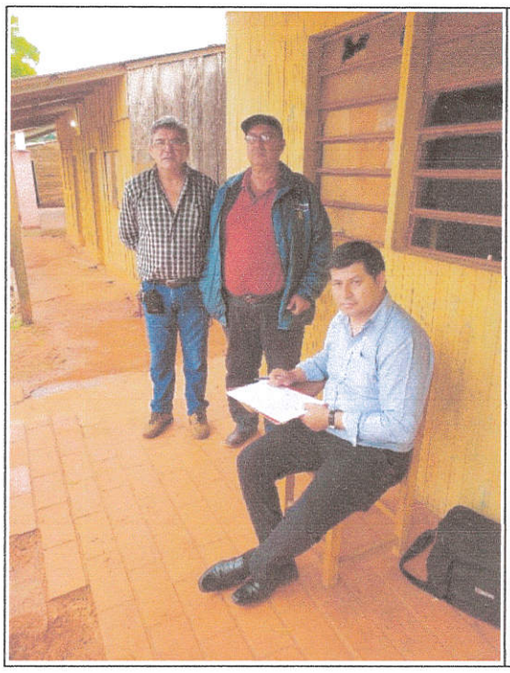

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

INFORME DE GESTION

AVANCE FINANCIERO – NOVIEMBRE 2020

CUADRO CONTROL AVANCE FINANCIERO - NOVIEMBRE 2020

CONTRATO NRO.	INSTITUCION BENEFICIARIA	DATOS DEL CONTRATO					AVANCE FINANCIERO [%]			ANTICIPO		DEVOLUCION DEL ANTICIPO									
		CONTRATISTA	DESCRIPCION DE LAS OBRAS	MONTO DEL CONTRATO			ANT.	PRES.	ACUM.	MONTO	%	ANTERIOR		PRESENTE		ACUMULADO		SALDO	
				PARCIAL	TOTAL							MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%	MONTO	%
58	Col. Nal.. Santa Rosa del Aguaray	Ing. Miguel V Zarate MVZ	Aula Normal de 680 x 580	109.632.870	328.898.610		40,00%		40,00%	21.926.574	20%	21.926.574	100%		0%	21.926.574	100%	0	0%
	Esc. Bas. Nº: 6441 - Tekombo'era		Aula Normal de 680 x 580	109.632.870			40,00%		40,00%	21.926.574	20%	21.926.574	100%	0	0%	21.926.574	100%	0	0%
	Escuela Especial Divino Niño Jesus		Aula Normal de 680 x 580	109.632.870			40,00%		40,00%	21.926.574	20%	21.926.574	100%	0	0%	21.926.574	100%	0	0%
59	Esc. Bas Nº: 4516 San José	Gloria Cantero CONSTRUCTORA DEL SUR	Aula Normal de 680 x 580	119.270.924	587.691.381		75,00%		75,00%	23.854.185	20%	23.854.185	100%	0	0%	23.854.185	100%	0	0%
	Esc. Bas Nº: 6141 San Juan		Aula Normal de 680 x 580	119.270.972			75,00%		75,00%	23.854.194	20%	23.854.194	100%	0	0%	23.854.194	100%	0	0%
			Aula Pre Escolar	174.574.876			75,00%		75,00%	34.914.975	20%	34.914.975	100%	0	0%	34.914.975	100%	0	0%
	Esc. Bas Nº: 2544 Cnel. L. E. Centurion		Aula Pre Escolar	174.574.609			75,00%		75,00%	34.914.975	20%	34.914.975	100%	0	0%	34.914.975	100%	0	0%
60	Esc. Bas Nº: 657 Gral. B. Caballero	Fidel Melgarejo Ch. SAN LUCAS CONSTRUC.	Aula Normal de 680 x 580	102.207.600	515.186.500		100,00%		100,00%	20.441.520	20%	20.441.520	100%	0	0%	20.441.520	100%	0	0%
	Esc. Bas Nº: 2846 Virgen de Lourdes		Aula Normal de 680 x 580	102.207.600			100,00%		100,00%	20.441.520	20%	20.441.520	100%	0	0%	20.441.520	100%	0	0%
	Colegio Nacional San José		Sanitario Sexado	50.761.300			100,00%		100,00%	10.152.260	20%	10.152.260	100%	0	0%	10.152.260	100%	0	0%
	Colegio Nacional San Luis		Aula Normal de 680 x 580	103.053.200			100,00%		100,00%	20.610.640	20%	20.610.640	100%	0	0%	20.610.640	100%	0	0%
	Colegio Nacional Naciente		Aula Normal de 680 x 580	103.053.200			100,00%		100,00%	20.610.640	20%	20.610.640	100%	0	0%	20.610.640	100%	0	0%
	Esc. Bas Nº: 658 - Agustin Barboza		Sanitario Sexado	53.903.600			100,00%		100,00%	10.780.720	20%	10.780.720	100%	0	0%	10.780.720	100%	0	0%
61	Esc. Bas Nº: 4648 - E. R. Fernández	Feliciano Rojas B. CONSTRUC. Y HERRERIA SAN FERNANDO	Aula Normal de 680 x 580	120.475.632	416.900.000		100,00%		100,00%	24.095.126	20%	24.095.126	100%	0	0%	24.095.126	100%	0	0%
	Esc. Bas Nº:3735 - San José		Aula Normal de 680 x 580	120.424.368			100,00%		100,00%	24.084.874	20%	24.084.874	100%	0	0%	24.084.874	100%	0	0%
	Esc. Bas Nº: 446 - Dr. Roque Encina		Aula Pre Escolar	176.000.000			100,00%		100,00%	35.200.000	20%	35.200.000	100%	0	0%	35.200.000	100%	0	0%
62	Esc. Bas Nº: 7665 - San Estanislao	Facundo Correa EL FAVORITO	Aula Pre Escolar	174.574.807	174.574.807		80,00%		80,00%	34.914.961	20%	34.914.961	100%	0	0%	34.914.961	100%	0	0%
63	Esc. Bas Nº: 7446 - San Valentin	Mario Nuñez R. CONSTRUCTORA D&M	Aula Pre Escolar	174.571.949	523.724.422		100,00%		100,00%	34.914.390	20%	34.914.390	100%	0	0%	34.914.390	100%	0	0%
	Esc. Bas Nº: 497 - Virgen del Rosario		Aula Pre Escolar	174.571.949			75,00%		75,00%	34.914.390	20%	34.914.390	100%	0	0%	34.914.390	100%	0	0%
	Esc. Bas Nº: 1997 - San Agustin		Aula Pre Escolar	174.580.524			45,00%		45,00%	34.916.105	20%	34.916.105	100%	0	0%	34.916.105	100%	0	0%
64	Esc. Bas Nº: 2711 - San Antonio	Luis T. Molinas LM CONSTRUCCIONES	Aula Pre Escolar	176.338.170	705.352.673		100,00%		100,00%	35.267.634	20%	35.267.634	100%	0	0%	35.267.634	100%	0	0%
	Esc. Bas Nº: 3874 - San José		Aula Pre Escolar	176.338.170			100,00%		100,00%	35.267.634	20%	35.267.634	100%	0	0%	35.267.634	100%	0	0%
	Esc. Bas Nº: 1676 - Cnel. J. F. López		Aula Pre Escolar	176.338.170			100,00%		100,00%	35.267.634	20%	35.267.634	100%	0	0%	35.267.634	100%	0	0%
	Esc. Bas Nº: 1677- San Antonio		Aula Pre Escolar	176.338.163			100,00%		100,00%	35.267.633	20%	35.267.633	100%	0	0%	35.267.633	100%	0	0%
78	Centro Rec. Comunitario S. Barbara	Carlos Ortiz O. TC CONSTRUCCIONES	Construccion de Tinglado	328.434.600	328.434.600		30,00%		30,00%	65.686.920	20%	16.421.430	25%	0	0%	16.421.430	25%	49.265.490	75%
79	Colegio Nacional Wilhelm Allgier	Fidel Melgarejo Ch. SAN LUCAS CONSTRUC.	Construccion de Tinglado	499.320.000	499.320.000		45,00%		45,00%	99.864.000	20%	99.864.000	100%	0	0%	99.864.000	100%	0	0%
80	Colegio Nacional Gral. F. I. Resquín	Christian Martinez CM GROUP	Construccion de Tinglado	337.938.494	337.938.494		30,00%		30,00%	67.587.699	20%	16.918.894	25%	0	0%	16.918.894	25%	50.668.805	75%

DIONISIO PANIAGUA GARCIA
Ingeniero Civil
Reg. MOPC Nº 3185

FIN DEL INFORME
