GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 2

Mes: Febrero-Marzo

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007	100%	180.615.506	29,76%	53.749.418	21,29%	38.458.553	51,05%	92.207.971
A	**Total por Contrato**	**100%**	**180.615.506**	**29,76%**	**53.749.418**	**21,29%**	**38.458.553**	**51,05%**	**92.207.971**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	36.123.101	10.749.884	7.691.711	18.441.594
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**36.123.101**	**10.749.884**	**7.691.711**	**18.441.594**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				30.766.842	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**30.766.842**	

Certificado Básico Nº	**2**
Mes:	**Febrero-Marzo**
Contrato N°:	**59/2023**
Monto Básico:	**180.615.506**
Contratista:	Dionel Olmedo Núñez
Fecha de Inicio:	**22-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**90**
Fecha de terminación prevista:	**21-mar-24**
Prórroga:	**36**
Fecha de terminación con prórroga:	**26-abr-24**

SON GUARANIES: Treinta millones, setecientos sesenta y seis mil, ochocientos cuarenta y dos.----------

Dionel Olmedo Núñez
Contratista - Representante Legal

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Carlos [illegible]
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

ACTA DE MEDICIÓN N° 2

CERTIFICADO BASICO Nº 2

CONTRATO Nº 59/2023

REFERENCIA: L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007

CONTRATISTA: DIONEL OLMEDO NÚÑEZ

En el Distrito de CARLOS ANTONIO LÓPEZ, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 27 días del mes de marzo del 2024, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras y el Sr. Dionel Olmedo Núñez en representación de la Empresa.

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante los meses de diciembre-2023 y enero-2024.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 4 (cuatro) ejemplares de un mismotenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. -

Dionel Olmedo Núñez
Contratista
ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C. 5211789-8
Carlos A. López-Itapúa Cel 0985-916459

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapuá
Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 2

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Febrero-Marzo

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007

CONTRATISTA:	Dionel Olmedo Núñez	FECHA DE INICIO:	19-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	180.615.506	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	21-mar-24
CONTRATO N°:	59/2023	PRÓRROGA:	36
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	26-abr-24

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Replanteo y marcación , con Equipo Topográfico	Metro lineal	448	9.596	4.299.008	0,024	0,22%	99,78%	100,00%	0,000	0,024	0,024	1,00	447	448,00	9.596	4.289.412	4.299.008
2	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N°. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva.-	Unidad	1	1.243.656	1.243.656	0,007	100,00%	0,00%	100,00%	0,007	-	0,007	1,00	0	1,00	1.243.656	0	1.243.656
3	Carteles de señalización de chapa N°. 24 (0,30 x 0,80).	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	0,028	100,00%	0,00%	100,00%	0,028	-	0,028	1,00	0	1,00	5.000.000	0	5.000.000
4	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cúbicos	605,696	4.028	2.439.743	0,014	24,55%	45,45%	70,00%	0,003	0,006	0,009	148,7	275,2872	423,99	598.964	1.108.857	1.707.820
5	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,40 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	43,01	1.116.875	48.036.793	0,266	43,48%	16,52%	60,00%	0,116	0,044	0,160	18,7	7,106	25,81	20.885.563	7.936.514	28.822.076
6	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,30 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	0,936	1.079.375	1.010.295	0,006	50,21%	9,79%	60,00%	0,003	0,001	0,003	0,47	0,0916	0,56	507.306	98.871	606.177
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).-	Metros cuadrados	3.028,48	36.802	111.454.120	0,617	22,33%	21,46%	43,79%	0,138	0,132	0,270	676,27	650	1.326,27	24.887.917	23.921.300	48.809.217
8	Relleno y compactacion de terreno -Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	43,01	39.971	1.719.152	0,010	35,81%	64,19%	100,00%	0,003	0,006	0,010	15,4	27,61	43,01	615.553	1.103.599	1.719.153
9	Limpieza general y final del sitio de obras.-	Metros cuadrados	3.136	1.726	5.412.736	0,030	0,02%	0,00%	0,02%	0,000	-	0,000	0,5	0	0,50	863	0	863
Total					180.615.506	100,00%				29,76%	21,29%	51,05%				53.749.418	38.458.553	92.207.971

Contrato N°:

Contratista-Representante Legal

POSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C: 5211789-8
Carlos A. López-Itapúa Cel 0985-910459

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Carlos Javier Armirilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 2

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: Febrero-Marzo

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007			
CONTRATISTA:	Dionel Olmedo Núñez	FECHA DE INICIO:	22-dic-23
DE LA OFERTA GS:	180.615.506	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	21-mar-24
CONTRATO N°:	59/2023	PRÓRROGA:	36
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	26-abr-24

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007						PLAZO DE EJECUCIÓN				TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	
1	Replanteo y marcación , con Equipo Topográfico	Metro lineal	448	9.596	4.299.008	4.299.008	0	0		2,38%
2	Cartel de Obra (Estructura de madera y chapa N°. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión adhesiva.-	Unidad	1	1.243.656	1.243.656	1.243.656	0	0		0,69%
3	Carteles de señalización de chapa N°. 24 (0,30 x 0,80).	Unidad Medida Global	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0		2,77%
4	Construcción de empedrado - Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0,20 m).	Metros cúbicos	605,696	4.028	2.439.743	1.219.872	1.219.872	0		1,35%
5	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,40 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	43,01	1.116.875	48.036.793	0	24.018.397	24.018.397	0	26,60%
6	CORDON ESCONDIDO de H°. Desarrollo 0,30 m. espesor 0,12 m. cargado in situ	Metros cúbicos	0,936	1.079.375	1.010.295	0	505.148	505.148	0	0,56%
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0,15 m).-	Metros cuadrados	3.028,48	36.802	111.454.120	0	55.727.060	55.727.060	0	61,71%
8	Relleno y compactacion de terreno -Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.	Metros cúbicos	43,01	39.971	1.719.152	0	859.576	0	0	0,95%
9	Limpieza general y final del sitio de obras.-	Metros cuadrados	3.136	1.726	5.412.736	2.706.368	0	0	2706368	3,00%
	Total				**180.615.506**					100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						14.468.904	82.330.052	80.250.604	2.706.368	180.615.506
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						8,01%	45,58%	44,43%	1,97%	100,00%

Fecha de Inicio:

Contratista-Representante Legal

ROSCO CONSTRUCCIONES R.U.C. 5211789-8 Carlos A. López-Itapúa Cel 0985-910459

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras

Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 2

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Febrero-Marzo

L.C.D. N° 34/2023 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº 2.515 - GENERAL PEDRO DUARTE – KM. 2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ – PLURIANUAL – I.D. N° 437.007

Contrato N°: 59/2023			
Monto del Contrato:	180.615.506	**Fecha de terminación prevista:**	21-mar-24
Plazo Contractual:	90	**Prórroga:**	36
Inicio de Obra:	22-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	26-abr-24

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	14.468.904	14.468.904	14.468.904	14.468.904	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%
Enero	46.005.482	60.474.385	39.280.515	53.749.418	25,47%	33,48%	21,75%	29,76%
Febrero	72.649.140	133.123.525	15.497.635	69.247.053	40,22%	73,71%	10,90%	40,66%
Marzo	47.491.978	180.615.506	22.960.918	92.207.971	26,29%	100,00%	10,39%	51,05%
Abril	0	0						

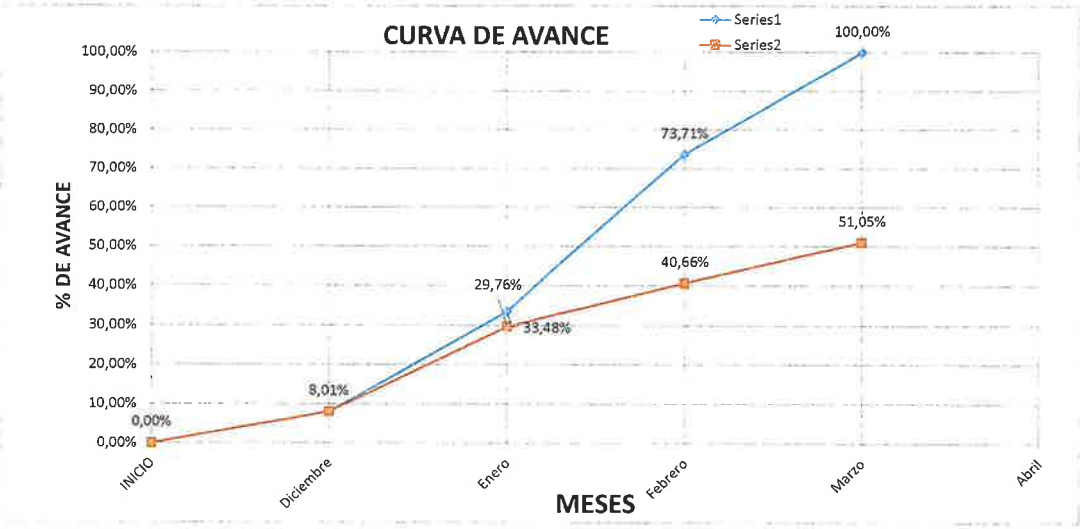

Dionel Olmedo Núñez
Contratista-Representante Legal

ROSCO CONSTRUCCIONES
R.U.C. 5211789-8
Carlos A. López-Itapúa Cel 0985-910459

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Carlos Javier Arrúa
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

INFORME DE OBRAS – CERTIFICADO NRO 2

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO CON CORDÓN ESCONDIDO FRENTE A LA ESCUELA BÁSICA Nº2515 GENERAL PEDRO DUARTE - KM2 COLONIA 7 DE AGOSTO - CARLOS ANTONIO LÓPEZ - PLURIANUAL- ID:437.007

EMPRESA CONTRATISTA: SR. DIOSNEL OLMEDO NUÑEZ	**Nº DE TELÉFONO: 0985- 910459**	**Nº CONTRATO: 59/2023**	**FECHA DE INICIO: 22-12-2023**
MODALIDAD / LOTE: CD Nº 34/2023	**PLAZO CONTRACTUAL: 90 DÍAS**	**MONTO DEL CONTRATO: 180.615.506 Gs.**	**TERMINACIÓN PREVISTA: 21-03-2024.**

Fiscal a Cargo: **Secretaria de Obras Públicas.**

Fecha de Visita: **MARZO del 2023**

Avance de Obra: **51.05%**

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra tiene atraso en su avance con relación a su cronograma físico financiero, cuadro y curva de avance previsto. Se ha remitido solicitud de mayor avance.

Se anexa registro fotográfico de avances.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras Fiscalizacion
Gobernación de Itapúa de Obras

Teléf: +595720456B
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal c/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
