MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN COLECTORA "

LMCN No.19/2024 ID N°: 452.252 CONTRATO N° 22/2024

EMPRESA CONTRATISTA: PEREIRA CONSTRUCCIONES

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:02

PERIODO: 04 DE DICIEMBRE DE 2024- 26 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE PRESENTACION	26/12/2024
FECHA DE INICIO	6/11/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	60
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	60
DIAS TRANSCURRIDOS	50
DIAS DE RETRAZO	0
FECHA FIN DE PLAZO	4/1/2025

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN COLECTORA "	430.217.707	75,05%	24,95%	100,00%	322.864.310	107.353.397	430.217.707
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	0,05% x dia MULTAS	215.109				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	86.043.541	75,05%	24,95%	100,00%	64.572.862	21.470.679	**86.043.541**
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	21.510.885	75,05%	24,95%	100,00%	16.143.216	5.367.670	21.510.885
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**107.554.427**	75,05%	24,95%	100,00%	**80.716.078**	**26.838.349**	**107.554.427**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**242.148.233**	**80.515.048**	**322.663.280**

SON GUARANÍES: OCHENTA MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y OCHO.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

PEREIRA
CONSTRUCCIONES
RUC: 5434550 - 2
San Ignacio - Misiones -Py.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN COLECTORA "
LMCN No.19/2024 ID N°: 452.252 CONTRATO N° 22/2024
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:02
PERIODO: 04 DE DICIEMBRE DE 2024- 26 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE PRESENTACION	26/12/2024
FECHA DE INICIO	6/11/2024
PLAZO INICIAL (DIAS)	60
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	60
DIAS TRANSCURRIDOS	50
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO	4/1/2025

N°	Descripción	Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
		Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	cuadrados	1260	3.579	4.509.540	1.260,00		1.260,00	4.509.540		4.509.540	100,00%		100,00%
2	Desmonte de terreno	cuadrados	1260	2.745	3.458.700	1.260,00		1.260,00	3.458.700		3.458.700	100,00%		100,00%
3	Cartel con impresion	Unidad	1	1.885.000	1.885.000		1,00	1,00		1.885.000	1.885.000		100,00%	100,00%
4	Preparacion de obra	cuadrados	1260	5.008	6.310.080	1.260,00		1.260,00	6.310.080		6.310.080	100,00%		100,00%
5	Relleno y compactacion de terreno	Metros Cubicos	252	53.800	13.557.600	120,00	132,00	252,00	6.456.000	7.101.600	13.557.600	47,62%	52,38%	100,00%
6	Construccion de cordon cuneta	Metros Cubicos	40	1.347.999	53.919.960	10,00	30,00	40,00	13.479.990	40.439.970	53.919.960	25,00%	75,00%	100,00%
7	Construcción de hormigon armado	cuadrados	1260	251.000	316.260.000	1.150,00	110,00	1.260,00	288.650.000	27.610.000	316.260.000	91,27%	8,73%	100,00%
8	Relleno y Compactación de terreno.	Metros Cubicos	130	45.980	5.977.400		130,00	130,00		5.977.400	5.977.400		100,00%	100,00%
9	Servicio de señalización de caminos (Señalización Horizontal)	cuadrados	63	60.999	3.842.937		63,00	63,00		3.842.937	3.842.937		100,00%	100,00%
10	Servicio de señalización de caminos (Señalizacion Vertical)	cuadrados	6,75	1.265.000	8.538.750		6,75	6,75		8.538.750	8.538.750		100,00%	100,00%
11	Servicio de Colocación de Tachas Reflectivas Bidireccionales	Unidad	100	57.850	5.785.000		100,00	100,00		5.785.000	5.785.000		100,00%	100,00%
12	Limpieza de obra.	cuadrados	1260	4.899	6.172.740		1.260,00	1.260,00		6.172.740	6.172.740		100,00%	100,00%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**430.217.707**				**322.864.310**	**107.353.397**	**430.217.707**	**75,05%**	**24,95%**	**100,00%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

PEREIRA
CONSTRUCCIONES
RUC: 5434550 - 2
San Ignacio - Misiones -Py.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN COLECTORA "

LMCN No.19/2024 ID N°: 452.252 CONTRATO N° 22/2024
EMPRESA CONTRATISTA: PEREIRA CONSTRUCCIONES
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:02
PERIODO: 04 DE DICIEMBRE DE 2024- 26 DE DICIEMBRE DE 2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 26 días del mes de diciembre del año 2024, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "PEREIRA CONSTRUCCIONES", REPRESENTADA POR el SRA. RAMONA MARINA PEREIRA DE DEL PUERTO, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	1.260	1260,00		1260,00
2	Desmonte de terreno	Metros cuadrados	1260	1260,00		1260,00
3	Cartel con impresion	Unidad	1	0,00	1,00	1,00
4	Preparacion de obra	Metros cuadrados	1260	1260,00		1260,00
5	Relleno y compactacion de terreno	Metros Cubicos	252	120,00	132,00	252,00
6	Construccion de cordon cuneta	Metros Cubicos	40	10,00	30,00	40,00
7	Construcción de hormigon armado	Metros cuadrados	1260	1150,00	110,00	1260,00
8	Relleno y Compactación de terreno.	Metros Cubicos	130		130,00	130,00
9	Servicio de señalización de caminos (Señalización Horizontal)	Metros cuadrados	63		63,00	63,00
10	Servicio de señalización de caminos (Señalizacion Vertical)	Metros cuadrados	6,75		6,75	6,75
11	Servicio de Colocación de Tachas Reflectivas Bidireccionales	Unidad	100		100,00	100,00
12	Limpieza de obra.	Metros cuadrados	1260		1260,00	1260,00
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
PEREIRA CONSTRUCCIONES
RUC: 5434550 - 2
San Ignacio - Misiones -Py.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN COLECTORA "

LMCN No.19/2024 ID N°: 452.252 CONTRATO Nº 22/2024

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA:		OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON EN											
MONTO TOTAL DE OBRA Gs		430.217.707											
TIEMPO DE EJECUCION (DIAS)		60											
ITEM	DESCRIPCIÓN	nov-24				dic-24				Monto	%		
	0	30 dias				60 dias							
1	Replanteo y marcación									4.509.540	1,05		
2	Desmonte de terreno									3.458.700	0,80		
3	Cartel con impresion									1.885.000	0,44		
4	Preparacion de obra									6.310.080	1,47		
5	Relleno y compactacion de terreno									13.557.600	3,15		
6	Construccion de cordon cuneta									53.919.960	12,53		
7	Construcción de hormigon armado									316.260.000	73,51		
8	Relleno y Compactación de terreno.									5.977.400	1,39		
9	Servicio de señalización de caminos (Señalización Horizontal)									3.842.937	0,89		
10	Servicio de señalización de caminos (Señalizacion Vertical)									8.538.750	1,98		
11	Servicio de Colocación de Tachas Reflectivas Bidireccionales									5.785.000	1,34		
12	Limpieza de obra.									6.172.740	1,43		
	TOTAL									430.217.707	100,00		

Contractual		
Monto Bruto Mensual Contractual	215.108.854	215.108.854
Porcentaje Avance Mensual Contractual	50,00%	50,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	50,00%	100,00%

Certificado		
Monto Bruto Mensual Certificado	322.864.310	107.353.397
Porcentaje Avance Mensual Certificado	75,05%	24,95%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	75,05%	100,00%

	Mes1	Mes2
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	50,00%	100,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	75,05%	100,00%

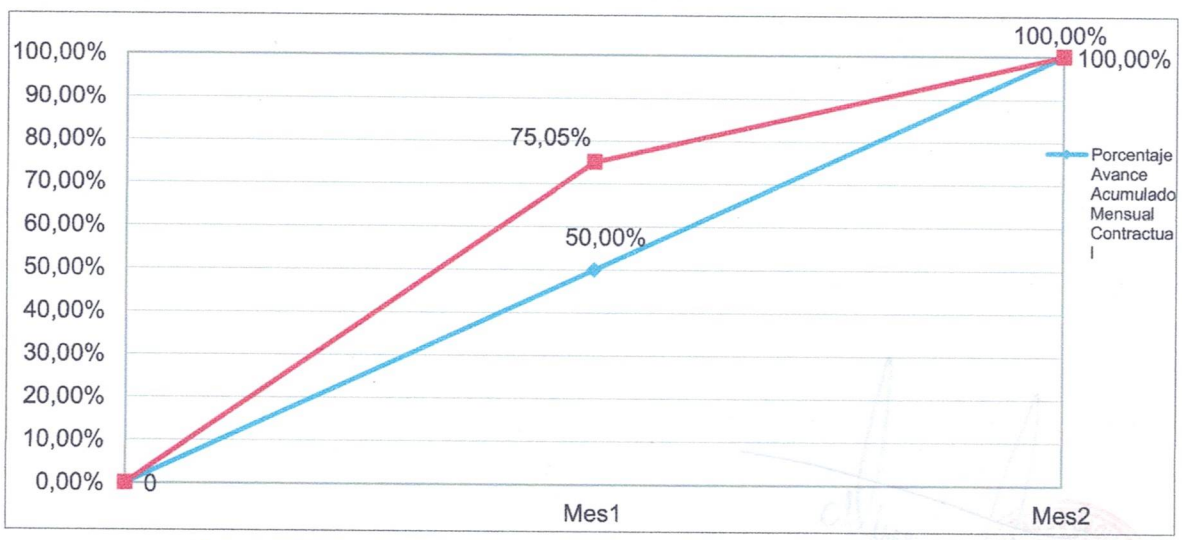

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
PEREIRA CONSTRUCCIONES
RUC: 5434550 - 2
San Ignacio - Misiones -Py.

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto
