GOBERNACION DE ITAPÚA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 3

Mes: FEBRERO

Licitación 456.038 - READECUACION DE LUMINARIAS EN LA GOBERNACION DE ITAPUA Y ENTORNO - PLURIANUAL									
Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Licitación 456.038 - READECUACION DE LUMINARIAS EN LA GOBERNACION DE ITAPUA Y ENTORNO - PLURIANUAL	100%	321.243.860	60,16%	193.244.700	29,88%	95.999.210	90,04%	289.243.910
A	**Total por Contrato**	**100%**	**321.243.860**	**60,16%**	**193.244.700**	**29,88%**	**95.999.210**	**90,04%**	**289.243.910**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	20,00%	64.248.772	38.648.940	19.199.842	57.848.782
B.II	Para Fondo de Reparo	0,00%	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**64.248.772**	**38.648.940**	**19.199.842**	**57.848.782**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				76.799.368	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**76.799.368**	

Certificado Básico Nº	3
Mes:	FEBRERO
Contrato N°:	90/2024
Monto Básico:	321.243.860
Contratista:	CRISTIAN RAMÓN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Fecha de Inicio:	6-dic-24
Plazo de Ejecución (dias corridos):	180
Fecha de terminación contractual:	4-jun-25
Prórroga / Suspensión de plazo:	----------
Fecha de terminación prevista:	----------
Vigencia Póliza Contrato:	
Vigencia Póliza Anticipo:	

SON GUARANIES: Setenta y seis millones, setecientos noventa y nueve mil, trescientos sesenta y ocho----------

CM GROUP & ASOCIADOS
PROVEEDORES DEL ESTADO
RUC: 2.142.222 - 2

CRISTIAN RAMÓN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Contratista-Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
Ing. Gustavo Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

(35)

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3
PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO
MES: FEBRERO

Licitación 456.038 - READECUACION DE LUMINARIAS EN LA GOBERNACION DE ITAPUA Y ENTORNO - PLURIANUAL

CONTRATISTA:	CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNÁNDEZ	FECHA DE INICIO:	6-dic-24
MONTO DE LA OFERTA:	321.243.360	Fecha de terminación contractual:	4-jun-25
CONTRATO N°:	90/2024	Prórroga / Suspensión de plazo:	- ————
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180	Fecha de terminación prevista:	————

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
Licitación 456.038 - READECUACION DE LUMINARIAS EN LA GOBERNACION DE ITAPUA Y ENTORNO - PLURIANUAL						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Provisión e instalación de AP LED 150W 220V 6500K (Incluye columna galv 3" 6 metros, brazo de 1 m, jabalina de cobre, caja de conexión metalica, cableado TPR, zocalo de mampostería)	UNIDAD	38,00	2.603.250	98.923.500	0,308	100,00%	0,00%	100,00%	0,308	-	0,308	38,00	0,00	38,00	98.923.500	0	98.923.500
2	Provisión e instalación de cable NYY subterraneo 2X6MM2 (Incluye caño electroducto, excavacion, rotura y reposicion de piso)	ML	580,00	34.843	20.208.940	0,063	100,00%	0,00%	100,00%	0,063	-	0,063	580,00	0,00	580,00	20.208.940	0	20.208.940
3	Provisión e instalación de AP LED 200W 220V 6500K (Incluye cable TPR, camion grua canasta)	UNIDAD	46,00	1.161.450	53.426.700	0,166	100,00%	0,00%	100,00%	0,166	-	0,166	46,00	0,00	46,00	53.426.700	0	53.426.700
4	Provisión e instalación de Tablero automatizado para encendido (Incluye conectores dentados, contactor trifasico, reloj horario)	U.M.G.	2,00	3.083.850	6.167.700	0,019	100,00%	0,00%	100,00%	0,019	-	0,019	2,00	0,00	2,00	6.167.700	0	6.167.700
5	Provisión e instalación de cable preensamblado 2x16mm2 (Incluye camión grua, conector dentado, abrazadera tipo C, mordaza de sujeción y retención)	ML	380,00	26.032	9.892.160	0,031	100,00%	0,00%	100,00%	0,031	-	0,031	380,00	0,00	380,00	9.892.160	0	9.892.160
6	Provisión e instalación de Proyector led 50W RGB 220V	UNIDAD	15,00	520.650	7.809.750	0,024	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,024	0,024	0,00	15,00	15,00	0	7.809.750	7.809.750
7	Provisión e instalación de Proyector led 100W 6500K 220V	UNIDAD	10,00	468.585	4.685.850	0,015	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,015	0,015	0,00	10,00	10,00	0	4.685.850	4.685.850
8	Provisión e instalación de cable NYY 2X6MM2 (Incluye caño electroducto, cajas de conexión y otros)	ML	220,00	30.838	6.784.360	0,021	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,021	0,021	0,00	220,00	220,00	0	6.784.360	6.784.360
9	Provisión e instalación de letras corporeas con iluminación led difusa (GOBERNACION DE ITAPUA) (Incluye caño electroducto, cajas de conexión, alimentación electrica desde el TG y otros)	U.M.G.	1,00	6.808.500	6.808.500	0,021	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,021	0,021	0,00	1,00	1,00	0	6.808.500	6.808.500
10	Provisión e instalación de logo corporea de estructura metalica con iluminación led difusa (logo de GOBERNACION DE ITAPUA) (Incluye caño electroducto, cajas de conexión, alimentación electrica desde el TG y otros)	U.M.G.	1,00	5.486.850	5.486.850	0,017	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,017	0,017	0,00	1,00	1,00	0	5.486.850	5.486.850
11	Provisión e instalación de bandera corporea de estructura metalica con iluminación led difusa (Bandera de GOBERNACION DE ITAPUA) (Incluye caño electroducto, cajas de conexión, alimentación electrica desde el TG y otros)	U.M.G.	2,00	4.365.450	8.730.900	0,027	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,027	0,027	0,00	2,00	2,00	0	8.730.900	8.730.900
12	Provisión e instalación de Pantalla led 200x200CM 4K FHD exterior P5 MODULO LED (Incluye soporte metálico)	U.M.G.	1,00	24.110.100	24.110.100	0,075	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Provisión e instalación de consola controlador de pantalla led con cableado de señal débil (Incluye ducto PVC, soporte y otros)	U.M.G.	1,00	7.889.850	7.889.850	0,025	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Provisión e instalación de barra led RVB 72W modulo luminario (24 x LED RGB 3W) con lupa outdoor (Incluye ducto PVC, soporte metalico y otros)	UNIDAD	12,00	3.083.850	37.006.200	0,115	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,115	0,115	0,00	12,00	12,00	0	37.006.200	37.006.200
15	Provisión e instalación de cable NYY 2X6MM2 (Incluye caño electroducto, cajas de conexión y otros)	ML	200,00	30.838	6.167.600	0,019	75,00%	25,00%	100,00%	0,014	0,005	0,019	150,00	50,00	200,00	4.625.700	1.541.900	6.167.600
16	Provisión de tubo led T8 18W 6500K 220V	UNIDAD	100,00	38.848	3.884.800	0,012	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,012	0,012	0,00	100,00	100,00	0	3.884.800	3.884.800
17	Provisión de lampara led 15W 6500k e27 220V	UNIDAD	100,00	30.838	3.083.800	0,010	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,010	0,010	0,00	100,00	100,00	0	3.083.800	3.083.800
18	Provisión de lampara led 30W 6500k e27 220V	UNIDAD	100,00	65.682	6.568.200	0,020	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,020	0,020	0,00	100,00	100,00	0	6.568.200	6.568.200
19	Provisión de panel led 40W 60x60cm 6500k 220V (Embutido)	UNIDAD	20,00	180.405	3.608.100	0,011	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,011	0,011	0,00	20,00	20,00	0	3.608.100	3.608.100
Total					321.243.360	100,00%				60,16%	29,84%	90,04%				193.244.700	95.999.210	289.243.910

CRISTIAN RAMÓN MARTINEZ FERNÁNDEZ
Contratista-Representante Legal

CM GROUP & ASOCIADOS
PROVEEDORES DEL ESTADO
RUC: 2.142.222 - 2

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: FEBRERO

Licitación 456.038 - READECUACION DE LUMINARIAS EN LA GOBERNACION DE ITAPUA Y ENTORNO - PLURIANUAL			
CONTRATISTA:	CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNÁNDEZ	FECHA DE INICIO:	6-dic-24
MONTO DE LA OFERTA GS:	321.243.860	FECHA DE FERMINACION PREVISTA:	4-jun-25
CONTRATO N°:	90/2024	PRÓRROGA:	————
PLAZO DE EJECUCIÓN:	180	FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:	————

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Licitación 456.038 - READECUACION DE LUMINARIAS EN LA GOBERNACION DE ITAPUA Y ENTORNO - PLURIANUAL						PLAZO DE EJECUCIÓN							TOTAL
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
1	Provisión e instalación de AP LED 150W 220V 6500K (Incluye columna galv 3" 6 metros, brazo de 1 m, jabalina de cobre, caja de conexion metalica, cableado TPR, rocalla de manposteria)	UNIDAD	38,00	2.603.250	98.923.500	24.730.875	24.730.875	24.730.875	24.730.875	0	0	0	30,79%
2	Provisión e instalación de cable NYY subterraneo 2X6MM2 (Incluye caño electroducto, excavacion, rotura y reposicion de piso)	ML	580,00	34.843	20.208.940	20.208.940	0	0	0	0	0	0	6,29%
3	Provision e instalación de AP LED 200W 220V 6500K (Incluye cable TPR, camion grua canasta)	UNIDAD	46,00	1.161.450	53.426.700	0	26.713.350	26.713.350	0	0	0	0	16,63%
4	Provisión e instalación de Tablero automatizado para encendido (Incluye conectores dentados, contactor trifasico, reloj horario)	U.M.G.	2,00	3.083.850	6.167.700	6.167.700	0	0	0	0	0	0	1,92%
5	Provisión e instalación de cable preensamblado 2x10mm2 (Incluye camión grua, conector dentado, abrazadera tipo C, montaza de tolación y retención)	ML	380,00	26.032	9.892.160	4.946.080	4.946.080	0	0	0	0	0	3,08%
6	Provisión e instalación de Proyector led 50W RGB 220V	UNIDAD	15,00	520.650	7.809.750	0	0	0	0	0	7.809.750	0	2,43%
7	Provisión e instalación de Proyector led 100W 6500K 220V	UNIDAD	10,00	468.585	4.685.850	0	0	0	0	0	4.685.850	0	1,46%
8	Provisión e instalación de cable NYY 2X6MM2 (Incluye caño electroducto, cajas de conexión y otros)	ML	220,00	30.838	6.784.360	6.784.360	0	0	0	0	0	0	2,11%
9	Provisión e instalación de letras corporeas con iluminación led difusa (GOBERNACION DE ITAPUA) (Incluye caño electroducto, cajas de conexión, alimentación electrica desde el TG y otros)	U.M.G.	1,00	6.808.500	6.808.500	0	0	0	0	0	0	6.808.500	2,12%
10	Provisión e instalación de logo corporea de estructura metalica con iluminación led difusa (logo de GOBERNACION DE ITAPUA) (Incluye caño electroducto, cajas de conexión, alimentación electrica desde el TG y otros)	U.M.G.	1,00	5.486.850	5.486.850	0	0	0	0	0	0	5.486.850	1,71%
11	Provisión e instalación de bandera corporea de estructura metalica con iluminación led difusa (Bandera de GOBERNACION DE ITAPUA) (Incluye caño electroducto, cajas de conexión, alimentación electrica desde el TG y otros)	U.M.G.	2,00	4.365.450	8.730.900	0	0	0	0	0	0	8.730.900	2,72%
12	Provisión e instalación de Pantalla led 200x200CM 4K FHD exterior P5 MODULO LED (Incluye soporte metálico)	U.M.G.	1,00	24.110.100	24.110.100	0	0	0	0	24.110.100	0	0	7,51%
13	Provisión e instalación de consola controlador de pantalla led con cableado de señal dóll (Incluye ducto PVC, soporte y otros)	U.M.G.	1,00	7.889.850	7.889.850	0	0	0	0	0	7.889.850	0	2,46%
14	Provisión e instalación de barra led RVB 72W modulo luminario (24 x LED RGB 3W) con lupa outdoor (Incluye ducto PVC, soporte metalico y otros)	UNIDAD	12,00	3.083.850	37.006.200	0	0	0	18.503.100	18.503.100	0	0	11,52%
15	Provisión e instalación de cable NYY 2X6MM2 (Incluye caño electroducto, cajas de conexión y otros)	ML	200,00	30.838	6.167.600	0	0	0	0	0	6.167.600	0	1,92%
16	Provisión de tubo led T8 18W 6500K 220V	UNIDAD	100,00	38.848	3.884.800	0	0	0	0	0	3.884.800	0	1,21%
17	Provisión de lampara led 15W 6500k e27 220V	UNIDAD	100,00	30.838	3.083.800	0	0	0	0	0	3.083.800	0	0,96%
18	Provisión de lampara led 30W 6500k e27 220V	UNIDAD	100,00	65.682	6.568.200	0	0	0	0	0	6.568.200	0	2,04%
19	Provisión de panel led 40W 60x60cm 6500k 220V (Embutido)	UNIDAD	20,00	180.405	3.608.100	0	0	0	0	0	3.608.100	0	1,12%
	Total				321.243.860								100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						62.837.955	56.390.305	51.444.225	43.233.975	42.613.200	43.697.950	21.026.230	321.243.860
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						19,56%	17,55%	16,01%	13,46%	13,27%	13,60%	6,55%	100%

CM GROUP & ASOCIADOS
PROVEEDORES DEL ESTADO
CRISTIAN RAMON MARTINEZ FERNANDEZ
Contratista
RUC: 4.142.222 - 2

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 3

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: FEBRERO

Licitación 456.038 - READECUACION DE LUMINARIAS EN LA GOBERNACION DE ITAPUA Y ENTORNO - PLURIANUAL			
Contrato N°:	90/2024		
Monto del Contrato:	321.243.860	**Fecha de terminación contractual:**	4-jun-25
Plazo Contractual:	180	**Prórroga / Suspensión de plazo:**	----------
Inicio de Obra:	6-dic-24	**Fecha de terminación prevista:**	----------

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	62.837.955	62.837.955	80.310.966	80.310.966	19,56%	19,56%	25,00%	25,00%
Enero	56.390.305	119.228.260	112.933.734	193.244.700	17,55%	37,11%	35,16%	60,16%
Febrero	51.444.225	170.672.485	95.999.210	289.243.910	16,01%	53,13%	29,88%	90,04%
Marzo	43.233.975	213.906.460	0	0	13,46%	66,59%	0,00%	
Abril	42.613.200	256.519.660	0	0	13,27%	79,85%	0,00%	
Mayo	43.697.950	300.217.610	0	0	13,60%	93,45%	0,00%	
Junio	21.026.250	321.243.860	0	0	6,55%	100,00%	0,00%	

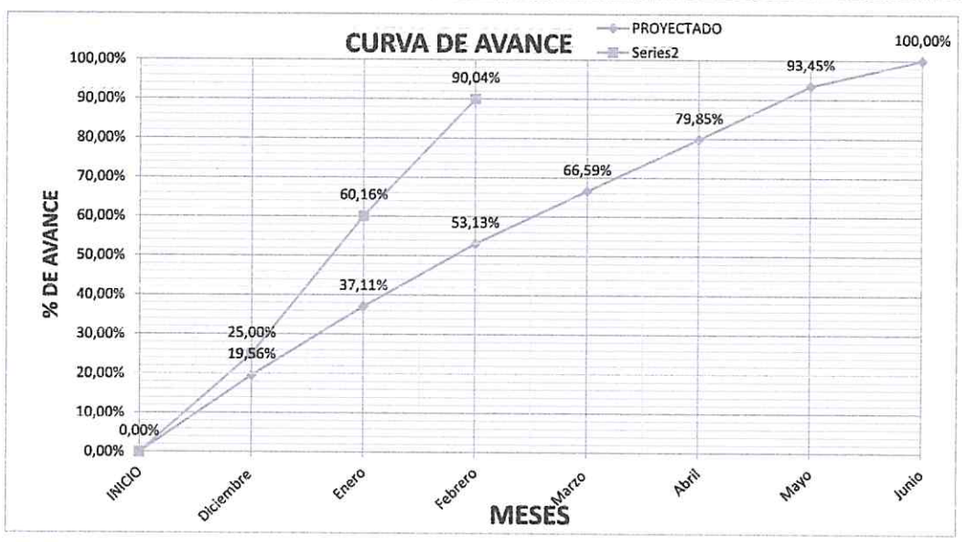

CM GROUP & ASOCIADOS
PROVEEDORES DEL ESTADO
RUC: 2.142.222 - 2

CRISTIAN RAMÓN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Contratista-Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Arq. Natalia González
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
