INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 14/2024 - Construcción de Polideportivo Multiuso en la Escuela Básica N° 233 Dr. José G. Rodríguez de Francia del Distrito de Encarnación - Ad Referéndum – Plurianual – ID 452.278.

OBRA: - Construcción de Polideportivo Multiuso

BENEFICIARIO: Escuela Básica N° 233 Dr. José G. Rodríguez de Francia

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 04/Julio/2025

FECHA DE INFORME DE OBRA: 08/Julio/2025

AVANCE DE OBRA: 70.56%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Calle Tomas R. Pereira c/ Carlos A. López	Encarnación	x1= 612219 - 6976344	931.998.100 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Jorge H. Franco Riveros		96/2024	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
210 días	06/Diciembre/2024	05/setiembre/2025	63 días - Resolución N° 837/2025

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución. Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos.

Se han ejecutado los trabajos de terminación de piso de hormigón elaborado para cancha del polideportivo, revoque interior exterior, cámara séptica con sus conexiones, terminación de piso de hormigón elaborado para patio y otros.

La obra tiene un avance a la fecha de 70.56%. Se adjuntan fotografías de la obra.

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Ing. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº: 24/2024 "REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE USF CAPITÁN MEZA PUERTO - AD-REFERÉNDUM - PLURIANUAL" - I.D. N° 454.924.-
OBRA: "Refacción y Ampliación de Unidad de Salud Familiar"
BENEFICIARIO: Unidad de Salud Familiar de Capitán Meza Puerto
FISCAL DE OBRAS: Arq. Hernán Morinigo
FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 02/julio/2025
FECHA DE INFORME: 08/julio/2025
AVANCE DE OBRA: 56.59%

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Unidad de Salud Familiar – Capitán Meza Puerto	Capitán Meza	1.178.400.167 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Arq. Fabio Armando López Curtido	0983-440-928	40/2024
PLAZO CONTRACTUAL - PRORROGA	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
210 días - 83 días/Resolución N° 766/2025 10 días/Resolución N° 1075-2025 14 días/Resolución N° 1239-2025	19 - Noviembre - 2024	02/Octubre/2025

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución. Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos.

Se han ejecutado los trabajos de terminación de revoque interior y exterior, provisión y colocación de piso de mosaico granítico, zócalos, terminación de techo con chapa y estructura metálica, instalaciones hidrosanitarias, y otros.

La obra tiene un avance a la fecha de 56.59% correspondiente al mes de junio del año 2025.

Se adjuntan fotografías de la obra.

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 25/2024 - Construcción de Empedrados Zona Nordeste - Sur - Centro - Ad Referéndum - Plurianual - ID 454.947
OBRA: Construcción de Empedrados
BENEFICIARIO: Tramo Ruta 8 viejo - Distrito de General Artigas
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 03/Julio/2025
FECHA DE INFORME: 09/Julio/2025
AVANCE DE OBRA: 36.94%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DEL CONTRATO
Tramo Ruta 8 viejo	General Artigas	x1= 577226 - 7021880	1.000.000.000 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	0981 407029	63/2024	L 3 – Zona Sur
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
240 días	29/Noviembre/2024	06/Noviembre/2025	102 días - Resolución N° 933/2025

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución. Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos. Se han ejecutado los trabajos de provisión de tierra y preparación de colchón para empedrado, provisión y colocación de piedra basáltica para empedrado, trabajos de preparación y carga de hormigón para cordón cuneta y badenes.

La obra tiene un avance a la fecha de 36.94%. El avance total del contrato es de 76.68%.

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

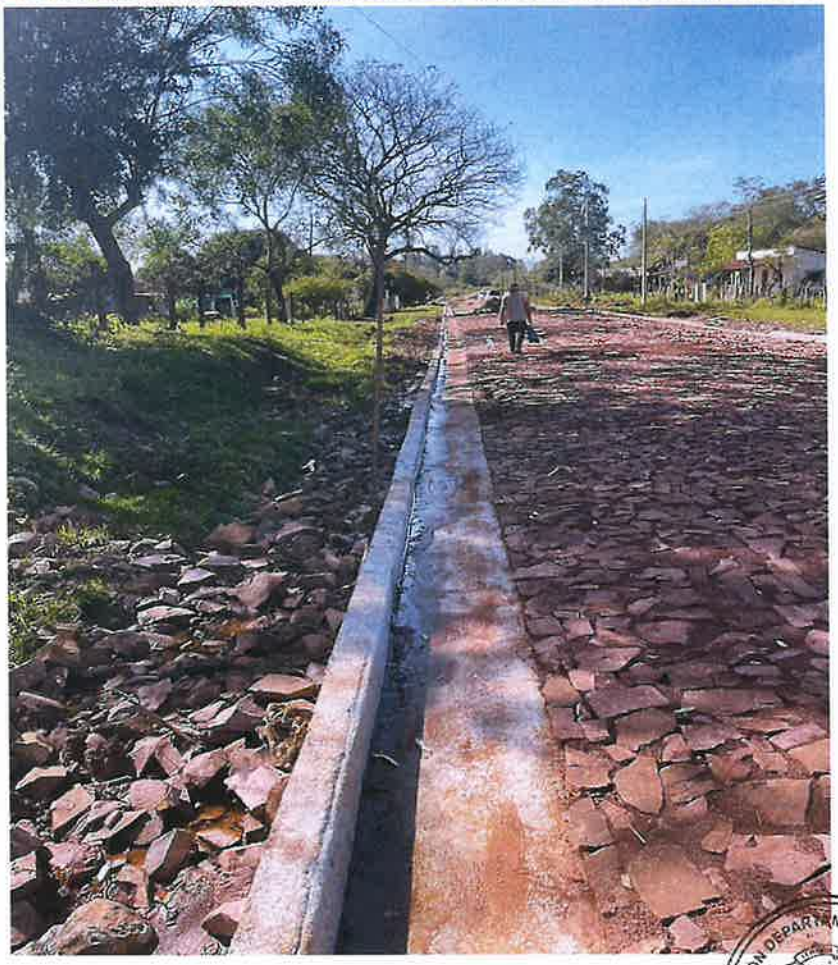

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Ing. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa - RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Leandro Irrazabal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 31/2024 - Construcción de Comisaría N° 46 para la Compañía San Dionisio del Distrito de General Delgado – Plurianual ID N° 455.977
OBRA: Construcción de Comisaría N° 46.
BENEFICIARIO: Compañía San Dionisio del Distrito de General Delgado
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 02/Julio/2025
FECHA DE INFORME: 07/julio/2025
AVANCE DE OBRA: 75.61%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Compañía San Dionisio	General Delgado	x1= 548495 - 6996253	493.179.787 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Ing. Fabio A. Fernández	0985-787671	53/2024	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
210 días	28/Noviembre/2024	06/Setiembre/2025	72 días - Resolución N° 806-2025

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución. Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos.

Se han ejecutado los trabajos de piso de hormigón, trabajos de canaletas y bajadas, revoques de mochetas y alfeizar de ventanas, carpeta hidrófuga, terminación de guarda obra y otros rubros. La obra tiene un avance a la fecha de 75.61%.

Se adjuntan fotografías de la obra.

Arq. Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación Pública Nacional N° 31/2024 - Construcción Techo y Pista Escenario Vereda Acceso y Rampas para Discapacidad En La Esc. Bás. 112 Gral. Higinio Morínigo -Ad Referéndum - Plurianual – ID N° 455.080

OBRA: Construcción Techo y Pista Escenario Vereda Acceso y Rampas para Discapacidad.

BENEFICIARIO: Escuela Básica N° 112 Gral. Higinio Morinigo

FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob

FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 02/Julio/2025

FECHA DE INFORME DE OBRA: 08/Julio /2025

AVANCE DE OBRA: 83.05%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Encarnación	Encarnación	x1= 611668 - 6976050	712.109.900 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Diego M. Jara Estigarribia	0983 578600	82/2024	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
180 días	09/Diciembre/2024	18/Julio/2025	41 días - Resolución N° 736/2025

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución. Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos.

Se han ejecutado los trabajos de caseta de obrador, encadenado superior, techo de chapa termoacustica, desagüe pluvial, registros con rejilla para desagüe pluvial, revoques en general, mampostería de ladrillos laminados visto de 21 agujeros para sector parque de niños, contrapiso de 10cm y otros.

La obra tiene un avance a la fecha de 83.05%.

Se adjuntan fotografías de la obra.

Hernán Morínigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: Licitación por Menor Cuantía Nacional N° 25/2024 – Terminación de la Unidad de Salud Familiar del Barrio Cuatro Potrero - Distrito de Encarnación - Plurianual ID N° 455.922.-
OBRA: Terminación de la Unidad de Salud Familiar.
BENEFICIARIO: Barrio Cuatro Potrero
FISCAL DE OBRAS: Arq. Felix H. Morinigo Mesrob
FECHA DE VISITA/MEDICIÓN: 01/julio/2025
FECHA DE INFORME: 07/ julio/2025
AVANCE DE OBRA: 70.57%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE LA OBRA
Barrio Cuatro Potrero	Encarnación	x1= 611213 - 6985935	499.984.831 gs
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**	**LOTE / ITEM**
Arq. Silvio A. Brizuela Pedotti	0985 797612	87/2024	L 1
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**PRORROGAS**
210 días	03/Diciembre/2024	01/Julio/2025	

OBSERVACIONES GENERALES:

La obra se encuentra en ejecución. Cuenta con los materiales disponibles en zona de obra. Cuenta con la cantidad necesaria de mano de obra para realizar los trabajos.

Se han ejecutado los trabajos de terminación de zócalos piso de hormigón, pared divisoria de placa, provisión y colocación de marcos para puertas, aberturas de vidrios e instalación eléctrica y otros.

La obra tiene un avance a la fecha de 70.57%. Se adjuntan fotografías de la obra.

GOBERNACIÓN DEPARTAMETNAL DE ITAPÚA
FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Arq. Hernán Morinigo
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación Itapúa
