GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 2

Mes: febrero-2024

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 45/2023 -CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN - BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL CON ID: 437097

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 45/2023 - CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN - BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL CON ID: 437097	100%	184.153.529	28,24%	52.012.277	71,76%	132.141.252	100,00%	184.153.529
A	**Total por Contrato**	**100%**	**184.153.529**	**28,24%**	**52.012.277**	**71,76%**	**132.141.252**	**100,00%**	**184.153.529**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	36.830.706	10.402.455	26.428.251	36.830.706
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**36.830.706**	**10.402.455**	**26.428.251**	**36.830.706**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				105.713.001	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**105.713.001**	

Certificado Básico Nº	**2**
Mes:	**febrero-2024**
Contrato N°:	**80/23**
Monto Básico:	**184.153.529**
Contratista:	**Arq. Fabio López**
Fecha de Inicio:	**18-dic-23**
Plazo de Ejecución:	**90 días**
Fecha de terminación prevista:	**17-mar-24**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.
Póliza de fiel cumplimiento de contrato:	**302 dias**

SON GUARANIES: Ciento cinco millones setecientos trece mil un.-

Arq. Fabio López

Contratista-Representante Legal

Arq. Fabio López

RUC: 4112425-1

Fiscal de Obras

Gobernación de Itapúa

Arq. Diego Armando Saldivar

Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

Secretaria de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni

Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte

Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Secretaría de Obras Públicas y Transporte

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 2

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: feb-2024

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 45/2023 -CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN - BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL CON ID: 437097			
CONTRATISTA:	Arq. Fabio López	FECHA DE INICIO:	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	184.153.529	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	17-mar-24
CONTRATO N°:	80/23	PRÓRROGA:	-
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	-

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 45/2023 -CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN - BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL CON ID: 437097							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA Incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Replanteo y marcación	Metro lineal	400	7.629	3.051.600	0,017	100,00%	0,00%	100,00%	0,017	-	0,017	400,00	0,00	400,00	3.051.600	0	3.051.600
2	Cartel de Obra (200x1.50)	Unidad Medida Global	1	1.000.277	1.000.277	0,005	100,00%	0,00%	100,00%	0,005	-	0,005	1,00	0,00	1,00	1.000.277	0	1.000.277
3	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad Medida Global	1	3.465.300	3.465.300	0,019	100,00%	0,00%	100,00%	0,019	-	0,019	1,00	0,00	1,00	3.465.300	0	3.465.300
4	Construcción de empedrado - "Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (espesor 0,20m).-"	Metros cuadrados	2.800	7.847	21.971.600	0,119	28,57%	71,43%	100,00%	0,034	0,085	0,119	800,00	2.000,00	2.800,00	6.277.600	15.694.000	21.971.600
5	Colocacion de hormigon armado - "CORDON CUNETA de hormigon elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. "	Metro lineal	800	75.950	60.760.000	0,330	37,50%	62,50%	100,00%	0,124	0,206	0,330	300,00	500,00	800,00	22.785.000	37.975.000	60.760.000
6	Colocacion de hormigon armado - CORDÓN ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ	Metros cúbicos	2,56	990.450	2.535.552	0,014	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,014	0,014	0,00	2,56	2,56	0	2.535.552	2.535.552
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesror mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	2.800	30.865	86.422.000	0,469	17,86%	82,14%	100,00%	0,084	0,385	0,469	500,00	2.300,00	2.800,00	15.432.500	70.989.500	86.422.000
8	Limpieza de obra -	Metros cuadrados	3.200	1.546	4.947.200	0,027	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,027	0,027	0,00	3.200,00	3.200,00	0	4.947.200	4.947.200
Total					**184.153.529**	**100%**				28,24%	71,76%	100,00%				52.012.277	132.141.252	184.153.529

Arq. Fabio López
Contratista-Representante Legal

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 2

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: feb-2024

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 45/2023 -CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN - BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL CON ID: 437097			
CONTRATISTA:	Arq. Fabio López	FECHA DE INICIO:	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA GS:	184.153.529	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	17-mar-24
CONTRATO N°:	80/23	PRÓRROGA:	.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	.

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 45/2023 -CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN - BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL CON ID: 437097						PLAZO DE EJECUCIÓN						TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
1	Replanteo y marcación	Metro lineal	400	7.629	3.051.600	3.051.600						1,66%
2	Cartel de Obra (200x1.50)	Unidad Medida Global	1	1.000.277	1.000.277	1.000.277						0,54%
3	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	Unidad Medida Global	1	3.465.300	3.465.300	3.465.300						1,88%
4	Construcción de empedrado - "Colchon de tierra colorada limpia para asiento de piedra (espesor 0,20m).-"	Metros cuadrados	2.800	7.847	21.971.600	2.700.000	3.000.000	12.761.600	3.510.000			11,93%
5	Colocacion de hormigon armado - "CORDON CUNETA de hormigon elaborado (fck= 180 kg/cm2) ancho 60cm y 10cm de espesor. "	Metro lineal	800	75.950	60.760.000	8.500.000	12.600.000	24.310.000	15.350.000			32,99%
6	Colocacion de hormigon armado - CORDÓN ESCONDIDO de Hº. Desarrollo 0.40 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ	Metros cúbicos	2,56	990.450	2.535.552			2.535.552				1,38%
7	Construcción de empedrado - Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesror mínimo 0.15 m).	Metros cuadrados	2.800	30.865	86.422.000	5.120.000	9.460.000	48.597.000	23.245.000			46,93%
8	Limpieza de obra -	Metros cuadrados	3.200	1.546	4.947.200				4.947.200			2,69%
	Total				184.153.529							100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						23.837.177	25.060.000	88.204.152	47.052.200	0	0	184.153.529
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						12,94%	13,61%	47,90%	25,55%	0,00%	0,00%	100%

302 dias

Arq. Fabio López
Contratista-Representante Legal

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 2
CUADRO Y CURVA DE AVANCE
MES: feb-2024

LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA Nº: 45/2023 -CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN - BARRIO PRIMAVERA - DISTRITO DE TRINIDAD - PLURIANUAL CON ID: 437097			
Contrato N°: 80/23			
Monto del Contrato:	184.153.529	**Fecha de terminación prevista:**	17-mar-24
Plazo Contractual:	90 días	**Prórroga:**	.
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	.

CUADRO DE AVANCE								
MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	23.837.177	23.837.177	23.405.525	23.405.525	12,94%	12,94%	12,71%	12,71%
Enero	25.060.000	48.897.177	28.606.752	52.012.277	13,61%	26,55%	15,53%	28,24%
Febrero	88.204.152	137.101.329	132.141.252	184.153.529	47,90%	74,45%	71,76%	100,00%
Marzo	47.052.200	184.153.529			25,55%	100,00%		

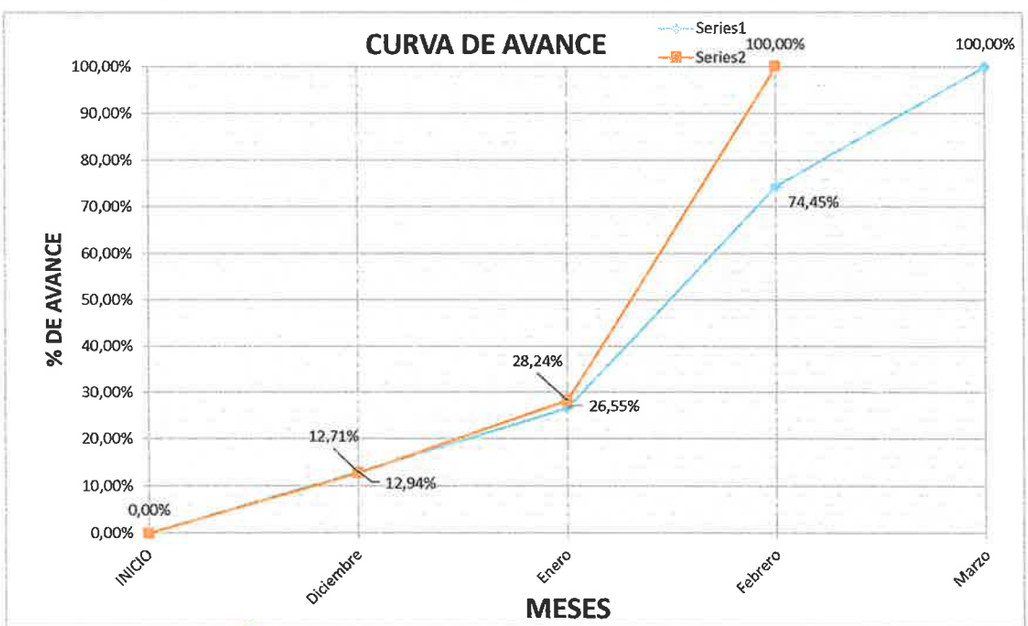

Arq. Fabio López
Contratista-Representante Legal

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

Arq. Fabio López
RUC: 4112425-1

ACTA DE MEDICIÓN N° 2

CERTIFICADO BÁSICO N° 2

CONTRATO N° 80/2023

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN – BARRIO PRIMAVERA – DISTRITO DE TRINIDAD – PLURIANUAL – I.D. N° 437.097.-

CONTRATISTA: Arq. Fabio López Curtido

En el Distrito de Trinidad, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 29 días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Fiscal de Obras, encargado de la verificación y fiscalización de la obra y el Arq. Fabio López Curtido, contratista de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON CORDÓN DE HORMIGÓN – BARRIO PRIMAVERA – DISTRITO DE TRINIDADP".-

Que suscriben la presente acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados en el mes de febrero/2024.

En la verificación realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscriben la presente acta en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicado más arriba.

.....

ARQ. FABIO LÓPEZ

Contratista

Arq. Fabio López

RUC: 4112425-1

.....

Fiscal de Obras

Secretaría de Obras Públicas y Transporte

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

JAVIER PEREIRA GOBERNADOR DE ITAPÚA ITAPÚA

INFORME DE OBRAS

REFERENCIA: CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 45/23

OBRA: "Construcción de Empedrado con Cordón de Hormigón – Barrio Primavera Distrito de Trinidad – Plurianual - ID Nº 437.097

BENEFICIARIO: Barrio Primavera

FISCAL DE OBRAS: Arq. Diego Saldivar

FECHA DE VISITA: 29 de febrero de 2024

AVANCE DE OBRA: 100%

UBICACIÓN	DISTRITO	COORDENADAS UTM	MONTO DE OBRA
Barrio Primavera	Trinidad		184.153.529
CONTRATISTA	**Nº DE TELEFONO**	**Nº DE CONTRATO**	**LOTE/ ITEM**
Fabio López Curtido	0983-440928	80/23	
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACION**	**PRORROGAS**
90 dias	18/12/2023	17/03/2024	----------

OBSERVACIONES GENERALES:

En fecha 29 de febrero de 2024, se realizó la verificación insitu correspondiente de la obra ya mencionada más arriba, haciendo las mediciones de cordón cuneta, pavimento tipo empedrado se constata que se encuentra concluida en su totalidad. 100% la obra.

Observaciones.
Correccion en sectores puntuales de cordones cuneta.
Desmonte de piedras mayor a 20cm y posterior cambio.
Compactación final y limpieza. Para la entrega de obra.

Se anexa imagenes

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P. Nº 8441
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

Arq. Diego Armando Saldívar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

Itapúa lugar de OPORTUNIDADES

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441
