FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
Reconstrucción Nacional c/ Ciencias Veterinaria - San Lorenzo
E-mail: fsingenieriadirectorio@gmail.com
Cel.: (0976) 555 276 - (0981) 258 785

Fernando de la Mora, 27 de febrero de 2025

Señor.
Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

REFERENCIA: Menor Cuantía Nacional N° 30/2024 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y PISO DE H°A° DE POLIDEPORTIVO EN PIRAPO´I DEL DISTRITO DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL - ID N°: 455.974.

De mi mayor consideración.
Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de presentar el Certificado de Obras N° 02 del Contrato N° 41/2024 de la obra de referencia, correspondiente al mes de enero del corriente año.
Para el efecto adjunto a la presente nota todos los documentos con las mediciones y resúmenes correspondientes.
El monto neto del presente certificado es de guaraníes, **28.290.048** (Veintiocho millones doscientos noventa mil cuarenta y ocho).
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077...
FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 3781
Fecha: 05 MAR 2025 Hora: 14:30
Firma: Fojas: 16

GOBERNACION DE ITAPÚA

RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N°: 2
MES: Enero

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y PISO DE HORMIGÓN ARMADO DE POLIDEPORTIVO EN PIRAPO'I, DEL DISTRITO DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL - ID N° 455.974	100%	284,588,120	25.00%	71,147,030	12.43%	35,362,560	37.43%	106,509,590
A	**Total por Contrato**	**100%**	**284,588,120**	**25.00%**	**71,147,030**	**12.43%**	**35,362,560**	**37.43%**	**106,509,590**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y PISO DE HORMIGÓN ARMADO DE POLIDEPORTIVO EN PIRAPO'I, DEL DISTRITO DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL - ID N° 455.974

Certificado Básico Nº	2
Mes:	Enero
Contrato N°:	41/2024
Monto Básico en Gs.:	284,588,120
Contratista:	FS Ingenieria
Fecha de Inicio:	02/12/2024
Plazo de Ejecución:	120 días
Fecha de terminación prevista:	01/04/2025
Prórroga:	0
Fecha de terminación con prórroga:	01/04/2025
Vigencia Póliza de Contrato:	18/11/2025
Vigencia Póliza de Anticipo:	18/11/2025

B	Deducciones a la fecha			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	*20.00%*	56,917,624	14,229,406	7,072,512	21,301,918
B.II	Para Fondo de Reparo	*0.00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**56,917,624**	**14,229,406**	**7,072,512**	**21,301,918**

C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**	28,290,048
C.II	Multas	0
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**	**28,290,048**

SON GUARANÍES: Veintiocho millones doscientos noventa mil cuarenta y ocho.-

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. RUC: 80...
FS Ingenieria
Contratista-Representante Legal

Fiscalización de Obras
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Agustin Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Asesor Tecnico de la Sec. de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 933
Asesor Técnico de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Publicas
Gobernación de Itapúa

(2)

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BÁSICO N° 02

CONTRATO N° 41/2024

REFERENCIA: Menor Cuantía Nacional N° 30/2024 - CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y PISO DE H°A° DE POLIDEPORTIVO EN PIRAPO´I DEL DISTRITO DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL - ID N°: 455.974.

CONTRATISTA: FS Ingeniería y Servicios S.A.

En la Ciudad de Itapúa Poty, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 3 días del mes de febrero del 2025, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Agustín Yd, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, el Sr. Jorge Horacio Franco Riveros, Representante legal de FS Ingeniería y Servicios S.A. y el Ing. Hugo Cano residente de obra de FS Ingeniería y Servicios S.A para la;

- Construcción de graderías y piso de H°A° de polideportivo en Pirapo'i del distrito de Itapúa Poty.

Quienes suscriben el presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante los meses de noviembre/diciembre del presente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. –

FS INGENIERIA Y SERV. S.A.
RUC: 80

FS Ingeniería y Servicios S.A.
Representante Legal

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Hugo Cano

FS Ingeniería y Servicios S.A.
Residente de Obra

GOBERNACION DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N°: 2

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: Enero

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y PISO DE HORMIGÓN ARMADO DE POLIDEPORTIVO EN PIRAPO'I, DEL DISTRITO DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL - ID N° 455.974			
CONTRATISTA:	FS Ingeniería	FECHA DE INICIO:	2/12/2024
MONTO DE LA OFERTA:	284 588.120	FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	1/4/2025
CONTRATO N°:	41/2024	PRÓRROGA:	0
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120 días	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:	1/4/2025

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y PISO DE HORMIGÓN ARMADO DE POLIDEPORTIVO EN PIRAPO'I, DEL DISTRITO DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL - ID N° 455.974							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Item	Descripción del Ítem	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	275,50	3.300	909.150	0,003	100,00%	0,00%	100,00%	0,32%	0,00%	0,32%	275,50	0,00	275,50	909.150	0	909.150
2	Trazado, Replantes y Marcación	Metros cuadrados	275,50	4.000	1.102.000	0,004	100,00%	0,00%	100,00%	0,39%	0,00%	0,39%	275,50	0,00	275,50	1.102.000	0	1.102.000
3	Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) Con impresión adhesiva.	Unidad	1,00	1.200.000	1.200.000	0,004	100,00%	0,00%	100,00%	0,42%	0,00%	0,42%	1,00	0,00	1,00	1.200.000	0	1.200.000
4	Obrador	Unidad	1,00	3.800.000	3.800.000	0,013	100,00%	0,00%	100,00%	1,34%	0,00%	1,34%	1,00	0,00	1,00	3.800.000	0	3.800.000
5	Vallado de Obra, h=1,50	Metro lineal	146,00	45.000	6.570.000	0,023	100,00%	0,00%	100,00%	2,31%	0,00%	2,31%	146,00	0,00	146,00	6.570.000	0	6.570.000
6	Excavación para cimientos de H°A°, Zapatas y Encadenado inferior	Metros cúbicos	38,35	98.000	3.759.280	0,013	96,56%	0,00%	96,66%	1,28%	0,00%	1,28%	37,08	0,00	37,08	3.633.840	0	3.633.840
7	Zapatas de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	7,32	2.600.000	19.032.000	0,067	100,00%	0,00%	100,00%	6,69%	0,00%	6,69%	7,32	0,00	7,32	19.032.000	0	19.032.000
8	Viga inferior de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	4,92	2.900.000	14.268.000	0,050	73,98%	0,00%	73,98%	3,71%	0,00%	3,71%	3,64	0,00	3,64	10.556.000	0	10.556.000
9	Columnas de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	1,41	2.700.000	3.807.000	0,013	100,00%	0,00%	100,00%	1,34%	0,00%	1,34%	1,41	0,00	1,41	3.807.000	0	3.807.000
10	Viga de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	5,06	3.200.000	16.192.000	0,057	62,27%	0,00%	62,27%	3,54%	0,00%	3,54%	3,15	0,00	3,15	10.082.100	0	10.082.100
11	Losa de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	12,09	3.100.000	37.479.000	0,132	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Mamposteria de ladrillo común de 0,20 cm	Metros cuadrados	27,35	120.000	3.282.000	0,012	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
13	Revoque con hidrófugo exterior	Metros cuadrados	66,79	33.000	2.204.070	0,008	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
14	Baranda metalica de 0,90cm de altura de caño galvanizado de 2" sujo a losa de gradería	Metro lineal	8,34	500.000	4.170.000	0,015	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
15	Reja de caños de 30x30mm con postes metálicos incluye pintura al sintético con base antioxido y base de mamposteria revocada y pintada	Metros cuadrados	50,00	400.000	20.000.000	0,070	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	Piso de hormigon e=10cm malla a6 cada 15 cm. Inluye juntas de dilatación 5mts (Sellador elástico y adhesivo multipropósito poliuretánico)	Metros cuadrados	175,00	186.000	32.550.000	0,114	11,79%	88,21%	100,00%	1,35%	10,09%	11,44%	20,63	154,37	175,00	3.837.440	28.712.560	32.550.000
17	Fratachado mecánico y terminación con endurecedor superficial (consumo 3kg/m2)	Metros cuadrados	175,00	38.000	6.650.000	0,023	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	2,34%	2,34%	0,00	175,00	175,00	0	6.650.000	6.650.000
18	Pintura al sintetico con colores a elegir. Incluye la mamposteria revocada.	Metros cuadrados	173,22	40.000	6.928.800	0,024	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	Pintura de piso con pintura epoxi. Incluye rayas	Metros cuadrados	933,63	70.000	65.354.100	0,230	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	Pintura impermeable elástica en graderías color gris asiento y bases.	Metros cuadrados	155,27	42.000	6.521.340	0,023	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	Pintura de reja de caños y barandas. Incluye pintura al sintético con base antióxido	Metros cuadrados	64,42	29.000	1.868.180	0,007	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
22	Arcos metálicos para futsal; ancho 3 mts, altura 2 mts, profundidad 1 mt. Incluye red de arco	Unidad	2,00	2.300.000	4.600.000	0,016	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
23	Caños metálicos para vóley (según diseño - incluye red de vóley)	Unidad	2,00	1.200.000	2.400.000	0,008	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
24	Muro de 30cm armado (1:3) con varillas de 2x8mm	Metros cuadrados	22,50	165.000	3.712.500	0,013	100,00%	0,00%	100,00%	1,30%	0,00%	1,30%	22,50	0,00	22,50	3.712.500	0	3.712.500
25	Relleno de tierra interior y exterior	Metros cúbicos	35,00	83.000	2.905.000	0,010	100,00%	0,00%	100,00%	1,02%	0,00%	1,02%	35,00	0,00	35,00	2.905.000	0	2.905.000
26	Carga de columna con Hormigón - Terminación visto	Metros cúbicos	4,80	2.100.000	10.080.000	0,035	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
27	Limpieza final y remoción de escombros	Metro lineal	1,00	2.143.700	2.143.700	0,008	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	0	0	0
28	Placa de inauguracion	Unidad	1,00	1.100.000	1.100.000	0,004	0,00%	0,00%	0,00%				0,00	0,00	0,00	0	0	0
				TOTAL	284.588.120	1,00				25,08%	12,43%	37,43%				71.147.030	35.362.560	106.509.590

FS INGENIERIA
FS Ingeniería y Servicios S.A.
Contratista-Representante Legal
RUC: 80[illegible]3

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y PISO DE HORMIGÓN ARMADO DE POLIDEPORTIVO EN PIRAPO'I, DEL DISTRITO DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL - ID N° 455.974

CONTRATISTA:	FS Ingeniería
MONTO DE LA OFERTA GS:	284,588,120
CONTRATO N°:	41/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	120 días

FECHA DE INICIO:	02/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	01/04/2025
PRÓRROGA:	0
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:	01/04/2025

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y PISO DE HORMIGÓN ARMADO DE POLIDEPORTIVO EN PIRAPO'I, DEL DISTRITO DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL - ID N° 455.974

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	PLAZO DE EJECUCIÓN MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	TOTAL
1	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	275.50	3,300	909,150	909,150				0.32%
2	Trazado, Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	275.50	4,000	1,102,000	1,102,000				0.39%
3	Cartel de obra (Estructura metálica con chapa nro. 24) Con impresión adhesiva.	Unidad	1.00	1,200,000	1,200,000	1,200,000				0.42%
4	Obrador	Unidad	1.00	3,800,000	3,800,000	3,800,000				1.34%
5	Vallado de Obra, h=1,50	Metro lineal	146.00	45,000	6,570,000	6,570,000				2.31%
6	Excavación para cimientos de H°A°. Zapatas y Encadenado inferior	Metros cúbicos	38.36	98,000	3,759,280	3,759,280				1.32%
7	Zapatas de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	7.32	2,600,000	19,032,000	7,612,800	11,419,200			6.69%
8	Viga inferior de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	4.92	2,900,000	14,268,000	5,707,200	8,560,800			5.01%
9	Columnas de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	1.41	2,700,000	3,807,000		3,807,000			1.34%
10	Viga de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	5.06	3,200,000	16,192,000		4,857,600	11,334,400		5.69%
11	Losa de H°A°, según plano estructural adjunto, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	12.09	3,100,000	37,479,000		11,243,700	26,235,300		13.17%
12	Mamposteria de ladrillo común de 0,20 cm	Metros cuadrados	27.35	120,000	3,282,000			3,282,000		1.15%
13	Revoque con hidrófugo exterior	Metros cuadrados	66.79	33,000	2,204,070			2,204,070		0.77%
14	Baranda metalica de 0,90cm de altura de caño galvanizado de 2" sujo a losa de gradería	Metro lineal	8.34	500,000	4,170,000				4,170,000	1.47%
15	Reja de caños de 30x30mm con postes metálicos incluye pintura al sintético con base antioxido y base de mampostería revocada y pintada	Metros cuadrados	50.00	400,000	20,000,000			14,000,000	6,000,000	7.03%
16	Piso de hormigon e=10cm malla ø6 cada 15 cm. Inluye juntas de dilatación 5mts (Sellador elástico y adhesivo multipropósito poliuretánico)	Metros cuadrados	175.00	186,000	32,550,000		13,020,000	19,530,000		11.44%

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: 80077455-8

Fiscalización de Obras

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

17	Fratachado mecánico y terminación con endurecedor superficial (consumo 3kg/m2)	Metros cuadrados	175.00	38,000	6,650,000			6,650,000		2.34%
18	Pintura al sintético con colores a elegir. Incluye la mamposteria revocada.	Metros cuadrados	173.22	40,000	6,928,800				6,928,800	2.43%
19	Pintura de piso con pintura epoxi. Incluye rayas	Metros cuadrados	933.63	70,000	65,354,100				65,354,100	22.96%
20	Pintura impermeable elástica en graderías color gris asiento y bases.	Metros cuadrados	155.27	42,000	6,521,340				6,521,340	2.29%
21	Pintura de reja de caños y barandas. Incluye pintura al sintético con base antióxido	Metros cuadrados	64.42	29,000	1,868,180				1,868,180	0.66%
22	Arcos metálicos para futsal; ancho 3 mts, altura 2 mts, profundidad 1 mt. Incluye red de arco	Unidad	2.00	2,300,000	4,600,000				4,600,000	1.62%
23	Caños metálicos para vóley (según diseño - incluye red de vóley)	Unidad	2.00	1,200,000	2,400,000				2,400,000	0.84%
24	Muro de 30cm armado (1:3) con varillas de 2xø8mm	Metros cuadrados	22.50	165,000	3,712,500		3,712,500			1.30%
25	Relleno de tierra interior y exterior	Metros cúbicos	35.00	83,000	2,905,000		2,905,000			1.02%
26	Carga de columna con Hormigón - Terminación visto	Metros cúbicos	4.80	2,100,000	10,080,000			10,080,000		3.54%
27	Limpieza final y remoción de escombros	Metro lineal	1.00	2,143,700	2,143,700				2,143,700	0.75%
28	Placa de inauguracion	Unidad	1.00	1,100,000	1,100,000				1,100,000	0.39%

TOTAL	284,588,120				TOTAL	100.00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANÍES		30,660,430	59,525,800	93,315,770	101,086,120	284,588,120
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE		10.77%	20.92%	32.79%	35.52%	100%
ACUMULADO PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE		10.77%	31.69%	64.48%	100.00%	

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
RUC: FS Ingeniería
Contratista-Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: Enero

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y PISO DE HORMIGÓN ARMADO DE POLIDEPORTIVO EN PIRAPO'I, DEL DISTRITO DE ITAPÚA POTY - PLURIANUAL - ID N° 455.974

Contrato N°: 41/2024			
Monto del Contrato:	284.588.120	**Fecha de terminación prevista:**	1/4/2025
Plazo Contractual:	120 días	**Prórroga:**	0
Inicio de Obra:	2/12/2024	**Fecha de terminación con prórroga:**	1/4/2025

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MES 1	30.660.430	30.660.430	71.147.030 ₲	71.147.030 ₲	10,77%	10,77%	25,00%	25,00%
MES 2	59.525.800	90.186.230	35.362.560 ₲	106.509.590 ₲	20,92%	31,69%	12,43%	37,43%
MES 3	93.315.770	183.502.000			32,79%	64,48%		
MES 4	101.086.120	284.588.120			35,52%	100,00%		

CURVA DE AVANCE

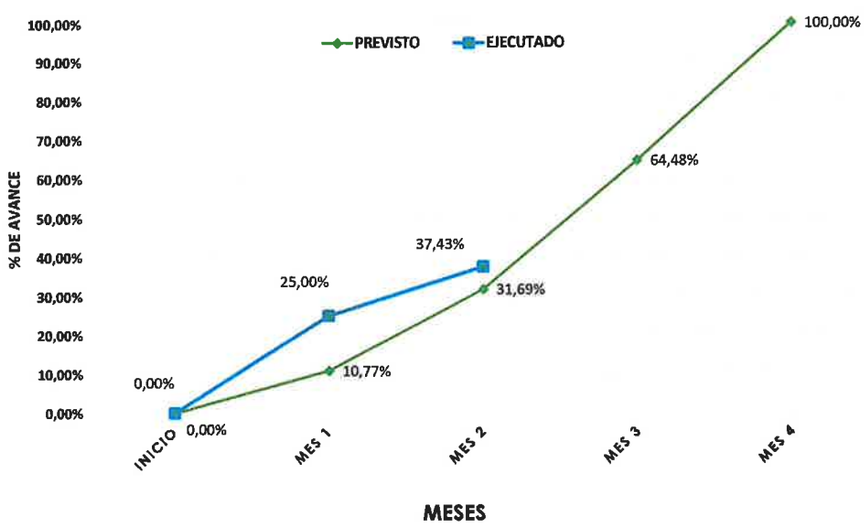

FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
R.U.C. 80017[illegible]3

FS Ingeniería
Contratista-Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME N°2 - CERTIFICADO N°2 - ENERO

MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº: 30/2024 "Construcción de Graderías y Piso de H°A° de Polideportivo en Pirapo'i del Distrito de Itapúa Poty" ID N° 455.974

OBRA: Construcción de Graderías y Piso de H°A° de Polideportivo
BENEFICIARIO: Pirapo'i del Distrito de Itapúa Poty
FISCAL DE OBRAS: Ing. Agustin Yd
AVANCE DE OBRA: 37,43%
FECHA DE VISITA: 03/02/2025
FECHA DE INFORME: 05/02/2025

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Pirapo'i 1° Linea	Itapúa Poty	284.588.120 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
FS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.	0983 578 600	41/2024
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**
120 días	02 – diciembre - 2024	01 – abril - 2025

OBSERVACIONES GENERALES:

Según las observaciones realizadas el día 03/02 la obra se encuentra en proceso de ejecución, con un avance del 37,43%.

Se observó la realización de los rubros contractuales correspondientes al piso de hormigón armado en conjunto con el fratachado mecánico, también la elaboración de las vigas de hormigón armado correspondientes a las graderías.

Se adjuntan evidencias fotográficas de los trabajos realizados:

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa
