GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 6

Mes: Mayo

MCN – Menor Cuantía Nacional - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL ID N° 455889

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados								
				Hasta Certificado Anterior			Certificado Presente			Total Certificado a la Fecha		
		%	(1)	% Avance de Obra	% según Contrato	(2)	% Avance de Obra	% Avance de Obra según Contrato	(3)	% Avance de Obra	% según Contrato	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario											
A.I	MCN – Menor Cuantía Nacional - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA PLURIANUAL ID N° 455889	100%	314.764.324	61,54%	71,63%	193.703.729	38,46%	28,37%	121.060.595	100,00%	100,00%	314.764.324
A	Total por Contrato	100%	314.764.324	61,54%	71,63%	193.703.729	38,46%	28,37%	121.060.595	100,00%	100,00%	314.764.324

B	Deducciones a la fecha			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	20,00%	62.952.865	38.740.745	24.212.120	62.952.865
B.II	Para Fondo de Reparo	0,00%	0	0	-	0
B	Total Deducciones		62.952.865	38.740.745	24.212.120	62.952.865
C.I	Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				96.848.475	
C.II	Multas				0	
C	Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				96.848.475	

Certificado Básico Nº	6
Mes:	Mayo
Contrato N°:	77/24
Monto Básico:	314.764.324
Contratista	HM Construcciones - Hector Omar Mereles
Fecha de Inicio:	2-dic-24
Plazo de Ejecución:	150 dias
Fecha de Terminación contractual:	1-may-25
Prorroga	30 dias
Fecha de Terminación:	31-may-25

SON GUARANIES: Noventa y Seis Millones, Ochocientos Cuarenta y Ocho Mil, Cuatrocientos Setenta y Cinco.

Secretario de Obras Públicas y Transportes
Gobernación de Itapúa
Ing. Cesar Echeverría
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transportes

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
Ing. Andrés Díaz
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Hector Omar Mereles
HM Construcciones
Contratista

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-6
Edelira - Itapúa

CERTIFICADO BASICO DE OBRAS N° 5

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MCN – Menor Cuantía Nacional - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL ID N° 455889

CONTRATISTA: HM Construcciones - Hector Mereles

MONTO DE LA OFERTA: 314.764.324 Gs

FECHA:	1/5/2025
CONTRATO N°:	77/24
PLAZO:	150 días

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN N° 5						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 5					
MCN – Menor Cuantía Nacional - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL ID N° 455889				HM Construcciones			EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL
1	Limpieza y preparación de la obra - SECTOR GENERAL	Metros cuadrados	132,4	2.562	339.209	0,11%	100%	0%	100%	0,11%	0,00%	0,11%	132,40		132,40	339 209	0	339 209
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	132,4	3.416	452.278	0,14%	100%	0%	100%	0,14%	0,00%	0,14%	132,40		132,40	452 278	0	452 278
3	Placa de inauguración	Unidad	1	1.066.027	1.066.027	0,34%	0%	100%	100%	0,00%	0,34%	0,34%	0,00	1,00	1,00	0	1 066 027	1 066 027
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 con impresión adhesiva de alta resistencia	Unidad Medida Global	1	1.074.953	1.074.953	0,34%	100%	0%	100%	0,34%	0,00%	0,34%	1,00		1,00	1 074 953	0	1 074 953
5	Obrador (Depósito) de 3,00x5,00 m.	Unidad Medida Global	1	2.103.539	2.103.539	0,67%	100%	0%	100%	0,67%	0,00%	0,67%	1,00		1,00	2 103 539	0	2 103 539
6	Vallado de obra, h= 1,50 (22*11)	Metros cuadrados	99	53.144	5.261.256	1,67%	100%	0%	100%	1,67%	0,00%	1,67%	99,00		99,00	5 261 256	0	5 261 256
7	Excavación de suelo	Metros cúbicos	14,6	75.242	1.098.533	0,35%	100%	0%	100%	0,35%	0,00%	0,35%	14,60		14,60	1 098 533	0	1 098 533
8	Base de PBC	Metros cúbicos	10,3	415.369	4.278.301	1,36%	100%	0%	100%	1,36%	0,00%	1,36%	10,30		10,30	4 278 301	0	4 278 301
9	Zapata de H° A°	Metros cúbicos	3,37	2.035.282	6.858.900	2,18%	100%	0%	100%	2,18%	0,00%	2,18%	3,37		3,37	6 858 900	0	6 858 900
10	Columna de 0,20 x 0,20 de H° A°	Metros cúbicos	2,91	2.035.282	5.922.671	1,88%	100%	0%	100%	1,88%	0,00%	1,88%	2,91		2,91	5 922 671	0	5 922 671
11	Encadenado Inferior 0,15 x 0,25 de H° A°	Metros cúbicos	3,44	2.035.282	7.001.370	2,22%	100%	0%	100%	2,22%	0,00%	2,22%	3,44		3,44	7 001 370	0	7 001 370
12	Encadenado Superiror 0,15 x 0,30 de H° A°	Metros cúbicos	3,44	2.035.282	7.001.370	2,22%	100%	0%	100%	2,22%	0,00%	2,22%	3,44		3,44	7 001 370	0	7 001 370
13	Nivelación De 0.30 m ladrillo común	Metros cuadrados	13,75	181.579	2.496.711	0,79%	100%	0%	100%	0,79%	0,00%	0,79%	13,75		13,75	2 496 711	0	2 496 711
14	Relleno y apisonamiento de interiores	Metros cúbicos	35	109.548	3.834.180	1,22%	100%	0%	100%	1,22%	0,00%	1,22%	35,00		35,00	3 834 180	0	3 834 180
15	Aislación asfáltica de paredes en U	Metro lineal	90	23.029	2.072.610	0,66%	100%	0%	100%	0,66%	0,00%	0,66%	90,00		90,00	2 072 610	0	2 072 610
16	Mampostería de 0.15 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	272,36	107.963	29.404.803	9,34%	100%	0%	100%	9,34%	0,00%	9,34%	272,36		272,36	29 404 803	0	29 404 803
17	Envarillado sobre abertura 2 del 8 por hilada (2hilada)	Metro lineal	26	28.341	736.866	0,23%	100%	0%	100%	0,23%	0,00%	0,23%	26,00		26,00	736 866	0	736 866
18	Azotada Hidrófuga interior, exterior, sanitario 2,10m	Metros cuadrados	262,3	25.378	6.656.649	2,11%	91%	9%	100%	1,94%	0,18%	2,11%	240,00	22,30	262,30	6 090 720	565 929	6 656 649
19	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo	Metros cuadrados	524,3	34.941	18.319.566	5,82%	88%	12%	100%	5,11%	0,71%	5,82%	460,00	64,30	524,30	16 072 860	2 246 706	18 319 566
20	Prov y coloc de techo chapa termo acúst de 4 cm prepint CABREADA pefril "U" de 100 c/zig zag ángulo 1" x 1/8 a 45° y 90° clavaderos caño estruct 40x60 y pared de 1,20 c/ 1,00m Incl provy colocación cumbrera y bordes laterales chap dobl N° 26	Metros cuadrados	161,3	323.603	52.197.164	16,58%	93%	7%	100%	15,42%	1,16%	16,58%	150,00	11,30	161,30	48 540 450	3 656 714	52 197 164
21	Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 40 cm	Metro lineal	30,5	99.745	3.042.223	0,97%	0%	100%	100%	0,00%	0,97%	0,97%	0,00	30,50	30,50	0	3 042 223	3 042 223
22	Badeta de chapa doblada N° 26	Metro lineal	9,45	102.603	969.598	0,31%	0%	100%	100%	0,00%	0,31%	0,31%	0,00	9,45	9,45	0	969 598	969 598
23	Registro 40x40,con rejilla metálica	Unidad	6	311.631	1.869.786	0,59%	0%	100%	100%	0,00%	0,59%	0,59%	0,00	6,00	6,00	0	1 869 786	1 869 786
24	Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común-hasta la calle	Metro lineal	25	71.774	1.794.350	0,57%	0%	100%	100%	0,00%	0,57%	0,57%	0,00	25,00	25,00	0	1 794 350	1 794 350
25	Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5	Metros cuadrados	121,85	31.656	3.857.284	1,23%	92%	8%	100%	1,13%	0,10%	1,23%	112,00	9,85000	121,85	3 545 472	311 812	3 857 284
26	Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido	Metros cuadrados	121,85	118.379	14.424.481	4,58%	0%	100%	100%	0,00%	4,58%	4,58%	0,00	121,85	121,85	0	14 424 481	14 424 481
27	Zócalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido	Metro lineal	68,05	40.226	2.737.379	0,87%	0%	100%	100%	0,00%	0,87%	0,87%	0,00	68,05	68,05	0	2 737 379	2 737 379

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-9
Edelira - Itapúa

Fiscalización de Obras

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación

28	Revestimiento en sanitario	Metros cuadrados	48,2	84.252	4.060.946	1,29%	41%	59%	100%	0,54%	0,75%	1,29%	20,00	28,20	48,20	1 685 040	2 375 906	4 060 946
29	Puerta placa vaivén de 1,30 x 2,10 m	Unidad	1	1.097.498	1.097.498	0,35%	50%	50%	100%	0,17%	0,17%	0,35%	0,50	0,50	1,00	548 749	548 749	1 097 498
30	Puerta placa de 0,90 x 2,10 m	Unidad	3	734.621	2 203 863	0,70%	100%	0%	100%	0,70%	0,00%	0,70%	3,00		3,00	2 203 863	0	2 203 863
31	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m	Unidad	3	627.308	1.881.924	0,60%	100%	0%	100%	0,60%	0,00%	0,60%	3,00		3,00	1 881 924	0	1 881 924
32	Vidrio de 8mm para aberturas	Metros cuadrados	40,15	655.413	26 314 832	8,36%	62%	38%	100%	5,21%	3,15%	8,36%	25,00	15,15	40,15	16 385 325	9 929 507	26 314 832
33	Vidrio de 5mm para recepción de 1 m de altura	Metros cuadrados	4,05	506.621	2 051 815	0,65%	0%	100%	100%	0,00%	0,65%	0,65%	0,00	4,05	4,05	0	2 051 815	2 051 815
34	Pintura de paredes al látex interior con enduido	Metros cuadrados	174	26.094	4 540 356	1,44%	0%	100%	100%	0,00%	1,44%	1,44%	0,00	174,00	174,00	0	4 540 356	4 540 356
35	Pintura de paredes al látex exterior con enduido	Metros cuadrados	151,5	28.147	4 264 271	1,35%	26%	74%	100%	0,36%	1,00%	1,35%	40,00	111,50	151,50	1 125 880	3 138 391	4 264 271
36	Pintura epoxi de paredes interior y exterior hasta H: 1,50m	Metros cuadrados	116	28.147	3 265 052	1,04%	0%	100%	100%	0,00%	1,04%	1,04%	0,00	116,00	116,00	0	3 265 052	3 265 052
37	Pintura de zócalo de nivelación al sintético	Metros cuadrados	12,3	20.566	252 962	0,08%	0%	100%	100%	0,00%	0,08%	0,08%	0,00	12,30	12,30	0	252 962	252 962
38	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	26,9	26.558	714 410	0,23%	0%	100%	100%	0,00%	0,23%	0,23%	0,00	26,90	26,90	0	714 410	714 410
39	Provisión e instalación de cable preensamblado 4x25mm2 (Incluye conector dentado 35/95MM, morza de suspensión)	Metro lineal	10	72.164	721 640	0,23%	0%	100%	100%	0,00%	0,23%	0,23%	0,00	10,00	10,00	0	721 640	721 640
40	Provisión e instalación de tablero metalico embutio de 24 modulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano)	Unidad	1	1.692.116	1 692 116	0,54%	50%	50%	100%	0,27%	0,27%	0,54%	0,50	0,50	1,00	846 058	846 058	1 692 116
41	Provisión e instalación de cable multifilas NYY de 4x10 mm2 hasta el tablero Seccional 1 (Incluye electroducto y otros)	Metro lineal	10	118.420	1 184 200	0,38%	0%	100%	100%	0,00%	0,38%	0,38%	0,00	10,00	10,00	0	1 184 200	1 184 200
42	Provisión de registro de manposteria 40x40x50cm (Incluye tapa de HºAº)	Unidad	2	271.393	542 786	0,17%	0%	100%	100%	0,00%	0,17%	0,17%	0,00	2,00	2,00	0	542 786	542 786
43	Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano, schucco y Puntos de iluminación (Incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	Unidad	8	118.441	947 528	0,30%	50%	50%	100%	0,15%	0,15%	0,30%	4,00	4,00	8,00	473 764	473 764	947 528
44	Provisión e instalación de toma corriente especial (Incluye cableado multifilar, placa y modulos tomas especial)	Unidad	26	151.591	3 941 366	1,25%	38%	62%	100%	0,48%	0,77%	1,25%	10,00	16,00	26,00	1 515 910	2 425 456	3 941 366
45	Prov e instal de circ eléct p/AA incluye picado de pared ducteado con caño corrugado antillama revoc y cablea con term de caja conex c/tapa ciega blanco tamb incl caño pvc pasante p/desague del Aire y interruptor bipolar	Unidad	3	444.503	1 333 509	0,42%	67%	33%	100%	0,28%	0,14%	0,42%	2,00	1,00	3,00	889 006	444 503	1 333 509
46	Provisión e instalación de equipo colgante de policarbonato 30CM diámetro translucido e27 con lampara led 40W 6500k (Incluye ducto antillamas, cableado multifilar)	Unidad	20	571.837	11 436 740	3,63%	0%	100%	100%	0,00%	3,63%	3,63%	0,00	20,00	20,00	0	11 436 740	11 436 740
47	Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x16w 6500k (Encendido por fotocelula)	Unidad	6	153.108	918 648	0,29%	0%	100%	100%	0,00%	0,29%	0,29%	0,00	6,00	6,00	0	918 648	918 648
48	Provisión e instalación circuito para ducha electrica (Incluye Ducha electrica)	Unidad	2	620.772	1 241 544	0,39%	0%	100%	100%	0,00%	0,39%	0,39%	0,00	2,00	2,00	0	1 241 544	1 241 544
49	Provisión e instalación equipo AP completo con lampara 150w led brazo 1m (Incluye. encendido con fotocelula, alimentación con cable multifilar NYY, caño electroducto, registro)	Unidad	1	1.257.128	1.257.128	0,40%	0%	100%	100%	0,00%	0,40%	0,40%	0,00	1,00	1,00	0	1 257 128	1 257 128
50	Provisión e instalación de aire acondicionado de 12000 btu	Unidad	3	2.708.227	8.124.681	2,58%	0%	100%	100%	0,00%	2,58%	2,58%	0,00	3,00	3,00	0	8 124 681	8 124 681
51	Instalación de circuito cerrado y señal debil. (Incluye ductos embutidos, cajas de conexión y otros)	Unidad	1	442.756	442 756	0,14%	0%	100%	100%	0,00%	0,14%	0,14%	0,00	1,00	1,00	0	442 756	442 756
52	Alimentacion de agua Corriente desde la red, caño de 3/4	Metro lineal	15	22.822	342 330	0,11%	100%	0%	100%	0,11%	0,00%	0,11%	15,00		15,00	342 330	0	342 330
53	Instalación de Agua Corriente para piletas lavamano empotrados en granito	Unidad	2	273.870	547 740	0,17%	100%	0%	100%	0,17%	0,00%	0,17%	2,00		2,00	547 740	0	547 740
54	Instalación de Agua Corriente para sanitarios	Unidad	3	684.675	2.054.025	0,65%	100%	0%	100%	0,65%	0,00%	0,65%	3,00		3,00	2 054 025	0	2 054 025
55	Desagüe de lavamanos	Unidad	2	273.870	547.740	0,17%	100%	0%	100%	0,17%	0,00%	0,17%	2,00		2,00	547 740	0	547 740
56	Instalación de Desagüe Cloca1 de sanitario hasta el 1er registro	Unidad	3	1.186.770	3 560 310	1,13%	100%	0%	100%	1,13%	0,00%	1,13%	3,00		3,00	3 560 310	0	3 560 310
57	Cámara de Inspección	Unidad	5	443.011	2.215.055	0,70%	20%	80%	100%	0,14%	0,56%	0,70%	1,00	4,00	5,00	443 011	1 772 044	2 215 055
58	Cámara Séptica	Unidad	1	2.177.806	2.177.806	0,69%	0%	100%	100%	0,00%	0,69%	0,69%	0,00	1,00	1,00	0	2 177 806	2 177 806
59	Pozo Absorvente	Unidad	1	3.151.906	3.151.906	1,00%	0%	100%	100%	0,00%	1,00%	1,00%	0,00	1,00	1,00	0	3 151 906	3 151 906
60	Ducha eléctrica, incluye bujes flexibles	Unidad	2	200.838	401.676	0,13%	0%	100%	100%	0,00%	0,13%	0,13%	0,00	2,00	2,00	0	401 676	401 676
61	Inodoro sisterna baja	Unidad	3	1.278.060	3 834 180	1,22%	0%	100%	100%	0,00%	1,22%	1,22%	0,00	3,00	3,00	0	3 834 180	3 834 180
62	Lavamanos con granito	Unidad	4	593.385	2.373.540	0,75%	0%	100%	100%	0,00%	0,75%	0,75%	0,00	4,00	4,00	0	2 373 540	2 373 540
63	Canilla de patio cromada pico manguera(griferia de bronce de 1/2 conexión y llave de paso 1/2	Unidad	1	228.225	228 225	0,07%	0%	100%	100%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00	1,00	1,00	0	228 225	228 225
64	Jabonera de porcelana	Unidad	7	73.032	511 224	0,16%	0%	100%	100%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00	7,00	7,00	0	511 224	511 224

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-9
Edelira - Itapúa

Fiscalización de Obras

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

65	Papelera de porcelana	Unidad	3	73.032	219.096	0,07%	0%	100%	100%	0,00%	0,07%	0,07%	0,00	3,00	3,00	0	219.096	219.096
66	Toallero, percha de porcelana	Unidad	7	73.032	511.224	0,16%	0%	100%	100%	0,00%	0,16%	0,16%	0,00	7,00	7,00	0	511.224	511.224
67	Caja cifonada 15x15	Unidad	5	82.161	410.805	0,13%	0%	100%	100%	0,00%	0,13%	0,13%	0,00	5,00	5,00	0	410.805	410.805
68	Mesada de granito (rececclon)	Metros cuadrados	2,05	1.232.415	2.526.451	0,80%	0%	100%	100%	0,00%	0,80%	0,80%	0,00	2,05	2,05	0	2.526.451	2.526.451
69	Guarda obra y caminero, alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	43,76828	85.392	3.737.461	1,19%	91%	9%	100%	1,09%	0,10%	1,19%	40,00	3,77	43,76828	3.415.680	321.781	3.737.461
70	Rampa de acceso peatonal de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	12,3	85.392	1.050.322	0,33%	100%	0%	100%	0,33%	0,00%	0,33%	12,30		12,30	1.050.322	0	1.050.322
71	Letras corpóreas de 40 cm de altura	Unidad	19	661.852	12.575.188	4,00%	0%	100%	100%	0,00%	4,00%	4,00%	0,00	19,00	19,00	0	12.575.188	12.575.188
72	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	132,4	3.651	483.392	0,15%	0%	100%	100%	0,00%	0,15%	0,15%	0,00	132,40	132,40	0	483.392	483.392
Total					314.764.324	100%				61,54%	38,46%	100,00%				193.703.729	121.060.595	314.764.324

Ing. Andrés Díaz
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Gobernación de Itapúa
Fiscalización de Obras

Héctor Omar Mereles
HM Construcciones
Contratista

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-9
Encarnación - Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 6
CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

MCN – Menor Cuantía Nacional - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL ID N° 455889

CONTRATISTA: HM Construcciones - Hector Mereles	
MONTO DE LA OFERTA: 314.764.324 Gs.	

FECHA DE INICIO:	2/12/2024
CONTRATO N°:	77/24
PLAZO:	150 días

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

MCN – Menor Cuantía Nacional - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL ID N° 455889				HM Construcciones - Hector Mereles		PLAZO DE EJECUCIÓN						TOTAL
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	
1	Limpieza y preparación de la obra - SECTOR GENERAL	Metros cuadrados	132,400	2.562	339.209	339.209						0,11%
2	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	132,400	3.416	452.278	452.278						0,14%
3	Placa de inauguración	Unidad	1,000	1.066.027	1.066.027						1.066.027	0,34%
4	Cartel de obra (estructura metálica y chapa N° 24) 2,00 x 1,50 con impresión adhesiva de alta resistencia	Unidad Medida Global	1,000	1.074.953	1.074.953	1.074.953						0,34%
5	Obrador (Depósito) de 3,00x5,00 m.	Unidad Medida Global	1,000	2.103.539	2.103.539	2.103.539						0,67%
6	Vallado de obra, h= 1,50 (22*11)	Metros cuadrados	99,000	53.144	5.261.256	5.261.256						1,67%
7	Excavación de suelo	Metros cúbicos	14,600	75.242	1.098.533	1.098.533						0,35%
8	Base de PBC	Metros cúbicos	10,300	415.369	4.278.301	4.278.301						1,36%
9	Zapata de H° A°	Metros cúbicos	3,370	2.035.282	6.858.900	6.858.900						2,18%
10	Columna de 0,20 x 0,20 de H° A°	Metros cúbicos	2,910	2.035.282	5.922.671	5.922.671						1,88%
11	Encadenado Inferior 0,15 x 0,25 de H° A°	Metros cúbicos	3,440	2.035.282	7.001.370	7.001.370						2,22%
12	Encadenado Superiror 0,15 x 0,30 de H° A°	Metros cúbicos	3,440	2.035.282	7.001.370	7.001.370						2,22%
13	Nivelación De 0.30 m ladrillo común	Metros cuadrados	13,750	181.579	2.496.711	2.496.711						0,79%
14	Relleno y apisonamiento de interiores	Metros cúbicos	35,000	109.548	3.834.180	3.834.180						1,22%
15	Aislación asfáltica de paredes en U	Metro lineal	90,000	23.029	2.072.610	2.072.610						0,66%
16	Mampostería de 0.15 ladrillo común para revocar	Metros cuadrados	272,360	107.963	29.404.803	20.583.362	8.821.441					9,34%
17	Envarillado sobre abertura 2 del 8 por hilada (2hilada)	Metro lineal	26,000	28.341	736.866	736.866						0,23%
18	Azotada Hidrófuga interior, exterior, sanitario 2,10m	Metros cuadrados	262,300	25.378	6.656.649		6.656.649					2,11%
19	Revoque de paredes interior y exterior a 2 capa con hidrofugo	Metros cuadrados	524,300	34.941	18.319.566		7.327.827	10.991.740				5,82%
20	Prov y coloc de techo chapa termo acúst de 4 cm prepint CABREADA pefril "U" de 100 c/zig zag ángulo 1" x 1/8 a 45° y 90° clavaderos caño estruct 40x60 y pared de 1,20 c/ 1,00m Incl provy colocación cumbrera y bordes laterales chap dobl Nº 26	Metros cuadrados	161,300	323.603	52.197.164					26.098.582	26.098.582	16,58%

Fiscalización de Obras

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-6
Edelira - Itapúa

21	Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 40 cm	Metro lineal	30,500	99.745	3.042.223						3.042.223	0,97%
22	Badeta de chapa doblada N° 26	Metro lineal	9,450	102.603	969.598						969.598	0,31%
23	Registro 40x40,con rejilla metálica	Unidad	6,000	311.631	1.869.786				1.869.786			0,59%
24	Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle	Metro lineal	25,000	71.774	1.794.350		1.794.350					0,57%
25	Contrapiso de Hormigón 7cm 1:5:5	Metros cuadrados	121,850	31.656	3.857.284		1.542.913	2.314.370				1,23%
26	Piso mosaico granito bese gris de 30 x 30 cms, con pulido	Metros cuadrados	121,850	118.379	14.424.481			7.212.241	7.212.241			4,58%
27	Zócalo mosaico granito bese gris de 10 x 30 cms, con pulido	Metro lineal	68,050	40.226	2.737.379				2.737.379			0,87%
28	Revestimiento en sanitario	Metros cuadrados	48,200	84.252	4.060.946				4.060.946			1,29%
29	Puerta placa vaivén de 1,30 x 2,10 m	Unidad	1,000	1.097.498	1.097.498					1.097.498		0,35%
30	Puerta placa de 0,90 x 2,10 m	Unidad	3,000	734.621	2.203.863					2.203.863		0,70%
31	Puerta placa de 0,80 x 2,10 m	Unidad	3,000	627.308	1.881.924					1.881.924		0,60%
32	Vidrio de 8mm para aberturas	Metros cuadrados	40,150	655.413	26.314.832					26.314.832		8,36%
33	Vidrio de 5mm para recepción de 1 m de altura	Metros cuadrados	4,050	506.621	2.051.815					2.051.815		0,65%
34	Pintura de paredes al látex interior con enduido	Metros cuadrados	186,700	26.094	4.871.750						4.871.750	1,55%
35	Pintura de paredes al látex exterior con enduido	Metros cuadrados	95,450	28.147	2.686.631						2.686.631	0,85%
36	Pintura epoxi de paredes interior y exterior hasta H: 1,50m	Metros cuadrados	148,500	28.147	4.179.830						4.179.830	1,33%
37	Pintura de zócalo de nivelación al sintético	Metros cuadrados	12,300	20.566	252.962						252.962	0,08%
38	Pintura de aberturas al barniz	Metros cuadrados	26,900	26.558	714.410						714.410	0,23%
39	Provisión e instalación de cable preensamblado 4x25mm2 (Incluye conector dentado 35/95MM, morza de suspensión)	Metro lineal	10,000	72.164	721.640					721.640		0,23%
40	Provisión e instalación de tablero metalico embutio de 24 modulo con barras RST + N+T (Incluye disyuntores térmicos, diferenciales, jabalina de 2,40m; ver plano)	Unidad	1,000	1.692.116	1.692.116					1.692.116		0,54%
41	Provisión e instalación de cable multifilas NYY de 4x10 mm2 hasta el tablero Seccional 1 (Incluye electroducto y otros)	Metro lineal	10,000	118.420	1.184.200					1.184.200		0,38%
42	Provisión de registro de manposteria 40x40x50cm (Incluye tapa de HºAº)	Unidad	2,000	271.393	542.786					542.786		0,17%
43	Provisión e instalación de circuitos (bocas) de tomas corriente tipo euroamericano, schucco y Puntos de iluminación (incluye picado y amurado de caños corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o celeste)	Unidad	8,000	118.441	947.528					947.528		0,30%
44	Provisión e instalación de toma corriente especial (Incluye cableado multifilar, placa y modulos tomas especial)	Unidad	26,000	151.591	3.941.366					3.941.366		1,25%
45	Prov e instal de circ eléct p/AA incluye picado de pared ducteado con caño corrugado antillama revoc y cablea con term de caja conex c/tapa ciega blanco tamb incl caño pvc pasante p/desague del Aire y interruptor bipolar	Unidad	3,000	444.503	1.333.509					1.333.509		0,42%
46	Provisión e instalación de equipo colgante de policarbonato 30CM diámetro translucido e27 con lampara led 40W 6500k (Incluye ducto antillamas, cableado multifilar)	Unidad	20,000	571.837	11.436.740						11.436.740	3,63%

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-6
Edelira - Itapúa

47	Provisión e instalación equipo acanalado con tubos led 1x16w 6500k (Encendido por fotocelula)	Unidad	6,000	153.108	918.648						918.648	0,29%
48	Provisión e instalación circuito para ducha electrica (Incluye Ducha electrica)	Unidad	2,000	620.772	1.241.544					1.241.544		0,39%
49	Provisión e instalación equipo AP completo con lampara 150w led brazo 1m (Incluye, encendido con fotocelula, alimentación con cable multifilar NYY, caño electroducto, registro)	Unidad	1,000	1.257.128	1.257.128						1.257.128	0,40%
50	Provisión e instalación de aire acondicionado de 12000 btu	Unidad	3,000	2.708.227	8.124.681						8.124.681	2,58%
51	Instalación de circuito cerrado y señal debil. (Incluye ductos embutidos, cajas de conexión y otros)	Unidad	1,000	442.756	442.756					442.756		0,14%
52	Alimentacion de agua Corriente desde la red, caño de 3/4	Metro lineal	15,000	22.822	342.330					342.330		0,11%
53	Instalación de Agua Corriente para piletas lavamano empotrados en granito	Unidad	2,000	273.870	547.740					547.740		0,17%
54	Instalación de Agua Corriente para sanitarios	Unidad	3,000	684.675	2.054.025					2.054.025		0,65%
55	Desagüe de lavamanos	Unidad	2,000	273.870	547.740				547.740			0,17%
56	Instalación de Desagüe Clocal de sanitario hasta el 1er registro	Unidad	3,000	1.186.770	3.560.310				3.560.310			1,13%
57	Cámara de Inspección	Unidad	5,000	443.011	2.215.055				2.215.055			0,70%
58	Cámara Séptica	Unidad	1,000	2.177.806	2.177.806				2.177.806			0,69%
59	Pozo Absorvente	Unidad	1,000	3.151.906	3.151.906					3.151.906		1,00%
60	Ducha eléctrica, incluye bujes flexibles	Unidad	2,000	200.838	401.676					401.676		0,13%
61	Inodoro sisterna baja	Unidad	3,000	1.278.060	3.834.180						3.834.180	1,22%
62	Lavamanos con granito	Unidad	4,000	593.385	2.373.540						2.373.540	0,75%
63	Canilla de patio cromada pico manguera(grifería de bronce de 1/2 conexión y llave de paso 1/2	Unidad	1,000	228.225	228.225						228.225	0,07%
64	Jabonera de porcelana	Unidad	7,000	73.032	511.224						511.224	0,16%
65	Papelera de porcelana	Unidad	3,000	73.032	219.096						219.096	0,07%
66	Toallero, percha de porcelana	Unidad	7,000	73.032	511.224						511.224	0,16%
67	Caja cifonada 15x15	Unidad	5,000	82.161	410.805						410.805	0,13%
68	Mesada de granito (receccion)	Metros cuadrados	2,050	1.232.415	2.526.451						2.526.451	0,80%
69	Guarda obra y caminero, alisado de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	47,650	85.392	4.068.929				4.068.929			1,29%
70	Rampa de acceso peatonal de cemento impermeable con contrapiso de 7cm.	Metros cuadrados	12,300	85.392	1.050.322					1.050.322		0,33%
71	Letras corpóreas de 40 cm de altura	Unidad	19,000	661.852	12.575.188						12.575.188	4,00%
72	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	132,400	3.651	483.392						483.392	0,15%
	Total				314.764.324							100%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						71.116.109	26.143.180	20.518.351	28.450.192	79.243.958	89.292.534	314.764.324
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						22,59%	8,31%	6,52%	9,04%	25,18%	28,37%	100%

Ing. Andrés Díaz
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Andrés Díaz
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Hector Omar Mereles
HM Construcciones
Contratista

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-6
Edelira - Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 6

MCN – Menor Cuantía Nacional - AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL ID N° 455889

Contrato N°	77/24	Mes:	Mayo
Monto del Contrato:	314.764.324	Term. Prevista contractual:	1/5/2025
Plazo Contractual:	150 días	Ampliaciones:	30 días
Inicio de Obra:	2-dic-24	Term. Prevista :	31/5/2025

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO								
Contrato N° 77/24								
MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO		0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Diciembre	71.116.109	71.116.109	78.691.081	78.691.081	22,59%	22,59%	25,00%	25,00%
Enero	26.143.180	97.259.290	15.649.361	94.340.442	8,31%	30,90%	4,97%	29,97%
Febrero	20.518.351	117.777.640	23.113.240	117.453.682	6,52%	37,42%	7,34%	37,31%
Marzo	28.450.192	146.227.832	42.178.715	159.632.397	9,04%	46,46%	13,41%	50,72%
Abril	79.243.958	225.471.790	34.071.332	193.703.729	25,18%	71,63%	10,82%	61,54%
Mayo	89.292.534	314.764.324	121.060.596	314.764.324	28,37%	100,00%	38,46%	100,00%

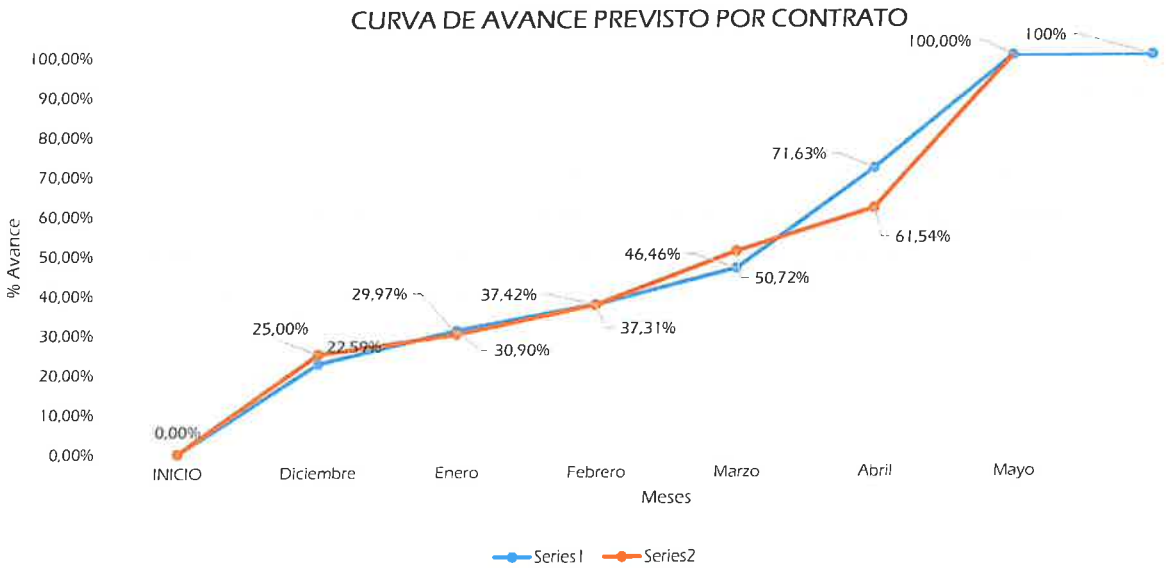

Ing. Andrés Díaz
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Hector Omar Mereles
HM Construcciones
Contratista

HM CONSTRUCCIONES
Héctor Mereles - RUC: 2383839-6
Edelira - Itapúa

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Lote 5697698189 , Cons.: 5

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270202920920

FECHA 23/06/2025

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	2383839	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	6	MERELES GONZALEZ HECTOR OMAR

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 23/07/2025

NÚMERO DE CONTROL : 8CF608F3

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427123838398CF608F3

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 2383839

NRO. CERTIFICADO: 496994

FECHA EMISION: 23-06-2025

VENCIMIENTO: 14-07-2025

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 2383839

Nro. Certificado: 496994

Razon Social: HECTOR OMAR MERELES GONZALEZ

Actividad(es): OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCION

Fecha de Inscripcion: 03-05-2022

Cantidad de Asegurados: 2

Nro. Patronal(es): 0366-40-0021 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - **REPSE**

N° RUC:	**23838396**
Razón Social o Contribuyente:	**HECTOR OMAR MERELES GONZALEZ**
Nombre Comercial:	**HM CONSTRUCCIONES**
Dirección:	**CALLE PIRAPEY 45 1RA LINEA CL8991 - EDELIRA**
Teléfono:	**0985-741351**
Correo electrónico:	**hectormereles75@hotmail.com**

Nro. de Registro REPSE **018798**

Conforme al Decreto N° 6866/11 y normativas vigentes concordantes.

Otorgado en Asunción el **03/05/2022**

Fecha de última renovación el **07/05/2024**

Este registro tiene fecha de vencimiento el **07/05/2026**

Constancia generada el **03/04/2025 23:09:26**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - **REPSE**

DETALLES

N° RUC:	**23838396**
Razón Social o Contribuyente:	**HECTOR OMAR MERELES GONZALEZ**
Nombre Comercial:	**HM CONSTRUCCIONES**

Nombre Establecimiento:	**MERELES GONZALEZ HECTOR OMAR**
Dirección:	**CALLE, PIRAPEY 45 1RA LINEA CL8991 //CASA - ITAPUA - ANTIDIA MATIAUDA - EDELIRA - ITAPUA**
NSP:	**1.0125.00.00 - Otros servicios especializados de construcción**
Descripción Actividad:	**(OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS DE CONSTRUCCIÓN N.C.P)**
NSP:	**1.0201.40 - Servicios de distribuición de mercaderias al por menor**
Descripción Actividad:	**(COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS EN COMERCIOS NO ESPECIALIZADOS)**
NSP:	**1.0102.90.00 - Otros servicios de construcción de edificios no residenciales**
Descripción Actividad:	**(CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RECIDENCIALES)**

Constancia generada el **03/04/2025 23:09:26**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - **REPSE**

DETALLES

N° RUC:	**23838396**
Razón Social o Contribuyente:	**HECTOR OMAR MERELES GONZALEZ**
Nombre Comercial:	**HM CONSTRUCCIONES**
NSP:	**1.0103.11.00 - Servicios de construcción de autopistas (excepto autopistas elevadas), calles y carreteras**
Descripción Actividad:	**(SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS (EXCEPTO AUTOPISTAS ELEVADAS), EMPEDRADOS, CALLES Y CARRETERAS)**

Nombre Establecimiento:	**HECTOR OMAR MERELES GONZÁLEZ - HM CONSTRUCCIONES**
Dirección:	**MARIA AUXILIADORA CASI SAN JUAN // CASA - TOMAS ROMERO PEREIRA - ITAPUA**
NSP:	**1.0103.11.00 - Servicios de construcción de autopistas (excepto autopistas elevadas), calles y carreteras**
Descripción Actividad:	**(CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO)**

Constancia generada el **03/04/2025 23:09:26**

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME N°6 - CERTIFICADO N°6 - FINAL

MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº: 21/2024 "AMPLIACIÓN DEL CENTRO OFTALMOLÓGICO HOSPITAL DISTRITAL DE MARIA AUXILIADORA - TOMAS ROMERO PEREIRA-PLURIANUAL" ID N° 455889

OBRA: Ampliación de Centro Oftalmológico

BENEFICIARIO: Distrito de Tomas Romero Pereira

FISCAL DE OBRAS: Ing. Andrés Díaz

AVANCE DE OBRA: 38,46%

AVANCE DE OBRA ACUMULADO: 100%

FECHA DE VISITA: 30/05/25

FECHA DE INFORME: 03/06/25

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Hospital Distrital de T.R. Pereira	Tomas Romero Pereira	314.764.324 Gs.
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
HM Construcciones	0985741351	77/2024
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL**
150 días	02 – Diciembre - 2024	01 – Mayo - 2025
PRORROGA POR LLUVIA	**FECHA DE TERMINACIÓN**	
30 días	31- Mayo - 2025	

OBSERVACIONES GENERALES:

Según las observaciones realizadas el día 30/05/25 la obra se encuentra culminada cumpliendo los plazos, ejecutándose según lo proyectado.

Durante este mes se realizaron controles semanales donde se observó al equipo de trabajo en la realización de diferentes rubros contractuales, entre los cuales se incluyen los trabajos de colocación de canaletas, bajadas, terminación de revoques, colocación de piso y zócalo de granito, revestimientos sanitarios, provisión de tomas corrientes, colocación de artefactos lumínicos, accesorios sanitarios y pinturas interior y exterior en general .

Se adjuntan a continuación evidencias fotográficas de los trabajos realizados

Ing. Andrés Diaz
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

.....

Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa
