GOBERNACION DE ITAPÚA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N°: 5
MES: ABRIL 2025

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 37/2024- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CELULAR Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE AFLUENTE DEL ARROYO KA´YGUANGUE DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – PLURIANUAL – CON ID: 456.108

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CELULAR Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE AFLUENTE DEL ARROYO KA´YGUANGUE DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN	100%	239.930.723	98,18%	235.569.674	1,82%	4.361.049	100,00%	239.930.723
A	**Total por Contrato**	**100%**	**239.930.723**	**98,18%**	**235.569.674**	**1,82%**	**4.361.049**	**100,00%**	**239.930.723**

Certificado Básico Nº	5
Mes:	ABRIL 2025
Contrato N°:	51/2024
Monto Básico:	239.930.723
Contratista:	ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Fecha de Inicio:	28-nov-24
Plazo de Ejecución:	210 días
Fecha de terminación prevista:	26/6/2025
Prórroga:	-
Fecha de terminación con prórroga:	-

B	**Deducciones a la fecha**			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	47.986.145	47.113.935	872.210	47.986.145
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**47.986.145**	**47.113.935**	**872.210**	**47.986.145**

C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**	3.488.839
C.II	Multas	0
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**	**3.488.839**

SON GUARANÍES: Trés millones cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve.-

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Representante Legal
Contratista

Arq. JAIME BECZKO GARCIA
REG. MOPC: 336 - REG. C.S.I. 1053
REG. SB.SG. Nº 164/03

ING. CARLOS AMARILLA
Fiscalización
Gobernación de Itapúa

ING. CUSTI ECKERT SILVERO
Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Publicas
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 5
PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO
MES: ABRIL 2025

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 37/2024- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CELULAR Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE AFLUENTE DEL ARROYO KA´YGUANGUE DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – PLURIANUAL – CON ID: 456.108

CONTRATISTA:	ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	**FECHA DE INICIO:**	28-nov-24
MONTO DE LA OFERTA:	239.930.723	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	26-jun-25
CONTRATO N°:	51/2024	**PRÓRROGA:**	-
PLAZO DE EJECUCIÓN:	210 días	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	-

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 37/2024- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CELULAR Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE AFLUENTE DEL ARROYO KA´YGUANGUE DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – PLURIANUAL – CON ID: 456.108							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de Obra (2x1,5m)	Unidad	1,00	1.493.313	1.493.313	0,62%	100,00%	0,00%	100,00%	0,62%	0,00%	0,62%	1,00	0,00	1,00	1.493.313	0	1.493.313
2	Movilización de obra (Despeje e instalación de campamento, obrador, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad de Medida Global	1,00	13.646.978	13.646.978	5,69%	100,00%	0,00%	100,00%	5,69%	0,00%	5,69%	1,00	0,00	1,00	13.646.978	0	13.646.978
3	Señalización vertical de seguridad. Según especificaciones técnicas.	Unidad	4,00	510.305	2.041.220	0,85%	100,00%	0,00%	100,00%	0,85%	0,00%	0,85%	4,00	0,00	4,00	2.041.220	0	2.041.220
4	Hormigón de regularización (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2)	Metros Cúbicos	10,80	1.657.218	17.897.954	7,46%	100,00%	0,00%	100,00%	7,46%	0,00%	7,46%	10,80	0,00	10,80	17.897.954	0	17.897.954
5	Provisión y colocación de alcantarillado celular de H° A° de 2,50X2,50m esp. 18cm. No incluye flete y movimiento de suelo	Unidad	18,00	6.338.153	114.086.754	47,55%	100,00%	0,00%	100,00%	47,55%	0,00%	47,55%	18,00	0,00	18,00	114.086.754	0	114.086.754
6	Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2).	Metros Cúbicos	18,07	3.190.226	57.647.384	24,03%	100,00%	0,00%	100,00%	24,03%	0,00%	24,03%	18,07	0,00	18,07	57.647.384	0	57.647.384
7	Baranda de H° A° - Prefabricada.	Metro lineal	12,00	644.140	7.729.680	3,22%	100,00%	0,00%	100,00%	3,22%	0,00%	3,22%	12,00	0,00	12,00	7.729.680	0	7.729.680
8	Provisión de Ripio	Metros Cúbicos	1.957,40	10.742	21.026.391	8,76%	100,00%	0,00%	100,00%	8,76%	0,00%	8,76%	1.957,40	0,00	1.957,40	21.026.391	0	21.026.391
9	Señalización vertical de información del alcantarillado. Según especificaciones técnicas.	Unidad	2,00	1.374.912	2.749.824	1,15%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	1,15%	1,15%	0,00	2,00	2,00	0	2.749.824	2.749.824
10	Limpieza inicial y final de obra	Unidad de Medida Global	1,00	1.611.225	1.611.225	0,67%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,67%	0,67%	0,00	1,00	1,00	0	1.611.225	1.611.225
Total					**239.930.723**	**100,00%**				**98,18%**	**1,82%**	**100,00%**				**235.569.674**	**4.361.049**	**239.930.723**

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Representante Legal
Contratista

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
REG. MOPC: 336 - REG. C.S.J. 1053
REG. SB.SG. N° 164/03

GOBERNACIÓN DEPART. Fiscalización de Obras

ING. CARLOS AMARILLA
Fiscalización
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 5
CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO
MES: ABRIL 2025

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 37/2024- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CELULAR Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE AFLUENTE DEL ARROYO KA´YGUANGUE DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – PLURIANUAL – CON ID: 456.108			
CONTRATISTA:	ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	**FECHA DE INICIO:**	28-nov-24
MONTO DE LA OFERTA GS:	239.930.723	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	26-jun-25
CONTRATO N°:	51/2024	**PRÓRROGA:**	-
PLAZO DE EJECUCIÓN:	210 días	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	-

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 37/2024- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CELULAR Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE AFLUENTE DEL ARROYO KA´YGUANGUE DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – PLURIANUAL – CON ID: 456.108

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	PLAZO DE EJECUCIÓN							TOTAL
						DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	
1	Cartel de Obra (2x1,5m)	Unidad	1,00	1.493.313	1.493.313	1.493.313							1.493.313
2	Movilización de obra (Despeje e instalación de campamento, obrador, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad de Medida Global	1,00	13.646.978	13.646.978	13.646.978							13.646.978
3	Señalización vertical de seguridad. Según especificaciones técnicas.	Unidad	4,00	510.305	2.041.220							2.041.220	2.041.220
4	Hormigón de regularización (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2)	Metros Cúbicos	10,80	1.657.218	17.897.954		17.897.954						17.897.954
5	Provisión y colocación de alcantarillado celular de H° A° de 2,50X2,50m esp. 18cm. No incluye flete y movimiento de suelo	Unidad	18,00	6.338.153	114.086.754			57.043.377	57.043.377				114.086.754
6	Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2).	Metros Cúbicos	18,07	3.190.226	57.647.384					28.823.692	28.823.692		57.647.384
7	Baranda de H° A° - Prefabricada.	Metro lineal	12,00	644.140	7.729.680							7.729.680	7.729.680
8	Provisión de Ripio	Metros Cúbicos	1.957,40	10.742	21.026.391							21.026.391	21.026.391
9	Señalización vertical de información del alcantarillado. Según especificaciones técnicas.	Unidad	2,00	1.374.912	2.749.824							2.749.824	2.749.824
10	Limpieza inicial y final de obra	Unidad de Medida Global	1,00	1.611.225	1.611.225							1.611.225	1.611.225
TOTAL EN GUARANIES					**239.930.723**								
AVANCE PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						15.140.291	17.897.954	57.043.377	57.043.377	28.823.692	28.823.692	35.158.340	**239.930.723**
AVANCE PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						6,31%	7,46%	23,77%	23,77%	12,01%	12,01%	14,65%	**100,00%**

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Representante Legal
Contratista

Arq. JAIME BECZKO GARCIA
REG. MOPC: 336 - REG. C.S.J. 1053
REG. SB.SG. Nº 164/03

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

ING. CARLOS AMARILLA
Fiscalización
Gobernación de Itapúa

GOBERNACION DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 5
CUADRO Y CURVA DE AVANCE
MES: ABRIL 2025

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 37/2024- CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO CELULAR Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE AFLUENTE DEL ARROYO KA´YGUANGUE DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN – PLURIANUAL – CON ID: 456.108

Contrato N°: 51/2024			
Monto del Contrato:	239.930.723	**Fecha de terminación prevista:**	26-jun-25
Plazo Contractual:	210 días	**Prórroga:**	-
Inicio de Obra:	28-nov-24	**Fecha de terminación con prórroga:**	-

CUADRO DE AVANCE								
MES	**PREVISTO GS.**		**EJECUTADO GS.**		**PREVISTO %**		**EJECUTADO %**	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
Inicio	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
dic-24	15.140.291	15.140.291	59.982.680	59.982.680	6,31%	6,31%	25,00%	25,00%
ene-25	17.897.954	33.038.245	87.142.319	147.124.999	7,46%	13,77%	36,32%	61,32%
feb-25	57.043.377	90.081.622	65.377.064	212.502.063	23,77%	37,54%	27,25%	88,57%
mar-25	57.043.377	147.124.999	23.067.611	235.569.674	23,77%	61,32%	9,61%	98,18%
abr-25	28.823.692	175.948.691	4.361.049	239.930.723	12,01%	73,33%	1,82%	100,00%
may-25	28.823.692	204.772.383			12,01%	85,35%		
jun-25	35.158.340	239.930.723			14,65%	100,00%		

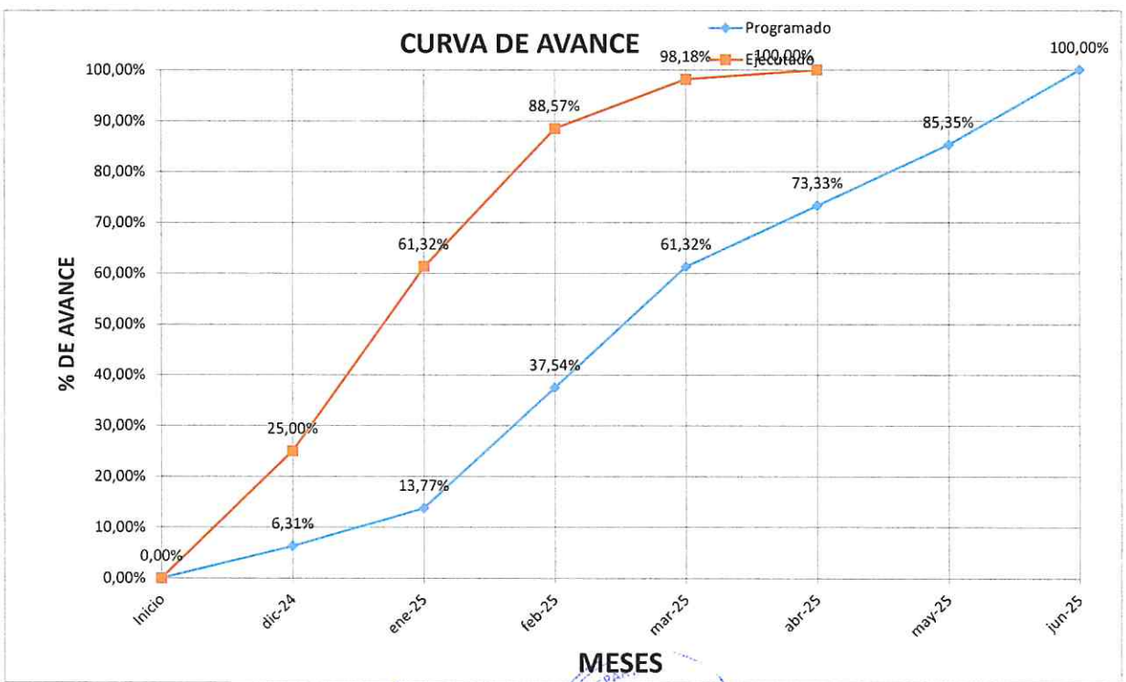

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Representante Legal
Contratista

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
REG. MOPC: 336 - REG. C.S.J. 1053
REG. SB.SG. N° 164/03

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

ING. CARLOS AMARILLA
Fiscalización
Gobernación de Itapúa

5
