MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

Obra: Items del llamado L.P.N_01_CONSTRUCCION PLANTA BAJA - SEDE
Planilla de Certificado N° 4
Periodo: Enero 2024

	Fecha de presentación	25/11/2023
	Fecha de Inicio	25/9/2023
	Plazo Inicial	250
	Dias de Lluvia	
Plazo Inicial + Prorroga		
	Dias trascurridos	120
	Dias de retrazo	

RESUMEN GENERAL

	Descripción	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE (%) ANTERIOR	AVANCE (%) PRESENTE	AVANCE (%) ACUMULADO	MONTO BRUTO ANTERIOR	MONTO BRUTO PRESENTE	MONTO BRUTO ACUMULADO
A	OBRA: CONSTRUCCION PLANTA BAJA - SEDE UNAMIS con ID: 428586	1.573.769.730	26,9%	20,1%	47,0%	423.628.534	316.729.714	740.358.248
B	DEDUCCION DE FECHAS							
B.1	MULTAS (0,05% POR DIA)	786.885	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
B.2	DESCUENTO DE ANTICIPO (3%)	-	0,0%	0,0%	0,0%	-	-	-
B.3	RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO 5%)	78.688.487	26,9%	20,1%	47,0%	21.181.427	15.836.486	37.017.913
C	MONTO NETO A PAGAR (A-B)					402.447.107	300.893.228	703.340.335

SON GUARANIES: TRESCIENTOS MILLONES, OCHOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL, DOSCIENTOS VEINTIOCHO----------

.....
Sr. Luis Miguel Martínez Villar
Representante
Contratista: Ecoservice Group SA

ecoservice
GROUP S.A.
RUC: 80058998 - 0

.....
Arq. Diego Valdez
Fiscal de Obra
Municipalidad de San Ignacio Guazu

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES
ACTA DE MEDICIÓN
Ítems del llamado L.P.N_01_CONSTRUCCION PLANTA BAJA - SEDE UNAMIS con ID: 428586
CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP SA

Planilla de certificado N° 4

Periodo: Enero 2024

En el lugar de obra, Distrito de San Ignacio Guazu, Departamento de Misiones, a los 25 días del mes de enero del año 2024, se reunen la empresa Contratista "Ecoservice Group SA" representada por el Sr. Luis Miguel Martínez Villar, y la Fiscalización representada por el Arq. Diego Valdez, con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes.

		CONTRACTUAL				CANTIDADES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	838,54	7.586	6.361.164	838,54	**0,00**	838,54
2	Relleno y compactación	Metros cúbicos	480	74.797	35.902.560	375,00	**105,00**	480,00
3	Cartel con impresion	Unidad	1	1.064.727	1.064.727	1,00	**0,00**	1
4	Preparacion de obra	Unidad Medida Global						
4.1	Vallado de Obra	Metro lineal	150	164.900	24.735.000	150,00	**0,00**	150
4.2	Obrador	Metros cuadrados	16	240.761	3.852.176	16,00	**0,00**	16,00
4.3	Placa Conmemorativa	Unidad	1	1.517.236	1.517.236			0,00
5	Construccion de losa	Unidad Medida Global	1					
5.1	Tubulones con Hº ciclopeo	Metros cuadrados	12,8	1.899.207	24.309.850	12,80	**0,00**	12,80
	Cabezales	Metros cúbicos	29	2.480.815	71.943.635	29,00	**0,00**	29
5.3	Viga de fundación	Metros cúbicos	39	2.539.774	99.051.186	39,00	**0,00**	39
5.4	Columnas	Metros cúbicos	18	2.530.457	45.548.226	18,00	**0,00**	18,00
5.5	Vigas	Metros cúbicos	51,3	2.487.602	127.613.983	11,50	**39,80**	51,30
5.6	Losa	Metros cúbicos	94,8	2.633.071	249.615.131	19,50	**75,30**	94,80
5.7	Escalera de Hº Aº	Unidad	1	5.860.224	5.860.224		**1,00**	1,00

ecoservice GROUP SA
RUC: 80058998 - 0

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

OBS: Fecha de medición 29/01/2024-

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

6	Mamposteria	Unidad Medida Global	1					
6.1	Nivelación de 0,30cm.	Metros cuadrados	270	185.129	49.984.830	210,00	**31,00**	241,00
6.2	Elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	96	99.685	9.569.760			0,00
6.3	Elevación de 0,20 para revocar	Metros cuadrados	635	144.803	91.949.905			0,00
6.4	Envarillado sobre abertura	Metro lineal	30	23.291	698.730			0,00
7	Aislación Asfaltica	Metro lineal	228	46.049	10.499.172			0,00
8	Revoques	Unidad Medida Global	1					
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	1.662	37.532	62.378.184			0,00
9	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1					
9.1	Contrapiso de H° de cascotes 10cms.	Metros cuadrados	838,54	38.064	31.918.187			0,00
9.2	Piso	Metros cuadrados	838,54	155.317	130.239.517			0,00
10	Zocalo	Metro lineal	365	39.528	14.427.720			0,00
11	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1					
11.1	Sin Porcelanato	Metros cuadrados	160	200.302	32.048.320			0,00
11.2	de Piedra	Metros cuadrados	70	189.788	13.285.160			0,00
12	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1					
12.1	Agua corriente-Des Cl - Camara de inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	24.967.855	24.967.855			0,00
12.2	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	6.151.063	6.151.063			0,00
13	Mesada de mamposteria con revestimiento	Metro lineal	14,4	1.052.749	15.159.586			0,00

ecoservice GROUP S.A. RUC: 80058998 - 0

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

14	Construcción de Cámara Séptica tipo 3 de 1,50x3,00	Unidad	1	10.815.233	10.815.233			0,00
15	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1					
15.1	Tablero TP de 36 AG	Unidad	2	1.770.109	3.540.218			0,00
15.2	Alimentación de los circuitos	Unidad	243	110.465	26.842.995			0,00
15.3	Alimentación 4x1 de 10mm NYY al tablero	Metro lineal	50	37.265	1.863.250			0,00
15.4	Artefactos flourescentes de 1x40w	Unidad	11	127.767	1.405.437			0,00
15.5	Panel led de adosar de 24w	Unidad	119	101.815	12.115.985			0,00
15.6	Lampara	Unidad	5	314.095	1.570.475			0,00
15.7	Luminaria 60w	Unidad	8	60.556	484.448			0,00
15.8	Registro Eléctrico	Unidad	4	176.212	704.848			0,00
16	Aberturas	Unidad Medida Global	1					
16.1	Puerta Metalica de 1,50x2,10 (provisión y colocación) carpinteria metalica	Unidad	1	1.646.335	1.646.335			0,00
16.2	Puerta placa con marco y herrajes de 0,90 x 2,10 (provisión y colocación) carpinteria de madera	Unidad	11	1.300.298	14.303.278			0,00
16.3	Puerta placa con marco y herraje de 1,50 x 2,10 (provisión y colocación) carpinteria madera	Unidad	4	2.255.891	9.023.564			0,00
17	Servicio de Colocacion/desmontaje de baranda de seguridad	Metro lineal	86	632.847	54.424.842			0,00
18	Vidrios	Metros cuadrados	83,4	955.593	79.696.456			0,00
19	Mamparas	Unidad Medida Global	1					
19.1	De eucatex divisorias (eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesorios)	Metros cuadrados	118	343.375	40.518.250			0,00
20	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1					
20.1	De Paredes revocadas	Metros cuadrados	1.662	34.471	57.290.802			0,00
20.2	De cielorraso al látex	Metros cuadrados	670	42.190	28.267.300			0,00
20.3	De revestido de piedra con antimoho incoloro	Metros cuadrados	70	21.028	1.471.960			0,00

ecoservice GROUP S.A.
RUC: 80058998 - 0

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

21	Instalacion de sistema contra incendios	Unidad Medida Global	1					
21.2	Iluminación autonoma de emergencia tipo led	Unidad	4	439.200	1.756.800			0,00
21.3	Cartel luminoso indicador de salida de emergencia	Unidad	3	501.753	1.505.259			0,00
21.4	Detector de humo-calor	Unidad	26	520.385	13.530.010			0,00
21.5	Detector termovelocimetrico	Unidad	2	479.127	958.254			0,00
21.6	Pulsador manual de alarma	Unidad	1	604.233	604.233			0,00
21.7	Alarma audiovisual c/luz estroboscopica	Unidad	1	724.015	724.015			0,00
21.8	Cables cajas y accesorios menores	Unidad	1	13.253.433	13.253.433			0,00
22	Limpieza de obra	Metros cuadrados	838,54	5.723	4.798.964			0,00
				Precio Total	**1.573.769.730**			

.....

Sr. Luis Miguel Martínez Villar
Representante
Contratista: Ecoservice Group SA

ecoservice
GROUP S.A.
RUC: 80058998 - 0

.....

Arq. Diego Valdez
Fiscal de Obras
Municipalidad de San Ignacio Guazú
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

Obra: Ítems del llamado L.P.N_01_CONSTRUCCION PLANTA BAJA - SEDE UNAMIS con ID: 428586

Planilla de Certificado N° 4

Periodo: Enero 2024

Fecha de presentación	22/12/2023
Fecha de Inicio	25/9/2023
Plazo Inicial	250
Días de Lluvia	
Plazo Inicial + Prorroga	
Días trascurridos	120
Días de retrazo	

		CONTRACTUAL				CANTIDADES			AVANCE (%)			MONTO BRUTO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	838,54	7.586	6.361.164	838,54	0,00	838,54	100,00%	0,00%	100,00%	6.361.164	0	6.361.164
2	Relleno y compactación	Metros cúbicos	480	74.797	35.902.560	375,00	105,00	480,00	78,13%	21,88%	100,00%	28.048.875	7.853.685	35.902.560
3	Cartel con impresion	Unidad	1	1.064.727	1.064.727	1,00	0,00	1	100,00%	0,00%	100,00%	1.064.727	0	1.064.727
4	Preparacion de obra	Unidad Medida Global										0	0	0
4.1	Vallado de Obra	Metro lineal	150	164.900	24.735.000	150,00	0,00	150	100,00%	0,00%	100,00%	24.735.000	0	24.735.000
4.2	Obrador	Metros cuadrados	16	240.761	3.852.176	16,00	0,00	16,00	100,00%	0,00%	100,00%	3.852.176	0	3.852.176
4.3	Placa Conmemorativa	Unidad	1	1.517.236	1.517.236			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
5	Construccion de losa	Unidad Medida Global	1											
5.1	Tubulones con Hº ciclopeo	Metros cuadrados	12,8	1.899.207	24.309.850	12,80	0,00	12,80	100,00%	0,00%	100,00%	24.309.850	0	24.309.850
5.2	Cabezales	Metros cúbicos	29	2.480.815	71.943.635	29,00	0,00	29	100,00%	0,00%	100,00%	71.943.635	0	71.943.635
5.3	Viga de fundación	Metros cúbicos	39	2.539.774	99.051.186	39,00	0,00	39	100,00%	100,00%	100,00%	99.051.186	0	99.051.186
5.4	Columnas	Metros cúbicos	18	2.530.457	45.548.226	18,00	0,00	18,00	100,00%	100,00%	100,00%	45.548.226	0	45.548.226
5.5	Vigas	Metros cúbicos	51,3	2.487.602	127.613.983	11,50	39,80	51,30	22,42%	77,58%	100,00%	28.607.423	99.006.560	127.613.983
5.6	Losa	Metros cúbicos	94,8	2.633.071	249.615.131	19,50	75,30	94,80	20,57%	79,43%	100,00%	51.344.885	198.270.246	249.615.131
5.7	Escalera de Hº Aº	Unidad	1	5.860.224	5.860.224		1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%	0	5.860.224	5.860.224
6	Mampostería	Unidad Medida Global	1											
6.1	Elevación de 0,30cm.	Metros	270	185.129	49.984.830	210,00	31,00	241,00	77,78%	89,26%	89,26%	38.877.090	5.738.999	44.616.089
6.2	Elevación de 0,15 para revocar	Metros cuadrados	96	99.685	9.569.760			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
6.3	Elevación de 0,20 para revocar	Metros cuadrados	635	144.803	91.949.905			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
6.4	Envarillado sobre abertura	Metro lineal	30	23.291	698.730			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
7	Aislación Asfaltica	Metro lineal	228	46.049	10.499.172			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
8	Revoques	Unidad Medida Global	1											
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	1.662	37.532	62.378.184			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
9	Colocación de pisos - contrapisos	Unidad Medida Global	1											

ecoservice GROUP S.A. RUC: 80058998-0

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

9.1	Contrapiso de H° de cascotes 10cms.	Metros cuadrados	838,54	38.064	31.918.187			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
9.2	Piso	Metros cuadrados	838,54	155.317	130.239.517			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
10	Zocalo	Metro lineal	365	39.528	14.427.720			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
11	Revestimiento de azulejos	Unidad Medida Global	1											
11.1	Con Porcelanato	Metros cuadrados	160	200.302	32.048.320			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
11.2	de Piedra	Metros cuadrados	70	189.788	13.285.160			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
12	Instalaciones sanitarias	Unidad Medida Global	1											
12.1	Agua corriente-Des Cl - Camara de inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	24.967.855	24.967.855			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
12.2	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Unidad	1	6.151.063	6.151.063			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
13	Mesada de mamposteria con revestimiento	Metro lineal	14,4	1.052.749	15.159.586			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
14	Construcción de Cámara Séptica tipo 3 de 1,50x3,00	Unidad	1	10.815.233	10.815.233			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15	Instalacion Electrica	Unidad Medida Global	1											
15.1	Tablero TP de 36 AG	Unidad	2	1.770.109	3.540.218			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15.2	Alimentación de los circuitos	Unidad	243	110.465	26.842.995			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15.3	Alimentación 4x1 de 10mm NYY al tablero	Metro lineal	50	37.265	1.863.250			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15.4	Artefactos flourescentes de 1x40w	Unidad	11	127.767	1.405.437			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15.5	Panel led de adosar de 24w	Unidad	119	101.815	12.115.985			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15.6	Lampara	Unidad	5	314.095	1.570.475			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15.7	Luminaria 60w	Unidad	8	60.556	484.448			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
15.8	Registro Eléctrico	Unidad	4	176.212	704.848			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
16	Aberturas	Unidad Medida Global	1											
16.1	Puerta Metalica de 1,50x2,10 (provisión y colocación) carpinteria metalica	Unidad	1	1.646.335	1.646.335			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
16.2	Puerta placa con marco y herrajes de 0,90 x 2,10 (provisión y colocación) carpinteria de madera	Unidad	11	1.300.298	14.303.278			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
16.3	Puerta placa con marco y herraje de 1,50 x 2,10 (provisión y colocación) carpinteria madera	Unidad	4	2.255.891	9.023.564			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
17	Servicio de Colocacion/desmontaje de baranda de seguridad	Metro lineal	86	632.847	54.424.842			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
18	Vidrios	Metros cuadrados	83,4	955.593	79.696.456			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
19	Mamparas	Unidad Medida Global	1											
19.1	eucatex divisorias (eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesorios)	Metros cuadrados	118	343.375	40.518.250			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
20	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1											
20.1	De Paredes revocadas	Metros cuadrados	1.662	34.471	57.290.802			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
20.2	De cielorraso al látex	Metros cuadrados	670	42.190	28.267.300			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
20.3	De revestido de piedra con antimoho incoloro	Metros cuadrados	70	21.028	1.471.960			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
21	Instalacion de sistema contra incendios	Unidad Medida Global	1											

ecoservice GROUP S.A.
RUC: 80058998-0

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

21.2	Iluminación autonoma de emergencia tipo led	Unidad	4	439.200	1.756.800			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
21.3	Cartel luminoso indicador de salida de emergencia	Unidad	3	501.753	1.505.259			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
21.4	Detector de humo-calor	Unidad	26	520.385	13.530.010			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
21.5	Detector termovelocimetrico	Unidad	2	479.127	958.254			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
21.6	Pulsador manual de alarma	Unidad	1	604.233	604.233			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
21.7	Alarma audiovisual c/luz estroboscopica	Unidad	1	724.015	724.015			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
21.8	Cables cajas y accesorios menores	Unidad	1	13.253.433	13.253.433			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
22	Limpieza de obra	Metros cuadrados	838,54	5.723	4.798.964			0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0
				Precio Total	**1.573.769.730**				**26,9%**	**20,13%**	**47,0%**	**423.628.534**	**316.729.714**	**740.358.248**

Sr. Luis Miguel Martinez Villar
Representante
Contratista: Ecoservice Group SA

ecoservice
GROUP S.A.
RUC: 80058998 - 0

Arq. Diego Valdez
Fiscal de Obra
Municipalidad de San Ignacio Guazu

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA BAJA - SEDE UNAMIS LPN° 01/2023 ID N°: 428.586

CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP SA

FISCALIZACIÓN: ARQ. DIEGO VALDEZ

CERTIFICADO	
CONTRACTUAL	

CRONOGRAMA FISICO

	sept-23	oct-23				nov-23				dic-23				ene-24				feb-24				mar-24				abr-24				may-24				jun-24			
Descripción del Bien	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Replanteo y marcación																																					
Relleno y compactación																																					
Cartel con impresion																																					
Preparacion de obra																																					
Vallado de Obra																																					
Obrador																																					
Placa Conmemorativa																																					
Construccion de losa																																					
Tubulones con Hº ciclopeo																																					
Cabezal																																					
Viga de fundación																																					
Columnas																																					
Vigas																																					
Losa																																					
Escalera de Hº Aº																																					
Mamposteria - al terminar losa 15 dias despues																																					
Nivelación de 0,30cm.																																					
Elevación de 0,15 para revocar																																					
Elevación de 0,20 para revocar																																					
Envarillado sobre abertura																																					
Aislación Asfaltica																																					
Revoques																																					
De paredes interior y exterior a una capa																																					
Colocación de pisos - contrapisos																																					
Contrapiso de Hº de cascotes 10cms.																																					
Piso																																					
Zocalo																																					
Revestimiento de azulejos																																					
Con Porcelanato																																					
de Piedra																																					
Instalaciones sanitarias																																					
Agua corriente-Des Cl - Camara de inspección y artefactos sanitarios																																					
Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00																																					
Mesada de mamposteria con revestimiento																																					
Construcción de Cámara Séptica tipo 3 de 1,50x3,00																																					
Instalación Electrica																																					
Tablero TS de 3x7AG																																					
Alimentación de los circuitos																																					
Alimentación 4x1 de 10mm NYY al tablero																																					
Artefactos flourescentes de 1x40w																																					
Panel led de adosar de 24w																																					
Lampara																																					
Luminaria 60w																																					
Registro Eléctrico																																					
Aberturas																																					
Puerta Metalica de 1,50x2,10 (provisión y colocación) carpinteria metalica																																					
Puerta placa con marco y herrajes de 0,90 x 2,10 (provisión y colocación) carpinteria de madera																																					
Puerta placa con marco y herraje de 1,50 x 2,10 (provisión y colocación) carpinteria madera																																					
Servicio de Colocacion/desmontaje de baranda de seguridad																																					
Vidrios																																					
Mamparas																																					
De eucatex divisorias (eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesorios)																																					
Servicio de pintura																																					

ecoservice

RUC: 80058990-0

Arq. Diego A. Valdez A.

Fiscal De Obra

De Paredes revocadas																																								
De cielorraso al látex																																								
De revestido de piedra con antimoho incoloro																																								
Instalacion de sistema contra incendios																																								
Iluminación autonoma de emergencia tipo led																																								
Cartel luminoso indicador de salida de emergencia																																								
Detector de humo-calor																																								
Detector termovelocimetrico																																								
Pulsador manual de alarma																																								
Alarma audiovisual c/luz estroboscopica																																								
Cables cajas y accesorios menores																																								
Limpieza de obra																																								

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

ecoservice GROUP S.A.
RUC: 80058998 - 0

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA BAJA - SEDE UNAMIS LPN° 01/2023 ID N°: 428.586

CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP SA
FISCALIZACIÓN: ARQ. DIEGO VALDEZ

CRONOGRAMA FINANCIERO

Ítem	Descripción del Bien	Precio total	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
1	Replanteo y marcación	6.361.164		6.361.164								
2	Relleno y compactación	35.902.560			35.902.560							
3	Cartel con impresion	1.064.727		1.064.727								
4	**Preparacion de obra**	-										
4.1	Vallado de Obra	24.735.000		24.735.000								
4.2	Obrador	3.852.176		3.852.176								
4.3	Placa Conmemorativa	1.517.236										1.517.236
5	**Construccion de losa**	-										
5.1	Tubulones con Hº ciclopeo	24.309.850		24.309.850								
5.2	Cabezal	71.943.635		35.971.818	35.971.818							
5.3	Viga de fundación	99.051.186		49.525.593	49.525.593							
5.4	Columnas	45.548.226		22.774.113	22.774.113							
5.5	Vigas	127.613.983				127.613.983						
5.6	Losa	249.615.131				124.807.565	124.807.565					
5.7	Escalera de Hº Aº	5.860.224					5.860.224					
6	**Mampostería**	-										
6.1	Nivelación de 0,30cm.	49.984.830		24.992.415	24.992.415							
6.2	Elevación de 0,15 para revocar	9.569.760					7.655.808	1.913.952				
6.3	Elevación de 0,20 para revocar	91.949.905					73.559.924	18.389.981				
6.4	Envarillado sobre abertura	698.730						698.730				
7	Aislación Asfaltica	10.499.172				10.499.172						
8	**Revoques**	-										
8.1	De paredes interior y exterior a una capa	62.378.184							62.378.184			
9	**Colocación de pisos - contrapisos**	-										
9.1	Contrapiso de Hº de cascotes 10cms.	31.918.187					9.575.456	22.342.731				
9.2	Piso	130.239.517							65.119.759	65.119.759		
10	Zócalo	14.427.720									14.427.720	
11	**Revestimiento de azulejos**	-										
11.1	Con Porcelanato	32.048.320								16.024.160	16.024.160	
11.2	De Pared	13.285.160									13.285.160	
12	**Instalaciones sanitarias**	-										
12.1	Agua corriente-Des Cl - Camara de inspección y artefactos sanitarios	24.967.855						4.993.571	12.483.928	7.490.357		
12.2	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	6.151.063							6.151.063			
12.3	Mesada de mamposteria con revestimiento	15.159.586							15.159.586			
12.4	Construcción de Cámara Séptica tipo 3 de 1,50x3,00	10.815.233						10.815.233				
15	**Instalacion Electrica**	-										
15.1	Tablero TP de 36 AG	3.540.218							3.540.218			
15.2	Alimentación de los circuitos	26.842.995						13.421.498	13.421.498			
15.3	Alimentación 4x1 de 10mm NYY al tablero	1.863.250							1.863.250			
15.4	Artefactos flourescentes de 1x40w	1.405.437								1.405.437		
15.5	Panel led de adosar de 24w	12.115.985								12.115.985		
15.6	Lampara	1.570.475								1.570.475		
15.7	Luminaria 60w	484.448							484.448			
15.8	Registro Eléctrico	704.848							704.848			
16	**Aberturas**	-										
16.1	Puerta Metalica de 1,50x2,10 (provisión y colocación) carpinteria metalica	1.646.335								1.646.335		
16.2	Puerta placa con marco y herrajes de 0,90 x 2,10 (provisión y colocación) carpinteria de madera	14.303.278								14.303.278		
16.3	Puerta placa con marco y herraje de 1,50 x 2,10 (provisión y colocación) carpinteria madera	9.023.564								9.023.564		
17	Servicio de Colocacion/desmontaje de baranda de seguridad	54.424.842									54.424.842	
18	Vidrios	79.696.456								39.848.228	39.848.228	
19	**Mamparas**	-										
19.1	De eucatex divisorias (eucatex con estructura de acero inoxidable, incluye puertas y accesorios)	40.518.250							20.259.125	20.259.125		
20	**Servicio de pintura**	-										
20.1	De Paredes revocadas	57.290.802							28.645.401	28.645.401		
20.2	De cielorraso al látex	28.267.300								14.133.650	14.133.650	
20.3	De revestido de piedra con antimoho incoloro	1.471.960									1.471.960	
21	**Instalacion de sistema contra incendios**	-										
21.2	Iluminación autonoma de emergencia tipo led	1.756.800									1.756.800	
21.3	Cartel luminoso indicador de salida de emergencia	1.505.259									1.505.259	
21.4	Detector de humo-calor	13.530.010									13.530.010	
21.5	Detector termovelocimetrico	958.254									958.254	
21.6	Pulsador manual de alarma	604.233									604.233	
21.7	Alarma audiovisual c/luz estroboscopica	724.015									724.015	
21.8	Cables cajas y accesorios menores	13.253.433									13.253.433	
22	**Limpieza de obra**	4.798.964									2.399.482	2.399.482
	MONTO TOTAL	1.573.769.730										
	Monto bruto mensual			193.586.856	169.166.499	262.920.720	221.458.977	72.575.695	230.211.306	231.585.753	188.347.206	3.916.718
	Porcentaje Avance Mensual			12,30	10,75	16,71	14,07	4,61	14,63	14,72	11,97	0,25
	Monto bruto acumulado mensual			193.586.856	362.753.354	625.674.074	847.133.051	919.708.747	1.149.920.053	1.381.505.806	1.569.853.012	1.573.769.730
	Porcentaje Avance acumulado mensual			12,30	23,05	39,76	53,83	58,44	73,07	87,78	99,75	100,00

ecoservice GROUP
RUC: 80058998

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA BAJA - SEDE UNAMIS LPN° 01/2023 ID N°: 428.586

CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP SA
FISCALIZACIÓN: ARQ. DIEGO VALDEZ

RESUMEN

CONTRACTUAL	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Monto bruto mensual	-	193.586.856	169.166.499	262.920.720	221.458.977	72.575.695	230.211.306	231.585.753	188.347.206	3.916.718
Porcentaje Avance Mensual	-	12,30	10,75	16,71	14,07	4,61	14,63	14,72	11,97	0,25
Monto bruto acumulado mensual	-	193.586.856	362.753.354	625.674.074	847.133.051	919.708.747	1.149.920.053	1.381.505.806	1.569.853.012	1.573.769.730
Porcentaje Avance acumulado mensual	-	12,30	23,05	39,76	53,83	58,44	73,07	87,78	99,75	100,00

CERTIFICADO										
Monto bruto mensual	-	146.330.308	138.641.814	138.806.409	316.729.714					
Porcentaje Avance Mensual	-	9,30	8,81	8,82	20,13					
Monto bruto acumulado mensual	-	146.330.308	284.972.122	423.778.531	740.508.245					
Porcentaje Avance acumulado mensual	-	9,30	18,11	26,93	47,06					

Porcentaje avance acumulado mensual contractual	-	12,30	23,05	39,76	53,83					
Porcentaje Avance Mensual	-	9,30	18,11	26,93	47,06					

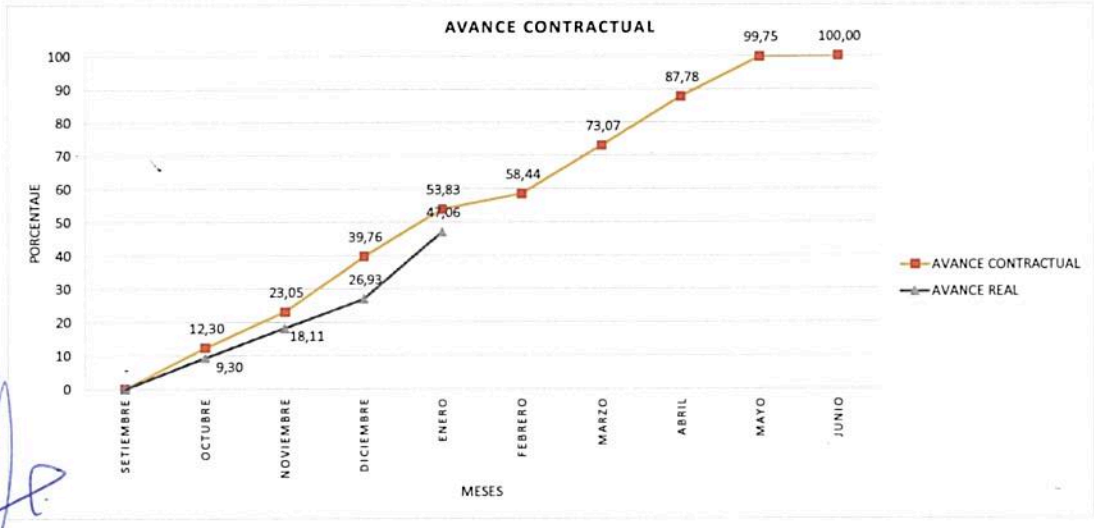

Sr. Luis Miguel Martínez Villar
Representante
Contratista: Ecoservice Group SA

ecoservice
GROUP S.A.
RUC: 80058998 - 0

Arq. Diego Valdez
Fiscal de Obra
Municipalidad de San Ignacio Guazu

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra
