OSCAR MOREL OSES	MUNICIPALIDAD DE VILLETA	Fecha de Firma de Contrato:	30/11/2024
INGENIERO CIVIL		Fecha de Orden de Inicio:	10/12/2024
		Fecha de Acta de Medicion:	10/1/2025
	L.P.N. – ID N° 454.587 "CONSTRUCCION PASEO PLAYA MUNICIPAL	PERIODO:	ene-25
oscarmoreloses@gmail.com	CERTIFICADO N° 01	MONTO DE OBRA	2.399.800.000

			CONTRACTUAL			CANTIDADES				MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Total S/ Contrato	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acaumulada	%	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
	Grupo 1 - CONSTRUCCION DE ADOQUINES											
1	Preparación del Terreno	m2	3.040,00	3.200,00	9.728.000		3.040,00	3.040,00	100,00%		9.728.000	9.728.000
2	Replanteo y Marcación	m2	3.040,00	3.100,00	9.424.000		3.040,00	3.040,00	100,00%		9.424.000	9.424.000
3	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	800,00	50.000,00	40.000.000		400,00	400,00	50,00%		20.000.000	20.000.000
4	Construcción de cordón cuneta	ml	400,00	127.000,00	50.800.000							
5	Provisión y colocación de Adoquines	m2	3.040,00	162.000,00	492.480.000							
6	Limpieza final	Un	1,00	3.700.000,00	3.700.000							
	Grupo 2 - PROVISION Y COLOCACION DE PISO											
1	Preparación del Terreno	m2	4.738,00	3.200,00	15.161.600		4.738,00	4.738,00	100,00%		15.161.600	15.161.600
2	Replanteo y Marcación	m2	4.738,00	3.100,00	14.687.800		4.738,00	4.738,00	100,00%		14.687.800	14.687.800
3	Contrapiso	m2	4.738,00	40.000,00	189.520.000		600,00	600,00	12,66%		24.000.000	24.000.000
4	Provisión y colocación de piso granito 30*30 con diseño	m2	4.738,00	143.750,00	681.087.500							
5	Limpieza Final	Un	1,00	3.700.000,00	3.700.000							
	Grupo 3 - PROVISION Y MONTAJE DE GLORIETA											
1	Estructura Metalica con caño redondo de 4" * 2 mm como pilares, contramado de caño redondo de 3" de 1,80 mm y espinas con caño cuadrado 25*25 de 1,20 mm	Un	4,00	16.500.000,00	66.000.000		2,00	2,00	50,00%		33.000.000	33.000.000
2	Montaje de Estructura Metálica	Un	4,00	1.400.000,00	5.600.000							
	Grupo 4 - TRABAJO DE ILUMINACIÓN											
1	Columnas cilindrica de 9 m con dos brazos de 2 mts. y artefactos. Cada 15 mts.	Un	40,00	4.000.000,00	160.000.000		13,00	13,00	32,50%		52.000.000	52.000.000
2	Provisión y excavación de columna de H°A° de 9,15 mts. Y cimentacion tipo de la Ande (0,60*0,40cms *1,5 mts de profundiada) terminado en obra.	Un	70,00	1.700.000,00	119.000.000							
3	Brazos de 2 mst. Galvanizados	Un	70,00	240.000,00	16.800.000							
4	Alumbrado Publico Led 150 w	Un	70,00	400.000,00	28.000.000							
5	Cableado Pre Ensambaldo 2*6 mm2	ml	1.520,00	15.000,00	22.800.000							
6	Cable de 2*2,5 mm2	ml	364,00	7.000,00	2.548.000		100,00	100,00	27,47%		700.000	700.000
7	Montaje de Columnas Cilíndricas	Un	40,00	1.200.000,00	48.000.000		13,00	13,00	32,50%		15.600.000	15.600.000
	Grupo 5 - CONSTRUCCION DE BAÑO SEXADO											
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	27,10	3.200,00	86.720		27,10	27,10	100,00%		86.720	86.720
2	Replanteo	m2	27,10	3.100,00	84.010		27,10	27,10	100,00%		84.010	84.010
3	Excavación y carga de cimiento con PBC.	m3	9,00	510.000,00	4.590.000		9,00	9,00	100,00%		4.590.000	4.590.000
4	Encadenados de H° A°	m3	1,90	2.100.000,00	3.990.000		1,90	1,90	100,00%		3.990.000	3.990.000
5	Muros de nivelación de 0.30 mts.	m2	11,00	170.000,00	1.870.000		11,00	11,00	100,00%		1.870.000	1.870.000
6	Relleno y apisonado de interiores	m3	7,20	106.000,00	763.200		7,20	7,20	100,00%		763.200	763.200
7	Aislación asfáltica: De paredes	m2	5,50	68.000,00	374.000		5,50	5,50	100,00%		374.000	374.000

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
Dirección de Obras

Arq. Delia Id
Directora de Obras

OSCAR MOREL OSES	MUNICIPALIDAD DE VILLETA	Fecha de Firma de Contrato:	30/11/2024
INGENIERO CIVIL		Fecha de Orden de Inicio:	10/12/2024
		Fecha de Acta de Medicion:	10/1/2025
	L.P.N. – ID N° 454.587 "CONSTRUCCION PASEO PLAYA MUNICIPAL	PERIODO:	ene-25
oscarmoreloses@gmail.com	CERTIFICADO N° 01	MONTO DE OBRA	2.399.800.000

			CONTRACTUAL			CANTIDADES				MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Total S/ Contrato	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acaumulada	%	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
8	Muros de elevación De 0.15 para revocar	m2	63,00	120.000,00	7.560.000		63,00	63,00	100,00%		7.560.000	7.560.000
9	Muros de elevación De 0.15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	m2	50,64	150.000,00	7.596.000		50,64	50,64	100,00%		7.596.000	7.596.000
10	Muros de elevación Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	15,60	21.500,00	335.400		15,60	15,60	100,00%		335.400	335.400
11	Techo - Fabricación y montaje de estrucura metálica resistente principal de caño 100x60x2 mm cada 1,5m y correas de caño 40x80x180 cada 1,20m.	m2	43,00	245.000,00	10.535.000		43,00	43,00	100,00%		10.535.000	10.535.000
12	Techo- Provisión y colocación de paneles de chapa trapezoidal termo acusticas con nucleo de poliestreno- e=30mm galvalum parte superior y prepintado	m2	43,00	255.000,00	10.965.000		43,00	43,00	100,00%		10.965.000	10.965.000
13	Babetas de chapa galvanizada	m2	18,00	95.000,00	1.710.000		18,00	18,00	100,00%		1.710.000	1.710.000
14	Revoques De paredes interior y exterior a una capa	m2	135,00	32.000,00	4.320.000		135,00	135,00	100,00%		4.320.000	4.320.000
15	Revoques Moldura lineal en balancines	ml	20,40	33.000,00	673.200							
16	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	38,00	39.000,00	1.482.000							
17	Piso mosaíco granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	m2	22,50	135.000,00	3.037.500							
18	Zocalo mosaíco granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	ml	2,60	73.000,00	189.800							
19	Abertura Metalica Puerta tablero de 0.90 x 2.10 marco, contramarco y cerradura	un	1,00	1.500.000,00	1.500.000							
20	Abetura Metalica Puerta Tablero de 0,80*2,10 marco contramarco y cerradura	un	2,00	1.500.000,00	3.000.000							
21	Abertura de Madera Puerta para boxes enchapados en formica	un	4,00	550.000,00	2.200.000							
22	Ventanas balancines	m2	3,17	370.000,00	1.172.900							
23	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	13,50	75.000,00	1.012.500		13,50	13,50	100,00%		1.012.500	1.012.500
24	Rampa peatonal	un	1,00	1.050.000,00	1.050.000		1,00	1,00	100,00%		1.050.000	1.050.000
25	Alfeizar de ventanas De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	18,00	33.000,00	594.000							
26	Pinturas De paredes a la cal- Base para Látex (2 manos y lijado)	m2	63,00	16.000,00	1.008.000							
27	Pinturas De paredes revocadas al latex	m2	63,00	32.000,00	2.016.000							
28	Pinturas De aberturas de madera con barníz sintético	m2	16,20	34.000,00	550.800							
29	Pinturas De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	3,17	33.000,00	104.610							
30	Pinturas De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriçatico y patinal D)	m2	50,64	33.000,00	1.671.120							
31	Pinturas Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	17,50	35.000,00	612.500							
32	Revestimientos De azulejos de 0.15 x 0.15 cm.	m2	82,00	88.000,00	7.216.000							
33	Vidrios dobles de 4 mm.	m2	3,17	200.000,00	634.000							
34	Desague Pluvial Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	17,50	95.000,00	1.662.500							
35	Instalación del tablero TS de 6 AG.	un	2,00	280.000,00	560.000							
36	Alimentación de los circuitos de luces	un	10,00	140.000,00	1.400.000							
37	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	m	25,00	93.000,00	2.325.000							
38	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	un	10,00	106.000,00	1.060.000							

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos

MUNICIPALIDAD DE VILLETA • Dirección de Obras •

Arq. Delia Id
Directora de Obras

OSCAR MOREL OSES	MUNICIPALIDAD DE VILLETA	Fecha de Firma de Contrato:	30/11/2024
INGENIERO CIVIL		Fecha de Orden de Inicio:	10/12/2024
		Fecha de Acta de Medicion:	10/1/2025
	L.P.N. – ID N° 454.587 "CONSTRUCCION PASEO PLAYA MUNICIPAL	PERIODO:	ene-25
oscarmoreloses@gmail.com	CERTIFICADO N° 01	MONTO DE OBRA	2.399.800.000

		CONTRACTUAL				CANTIDADES				MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Total S/ Contrato	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acaumulada	%	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
39	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	un	1,00	335.000,00	335.000							
40	Alimentación de circuito para ducha eléctrica	un	1,00	250.000,00	250.000							
41	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	un	3,00	360.000,00	1.080.000							
42	Instalación sanitaria - Agua corriente - desague clocal - cámara de Inspección y artefactos sanitarios	gl	1,00	13.000.000,00	13.000.000							
43	Cámara Séptica tipo 3 de 1.50 x 3.00	un	1,00	5.950.000,00	5.950.000							
44	Muro de ladrillo de 0,30 según diseño. Con revestido de piedra.	m2	10,80	205.000,00	2.214.000		5,40	5,40	50,00%		1.107.000	1.107.000
45	Limpieza final	gl	1,00	3.592.340,00	3.592.340							
	Grupo 6 - COSNTRUCCION DE 3 PORTICO DE ACCESO											
1	Muros de elevación: De 0.30 visto a dos cara de ladrillo prensados macizos	m2	81,00	205.000,00	16.605.000		27,00	27,00	33,33%		5.535.000	5.535.000
2	Letras Corporeas de chapa de 4 mm cortada a laser pintada con pintura sintética.	Un	63,00	670.000,00	42.210.000							
3	Montaje de Estructura Metalica con tubos redondos de 4" 2mm por trama de 2,5*2,5*1,20mm según diseño	Un	3,00	7.500.000,00	22.500.000							
4	Sistema de iluminación led en muro	Un	3,00	700.000,00	2.100.000							
	Grupo 7 - CONSTRUCCION DE RAMPA DE H° A°											
1	Muros de elevación: De 0.30 visto a dos cara de ladrillo prensados macizos	m2	9,00	205.000,00	1.845.000							
2	Construcción de Rampa de H°A°	m3	21,00	2.520.000,00	52.920.000		7,00	7,00	33,33%		17.640.000	17.640.000
3	Provision y Colacion de Baranda metálica de 3 barras cilíndricas	m2	120,00	350.000,00	42.000.000							
4	Provision y Colacion de letras corporeas, rueda de la industria de cuerpo de chapa n° 18 y laterales n° 20, caño estructural de soporte n° 3/16 cortada a lacer, cantidad de letras 7 , según diseño	Un	1,00	25.000.000,00	25.000.000							
5	Sistema de iluminación con Reflectores tipo Led	Un	1,00	4.850.000,00	4.850.000							
	Grupo 8 - PROVISION Y COLOCACION DE BANQUETAS											
1	Banquetas rectas de H°A° FCK 180kg/cm2 incluye respaldero en caño metálico puesto en obra	Un	50,00	1.800.000,00	90.000.000							
	Grupo 9 - CARTEL DE OBRA											
1	Cartel de Obra	Un	2,00	1.400.000,00	2.800.000		2,00	2,00	100,00%		2.800.000	2.800.000
	TOTAL CERTIFICADO				2.399.800.000						278.225.230	278.225.230

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
Dirección de Obras

Arq. Delia Id
Directora de Obras

FOTOS PASEO PLAYA MUNICIPAL DE VILLETA

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Arq. Delia Id
Directora de Obras

FOTOS PASEO PLAYA MUNICIPAL DE VILLETA

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Arq. Delia Id
Directora de Obras

FOTOS PASEO PLAYA MUNICIPAL DE VILLETA

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Arq. Delia Id
Directora de Obras

FOTOS PASEO PLAYA MUNICIPAL DE VILLETA

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Arq. Delia Id
Directora de Obras

FOTOS PASEO PLAYA MUNICIPAL DE VILLETA

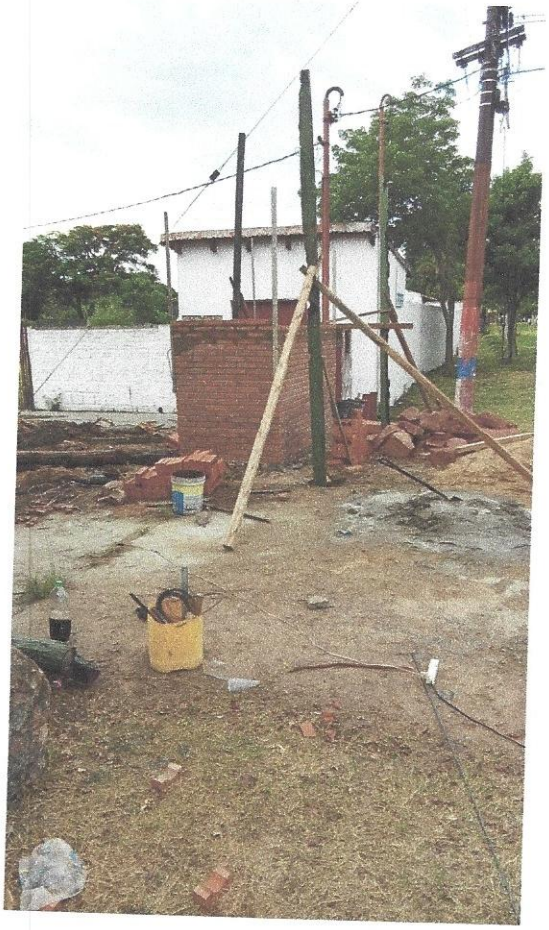

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Arq. Delia Id
Directora de Obras

FOTOS PASEO PLAYA MUNICIPAL DE VILLETA

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Arq. Delia Id
Directora de Obras

FOTOS PASEO PLAYA MUNICIPAL DE VILLETA

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Arq. Delia Id
Directora de Obras

FOTOS PASEO PLAYA MUNICIPAL DE VILLETA

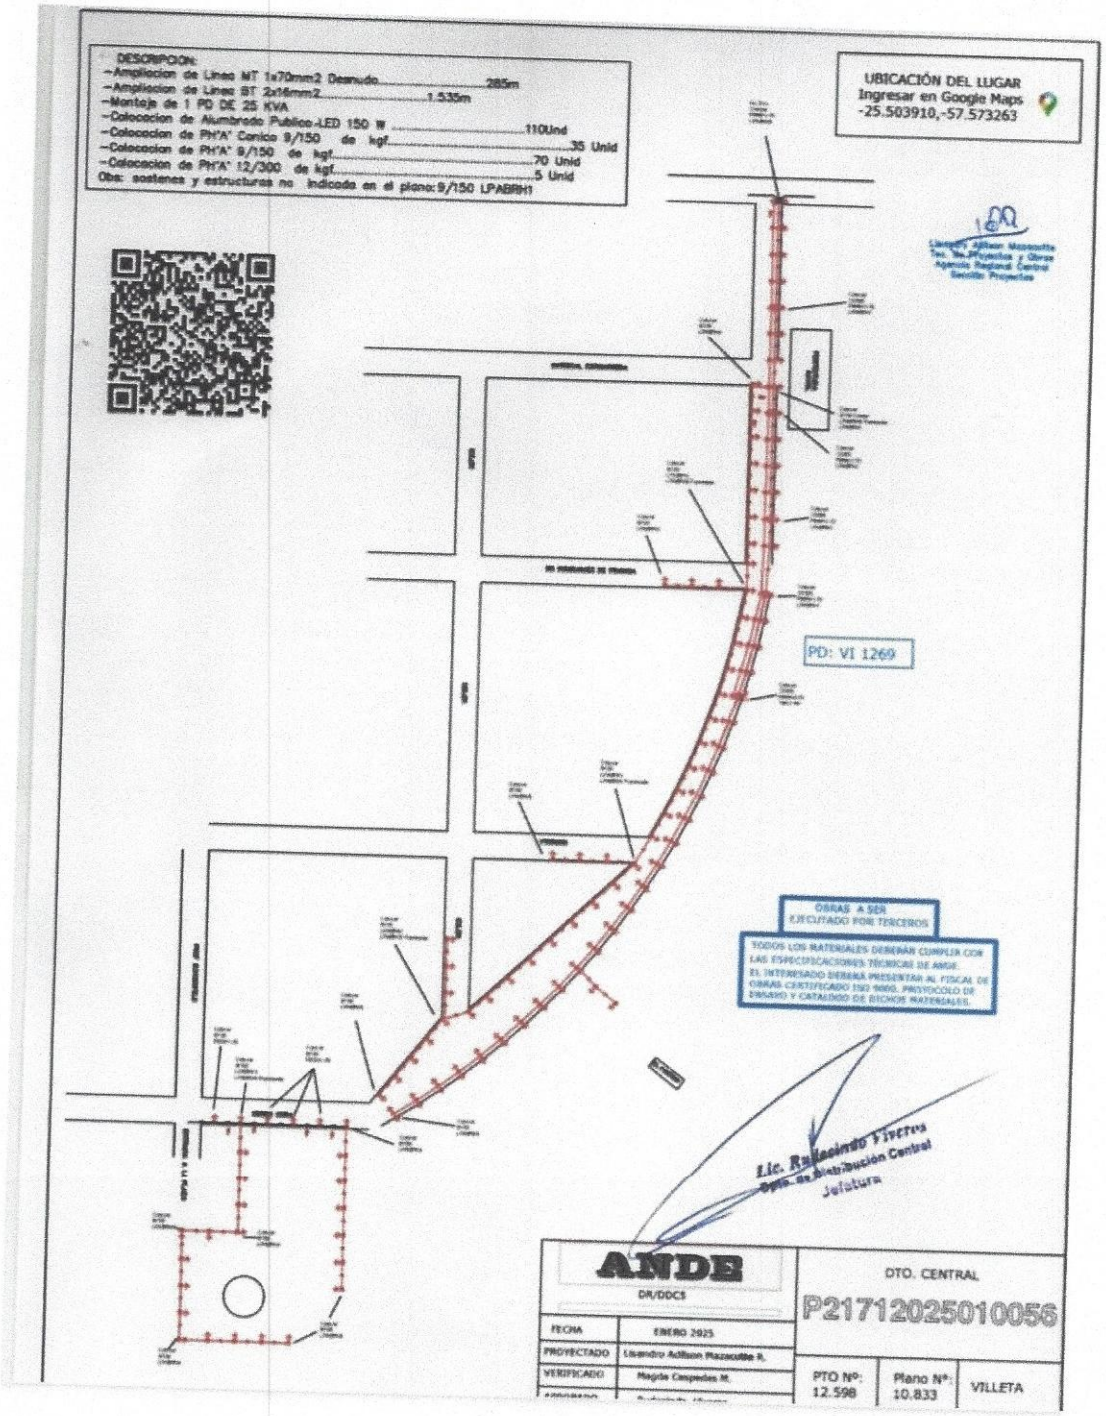

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

FOTOS PASEO PLAYA MUNICIPAL DE VILLETA

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

Arq. Delia Id
Directora de Obras
