GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 08

Mes: Junio 2025

Licitación Publica Nacional N° 15/2024 - Construcción de puentes en los Distritos de Itapúa Poty, Cambyreta - Encarnación, Edelira, Capitán Miranda - Ad Referéndum – Plurianual - ID 452.536.

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	**LOTE N° 3** - Lote 3 - Construcción de puente sobre el Arroyo Itangu´a - Barrio Pioneros - Distrito de Capitán Miranda	100,00%	723.348.292	93,98%	679.733.292	4,79%	34.665.000	98,77%	714.398.292
A	**Total por Contrato**	**100,00%**	**723.348.292**	**93,98%**	**679.733.292**	**4,79%**	**34.665.000**	**98,77%**	**714.398.292**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	144.669.658	135.946.658	6.933.000	142.879.658
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**144.669.658**	**135.946.658**	**6.933.000**	**142.879.658**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				27.732.000	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**27.732.000**	

SON GUARANIES: Veintisiete millones setecientos treinta y dos mil.

Certificado Básico Nº 08

Mes: Junio 2025

Contrato N°: 37/2024

Monto Básico: 723.348.292 gs

Contratista: Itinera S.A. - Ing. Juan F. Canatta Ruiz

Fecha de Inicio: 15/Noviembre/2024

Plazo de Ejecución: 210 dias

Prórrogas: 51 días

Fecha de Terminación: 03/Agosto/2025

Poliza Anticipo - Vigencia hasta: 10/08/2025

Poliza Ejec. Contrato - Vigencia hasta: 10/12/2025

Secretaría de Obras Públicas y Transporte - Gobierno Departamental Itapúa

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Publicas
Gobernación de Itapúa

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
Contratista

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

Gobernación Departamental de Itapúa - Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 08
PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

Licitación Publica Nacional N° 15/2024 - Construcción de puentes en los Distritos de Itapúa Poty, Cambyreta - Encarnación, Edelira, Capitán Miranda - Ad Referéndum – Plurianual - ID 452.536.

CONTRATISTA: Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	**CONTRATO N°:** 37/2024
MONTO DE LA OFERTA: 723.348.292 gs	**PLAZO:** 210 dias
	PRÓRROGAS: 51 días
LOTE N°: 3	**FECHA DE MEDICIÓN:** 08/07/2025

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN N° 08						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 08					
Lote 3 - Construcción de puente sobre el Arroyo Itangu´a-Barrio Pioneros- Distrito de Capitán Miranda				ITINERA S.A.			EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	"Movilización (Despeje e instalación de campamento, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad Medida Global	1,00	27.000.000	27.000.000	0,037	100%	0%	100%	0,04	0,00	0,04	1,00	0	1,00	27.000.000	0	27.000.000
2	"Excavación de Suelo No clasificada	Metros cúbicos	220,00	48.300	10.626.000	0,015	100%	0%	100%	0,01	0,00	0,01	220,00	0	220	10.626.000	0	10.626.000
3	"Excavación en Roca - Empleo de compresores y martilletes si sea necesario	Metros cúbicos	20,24	575.300	11.644.072	0,016	100%	0,00%	100%	0,02	0,00	0,02	20,24	0,00	20,24	11.644.072	0	11.644.072
4	Hormigon de regularizacion para base de estribos fck 250kg/cm2	Metros cúbicos	23,44	1.608.000	37.695.000	0,052	100%	0,00%	100,00%	0,05	0,00	0,05	23,44	0,00	23,44	37.695.000	0	37.695.000
5	Anclaje en roca con varillas de 25mm de diámetro longitud 3m, relleno con lechada de cemento y arena	Unidad	30,00	342.500	10.275.000	0,014	100%	0%	100%	0,01	0,00	0,01	30,00	0,00	30,00	10.275.000	0	10.275.000
6	Estribos cerrados de H°A° con losa de aproximación (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	105,45	3.456.000	364.436.520	0,504	90%	9,51%	100,00%	0,46	0,05	0,50	95,42	10,03	105,45	329.771.520	34.665.000	364.436.520
7	Baranda de H° A° - prefabricada	Metro lineal	20,00	790.000	15.800.000	0,022	100%	0%	100%	0,02	0,00	0,02	20,00	0	20	15.800.000	0	15.800.000
8	Veredas de H°A° prefabricadas	Metro lineal	20,00	399.000	7.980.000	0,011	100%	0%	100%	0,01	0,00	0,01	20,00	0	20	7.980.000	0	7.980.000
9	"Losa de H° A° e: 14 cm. (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	16,81	3.300.000	55.473.000	0,077	100%	0%	100%	0,08	0,00	0,08	16,81	0	17	55.473.000	0	55.473.000
10	Capa de desgaste según plano H° 250kg/cm2	Metros cúbicos	4,80	1.825.500	8.762.400	0,012	100%	0%	100%	0,01	0,00	0,01	4,80	0	5	8.762.400	0	8.762.400
11	"Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	11,62	5.995.000	69.661.900	0,096	100%	0%	100,00%	0,10	0,00	0,10	11,62	0,00	11,62	69.661.900	0	69.661.900
12	"Vigas Transversales (VT) in situ (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	2,60	3.922.000	10.197.200	0,014	100%	0%	100%	0,01	0,00	0,01	2,60	0	3	10.197.200	0	10.197.200
13	"Losetas de HºAº Prefabricadas 2,10x0,36 (espesor 8 cm)	Unidad	66,00	290.000	19.140.000	0,026	100%	0%	100%	0,03	0,00	0,03	66,00	0	66	19.140.000	0	19.140.000
14	"Losetas de HºAº Prefabricadas 1,10x0,36 (espesor 8 cm)	Unidad	44,00	158.000	6.952.000	0,010	100%	0%	100%	0,01	0,00	0,01	44,00	0	44	6.952.000	0	6.952.000

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA Fiscalización de Obras

Ing. Agustin Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

15	Apoyos Neoprenos s/planos (incluye altar de H°A°)	Unidad	8,00	2.570.000	20.560.000	0,028	100%	0%	100%	0,03	0,00	0,03	8,00	0	8	20.560.000	0	20.560.000
16	"Juntas de dilatación	Metros	20,00	1.220.000	24.400.000	0,034	100%	0%	100%	0,03	0,00	0,03	20,00	0	20	24.400.000	0	24.400.000
17	"Drenaje detrás de muros	Metros cúbicos	31,00	299.200	9.275.200	0,013	100%	0%	100%	0,01	0,00	0,01	31,00	0	31	9.275.200	0	9.275.200
18	"Empastado de Taludes	Metros cuadrados	250,00	15.800	3.950.000	0,005	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	-	0	0	0	0	0
19	Mensulas de H°A° fck 250kg/cm2	Unidad	8,00	565.000	4.520.000	0,006	100%	0%	100%	0,01	0,00	0,01	8,00	0	8	4.520.000	0	4.520.000
20	"Señalización Vertical del puente	Metros cuadrados	2,00	1.120.000	2.240.000	0,003	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	-	0	0	0	0	0
21	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	200,00	13.800	2.760.000	0,004	0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	-	0	0	0	0	0
Precio Total					**723.348.292**	**100%**				**93,98%**	**4,79%**	**98,77%**				**679.733.292**	**34.665.000**	**714.398.292**

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
Contratista

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

GOBERNACIÓN DEPARTA...
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 08

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

Licitación Publica Nacional N° 15/2024 - Construcción de puentes en los Distritos de Itapúa Poty, Cambyreta - Encarnación, Edelira, Capitán Miranda - Ad Referéndum – Plurianual - ID 452.536.

CONTRATISTA: Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz	**CONTRATO N°:** 37/2024
MONTO DE LA OFERTA: 723.348.292 gs	**PLAZO:** 210 dias
	PRÓRROGAS: 51 días
LOTE N°: 3	**FECHA DE MEDICIÓN:** 08/07/2025

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						PLAZO DE EJECUCIÓN: 210 dias								TOTAL
Lote 3 - Construcción de puente sobre el Arroyo Itangu´a-Barrio Pioneros- Distrito de Capitán Miranda				ITINERA S.A.		Noviembre 15/11/2024	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO 13/06/2025	
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total									
1	"Movilización (Despeje e instalación de campamento, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad Medida Global	1,00	27.000.000	27.000.000	27.000.000								100%
2	"Excavación de Suelo No clasificada	Metros cúbicos	220,00	48.300	10.626.000	10.626.000								100%
3	"Excavación en Roca - Empleo de compresores y martilletes si sea necesario	Metros cúbicos	20,24	575.300	11.644.072	5.822.036	5.822.036							100%
4	Hormigon de regularizacion para base de estribos fck 250kg/cm2	Metros cúbicos	45,00	1.608.000	72.360.000		72.360.000							100%
5	Anclaje en roca con varillas de 25mm de diámetro longitud 3m, relleno con lechada de cemento y arena	Unidad	30,00	342.500	10.275.000		10.275.000							100%
6	Estribos cerrados de H°A° con losa de aproximación (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	95,42	3.456.000	329.771.520			164.885.760	164.885.760					100%
7	Baranda de H° A° - prefabricada	Metro lineal	20,00	790.000	15.800.000						15.800.000			100%
8	Veredas de H°A° prefabricadas	Metro lineal	20,00	399.000	7.980.000							7.980.000		100%
9	"Losa de H° A° e: 14 cm. (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	16,81	3.300.000	55.473.000						55.473.000			100%
10	Capa de desgaste según plano H° 250kg/cm2	Metros cúbicos	4,80	1.825.500	8.762.400							8.762.400		100%
11	"Vigas Longitudinales (VL) prefabricadas in situ (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	11,62	5.995.000	69.661.900					69.661.900				100%
12	"Vigas Transversales (VT) in situ (fck: 250 kg/cm2)	Metros cúbicos	2,60	3.922.000	10.197.200				10.197.200					100%
13	"Losetas de HºAº Prefabricadas 2,10x0,36 (espesor 8 cm)	Unidad	66,00	290.000	19.140.000					19.140.000				100%
14	"Losetas de HºAº Prefabricadas 1,10x0,36 (espesor 8 cm)	Unidad	44,00	158.000	6.952.000					6.952.000				100%
15	Apoyos Neoprenos s/planos (incluye altar de H°A°)	Unidad	8,00	2.570.000	20.560.000					20.560.000				100%
16	"Juntas de dilatación	Metros	20,00	1.220.000	24.400.000						24.400.000			100%
17	"Drenaje detrás de muros	Metros cúbicos	31,00	299.200	9.275.200							9.275.200		100%

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA Fiscalización de Obras

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

6

18	"Empastado de Taludes	Metros cuadrados	250,00	15.800	3.950.000									100%
19	Mensulas de H°A° fck 250kg/cm2	Unidad	8,00	565.000	4.520.000			4.520.000					3.950.000	100%
20	"Señalización Vertical del puente	Metros cuadrados	2,00	1.120.000	2.240.000								2240000	100%
21	Limpieza final de obra	Metros cuadrados	200,00	13.800	2.760.000								2760000	100%
	Precio Total				**723.348.292**									

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES	43.448.036	88.457.036	169.405.760	175.082.960	116.313.900	95.673.000	26.017.600	8.950.000	**723.348.292**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE	6,01%	12,23%	23,42%	24,20%	16,08%	13,23%	3,60%	1,24%	**100,00%**

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
Contratista
Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Ing. Agustin Y
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 08

Licitación Publica Nacional N° 15/2024 - Construcción de puentes en los Distritos de Itapúa Poty, Cambyreta - Encarnación, Edelira, Capitán Miranda - Ad Referéndum – Plurianual - ID 452.536. - Lote N° 3

Contrato N°: 37/2024	**Inicio de Obra:** 15/Noviembre/2024
Monto del Contrato: 723.348.292 gs	**Term. Prevista:** 13/Junio/2025
Plazo Contractual: 210 dias	**Prorrogas:** 51 días
	Terminación prevista con prórrogas: 03/08/2025
Lote N°: 3	**Mes:** Junio 2025

CUADRO DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

Contrato N°: 37/2024

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
NOVIEMBRE	43.448.036	43.448.036	43.448.036	43.448.036	6,01%	6,01%	6,01%	6,01%
DICIEMBRE	88.457.036	131.905.072	129.589.375	173.037.411	12,23%	18,24%	17,92%	23,93%
ENERO	169.405.760	301.310.832	84.982.121	258.019.532	23,42%	41,66%	11,75%	35,68%
FEBRERO	175.082.960	476.393.792	179.441.345	437.460.877	24,20%	65,86%	24,81%	60,49%
MARZO	116.313.900	592.707.692	103.765.015	541.225.892	16,08%	81,94%	14,35%	74,84%
ABRIL	95.673.000	688.380.692	118.407.400	659.633.292	13,23%	95,17%	16,37%	91,21%
MAYO	26.017.600	714.398.292	20.100.000	679.733.292	3,60%	98,76%	2,78%	93,98%
JUNIO	8.950.000	723.348.292	8.950.000	688.683.292	1,24%	100,00%	4,79%	98,77%
JULIO		723.348.292				100,00%		

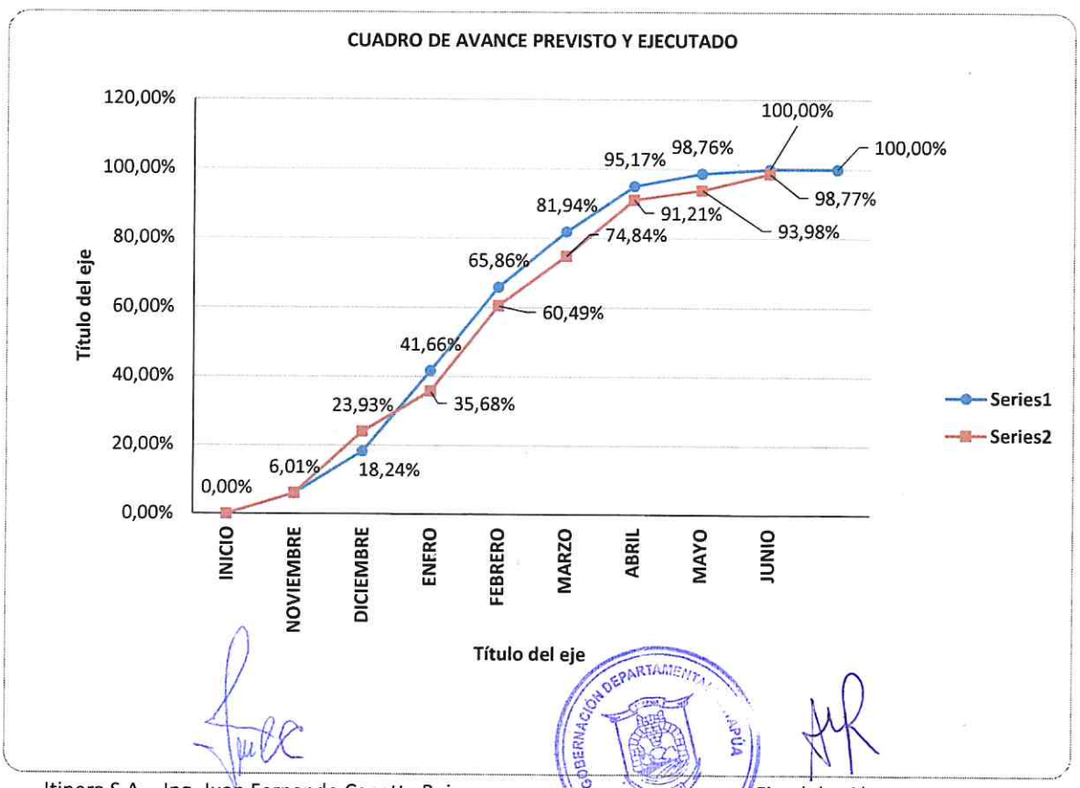

Itinera S.A. - Ing. Juan Fernando Canatta Ruiz
CONTRATISTA

Ing. Juan Fernando Canatta
Representante Legal
Itinera S.A.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa
