GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 01

Mes: ENERO

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 34/23 - "Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo - Distrito de Encarnación - Plurianual" ID N° 437.017

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	% Avance de Obra	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 34/23 - "Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo - Distrito de Encarnación - Plurianual" ID N° 437.017	100,00%	164.408.033	0,00%	0	18,98%	31.205.572	18,98%	31.205.572
A	Total por Contrato	100,00%	164.408.033	0,00%	0	18,98%	31.205.572	18,98%	31.205.572

B	Deducciones a la fecha			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	20,00%	32.881.607	0	6.241.114	6.241.114
B.II	Para Fondo de Reparo	0,00%	0	0	0	0
B	Total Deducciones		32.881.607	0	6.241.114	6.241.114
C.I	Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				24.964.457	
C.II	Multas				0	
C	Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				24.964.457	

Certificado Básico Nº	**01**
Mes: ENERO	
Contrato N°:	34/23
Monto Básico:	₲ 164.408.033
Contratista:	Impacto Constructora -Noelia Ledesma
Fecha de Inicio:	18-dic-23
Plazo de Ejecución:	90 días
Fecha de Terminación:	17-mar-24
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.

SON GUARANIES: Veinte y cuatro millones novecientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete.

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
Contratista
IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 34/23 - "Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo - Distrito de Encarnación - Plurianual" ID N° 437.017

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	18-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 164.408.033	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	34/23	**PRÓRROGA:**	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	**FECHA DE TERMINACION CON PRÓRROGA:**	

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							PLANILLA DE MEDICIÓN N° 01						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 01					
Items del llamado Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo ? Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 437017				IMPACTO CONSTRUCTORA		Incidencia del Rubro sobre el Total	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Construcción de empedrado - Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.394	34.116	81.673.704	0,497	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
2	Colocacion de hormigon armado - Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A= 0,075 m2)	Metro lineal	684	74.404	50.892.336	0,310	0	60	60	0	0,186	0,186	0	410,4	410,4	-	30.535.402	30.535.402
3	Colocacion de hormigon armado -PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	19,9	1.279.705	25.466.130	0,155	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
4	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metro lineal	35	47.287	1.655.045	0,010	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
5	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	223.390	670.170	0,004	0	100	100	0	0,004	0,004	0	3	3	-	670.170	670.170
6	Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.394	1.692	4.050.648	0,025	0	0	0	0	0,000	0,000	0	0	0	-	-	-
					164.408.033	100%				0%	18,98%	18,98%				0	31.205.572	31.205.572

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO
CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Secretaria de Obras Publicas y Transporte

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

Mes: ENERO

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 34/23 - "Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo - Distrito de Encarnación - Plurianual" ID N° 437.017

Contrato N°:	34/23		
Monto del Contrato:	₲ 164.408.033	**Term. Prevista:**	17-mar-24
Plazo Contractual:	90 dias	**Ampliaciones:**	
Inicio de Obra:	18-dic-23	**Fecha de terminación con prórroga:**	

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 32/23

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
enero	31.205.572	31.205.572	31.205.572	31.205.572	18,98%	18,98%	18,98%	18,98%
febrero	127.496.768	158.702.340			77,55%	96,53%		
marzo	5.705.693	164.408.033			3,47%	100,00%		

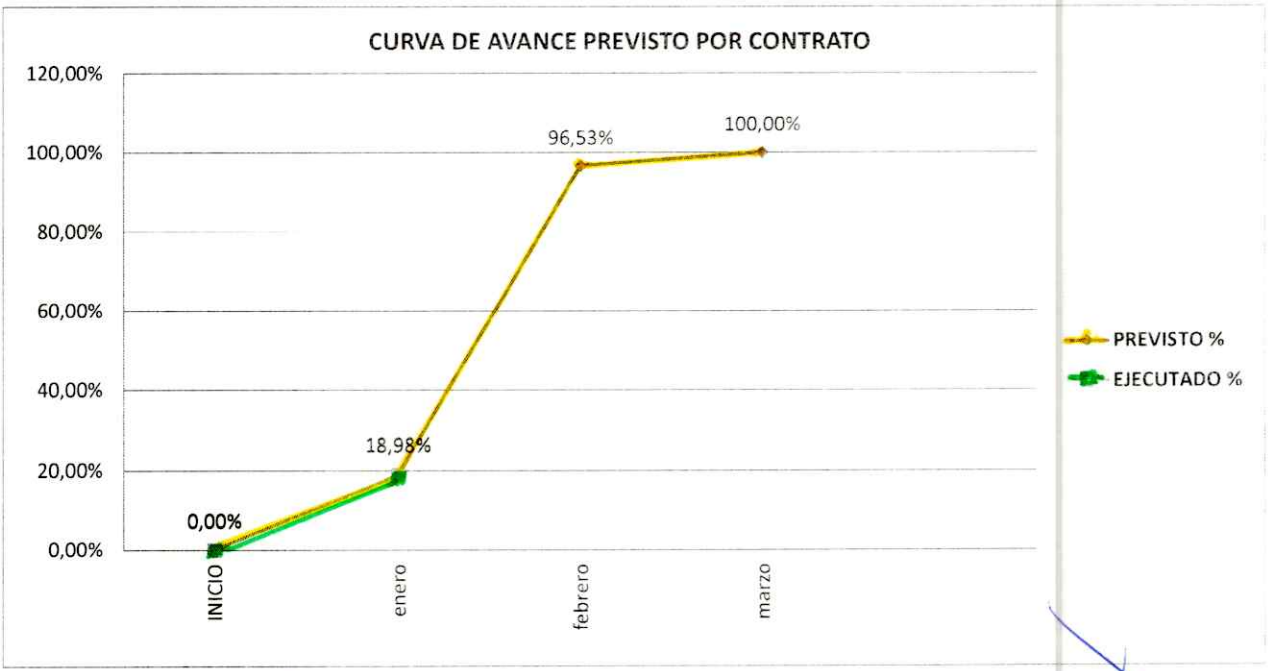

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA

IMPACTO
CONSTRUCTORA
RUC: 3005414-1

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de
Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 01

CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

Mes: ENERO

LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA CONTRATO N° 34/23 - "Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación **empedrado** existente Colegio Domingo Robledo - Distrito de Encarnación - Plurianual" ID N° 437.017

CONTRATISTA: Impacto Constructora - Lic. Noelia Ledesma Ocampos		**FECHA DE INICIO:**	15-dic-23
MONTO DE LA OFERTA:	₲ 164.408.033	**FECHA DE TERMINACION PREVISTA:**	17-mar-24
CONTRATO N°:	34/23	**PRÓRROGA:**	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 días	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

Items del llamado Construcción de Pavimento tipo Empedrado calle sin nombre, continuación empedrado existente Colegio Domingo Robledo ? Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 437017				IMPACTO CONSTRUCTORA - Noelia Ledesma		PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 días			TOTAL
Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ENERO	FEBRERO	MARZO	
1	Construcción de empedrado - Pavimento: Tipo Empedrado	Metros cuadrados	2.394	34.116	81.673.704	-	81.673.704		100%
2	Colocacion de hormigon armado - Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 (A= 0,075 m2)	Metro lineal	684	74.404	50.892.336	30.535.402	20.356.934		100%
3	Colocacion de hormigon armado -PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	Metros cúbicos	19,9	1.279.705	25.466.130	-	25.466.130		100%
4	Colocacion de hormigon armado - Cordón escondido de 15x30cm de hormigón (fck= 180 kg/cm2).	Metro lineal	35	47.287	1.655.045			1.655.045	100%
5	Señalización de obra	Metros cuadrados	3	223.390	670.170	670.170			100%
6	Limpieza de obra	Metros cuadrados	2.394	1.692	4.050.648			4.050.648	100%
					164.408.033				

PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES - POR CONTRATO	31.205.572	127.496.768	5.705.693	164.408.033
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE - POR CONTRATO	18,98%	77,55%	3,47%	100,00%

Lic. Noelia Ledesma Ocampos
CONTRATISTA
IMPACTO CONSTRUCTORA
RUC: 3005411-1

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

FISCALIZACIÓN DE OBRAS
INFORME DE CERTIFICADO Nº01 – MES DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024

SOLICITANTE: Barrio Santo Domingo
OBRA: Construcción de 342,00 m de pavimento pétreo tipo empedrado continuación Colegio Domingo Robledo en el Barrio Santo Domingo.

UBICACIÓN: Barrio Santo Domingo	**DISTRITO:** Encarnación	**COORDENADAS UTM:** 603443 - 6985631	**MONTO DE LA OBRA:** 164.408.033 gs.
EMPRESA CONTRATISTA: Impacto constructora – Noelia Ledezma	**Nº DE TELÉFONO:** 0985-171-856 – Noelia Ledezma	**Nº CONTRATO / ID:** 34/2023 / 437.017	**FECHA DE INICIO:** 18/12/23
MODALIDAD / LOTE: LCD Nº 44/2023 / Lote: único	**PLAZO CONTRACTUAL:** 90 DÍAS CALENDARIO	**TERMINACIÓN PREVISTA:** 17/03/24	**PRÓRROGA:** - **TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:** -

FECHA DE VISITA: 25 de enero 2024
AVANCE DE OBRA: 18,98%

OBSERVACIONES GENERALES:
La obra se encuentra con buen avance, dentro del plazo de ejecución cumpliendo con el avance previsto.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA:

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA – Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Publicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
