PUNTAL CONSTRUCCIONES | CALDETEC INGENIERIA S.R.L.

CONSORCIO PC

Asunción, 05 de setiembre de 2023.

Ing. Félix Eladio Sosa

Administración Nacional de Electricidad- ANDE

Presidente

Presente.

Referencia: LPN N° 1573/ 2020 EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PBC Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCION EN EL COMPLEJO LAURELTY - SAN LORENZO ID N° 377.327

Atención: Dpto. de Obras Civiles de Transmisión e Infraestructura

Nos dirigimos a usted en el marco del contrato de referencia con el fin de presentar el certificado N° 11 de la obra de referencia y por su intermedio solicitar el pago respectivo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarles muy atentamente.

CONSORCIO PC

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

Ing. Luis R. Bóveda Samaniego

Representante legal

CONSORCIO PC Construccion de Proyectos de Servicios Publicos Sargento Cespedes 372 esq. Scramento - BO. Trinidad Tel 021 -290 225 Asunción - Paraguay	**LIQUIDACION PROFORMA** **TIMBRADO No.** **RUC.:80112949-4** **FACTURA** **No. 001-001-0000000**

Fecha de Emisión: 05 de setiembre de 2023 — Condicion de Venta: Crédito

SEÑORES : ANDE — R.U.C. N° : 80009735-1

DIRECCION : Avda.España 1268 esq. Padre Cardozo y de las Residentas

ARTICULO CODIGO	CANTIDAD	Clase de Mercaderia / Servicio	VENTAS	
			EXENTAS	GRAVADAS
		Certificado No. 11 de la obra:EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO D EPBC Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRICUCION EN EL COMPLEJO LAURELTY - SAN LORENZO Contrato No. 8488/2021 Monto de los trabajos del mes: 788.462.716 Devolución Anticipo 5%: 39.423.136 **Sub Total Factura** **749.039.580**		749.039.580
SUB TOTALES		TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES		**749.039.580**
LIQUIDADCION DEL IVA (5%)		(10 %) 68.094.507	TOTAL IVA	68.094.507

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TECNICA

ACTA DE MEDICIÓN Nº 11

L.P.N. Nº 1573/2020. "Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo."

CONTRATO Nº 8488/2021
CONTRATISTA: **CONSORCIO PC** (PUNTAL CONSTRUCCIONES - CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.)
CORRESPONDE AL MES: AGOSTO/2023 FECHA: 30/08/2023

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD			CANTIDADES MEDIDAS			AVANCE (%)			OBSERVACIONES
		UN	Contrato	Real	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	
12	Excavación	Metros cúbicos	400	400,00	200,00	200,00	400,00	50,00	50,00	100,00	
14	Estructura de H°A° - Zapata (incluye hormigón de regularización, relleno, eliminación de material sobrante y todo lo necesario conforme a las EETT)	Metros cúbicos	120	110,00	48,00	62,00	110,00	40,00	51,67	91,67	
15	Estructura de H°A° - Fuste	Metros cúbicos	7	7,00	-	7,00	7,00	-	100,00	100,00	
16	Estructura de H°A° - Viga de Fundación	Metros cúbicos	76	65,39	-	65,39	65,39	-	86,04	86,04	
17	Estructura de H°A° - Pilar a la vista	Metros cúbicos	18	9,00	-	9,00	9,00	-	50,00	50,00	
168	Estructura de H°A° - Plataforma de Hormigón Armado 210 - Losa base, h=20 cm (Incluye canaletas y registros colectores de derrames, murete de seguridad y rampa de acceso, juntas de dilatación y contracción)	Metros cúbicos	350	307,50	280,00	27,50	307,50	80,00	7,86	87,86	
186	Piso Cerámico,para alto tránsito (previa carpeta de mortero para colocación), para baños y oficinas.	Metros cuadrados	340	170,00	-	170,00	170,00	-	50,00	50,00	
187	Zócalo cerámico similar al piso	Metro lineal	165	50,00	-	50,00	50,00	-	30,30	30,30	
191	Azulejo cerámico esmaltado	Metros cuadrados	223	112,00	-	112,00	112,00	-	50,22	50,22	
215	Provisión e instalación de Sistema de tratamiento (incluye todas las cañerías, codos, conexiones, llaves de paso, griferías y accesorios)- Según planos y detalles	Unidad	1	0,35	-	0,35	0,35	-	35,00	35,00	
247	Provisión e instalación de Alimentación a Tableros eléctricos(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	Unidad	1	0,70	0,45	0,25	0,70	45,00	25,00	70,00	
248	Provisión e instalación de cajas con elementos de protección de circuitos(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	Unidad	1	0,70	0,45	0,25	0,70	45,00	25,00	70,00	
249	Provisión e instalación de cajas con elementos de alimentación a circuitos eléctricos(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	Unidad	1	0,70	0,45	0,25	0,70	45,00	25,00	70,00	
250	Provisión e instalación de mecanismo de encendido y tomas(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	Unidad	1	0,70	0,30	0,40	0,70	30,00	40,00	70,00	
287	Provisión e instalación de Aire comprimido (Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	Unidad	1	0,30	0,10	0,20	0,30	10,00	20,00	30,00	
288	Provisión e instalación de Sistema de CCTV (Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	Unidad	1	0,40	0,10	0,30	0,40	10,00	30,00	40,00	

CONSORCIO PC
ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal
Firma CONTRATISTA
Fecha:

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1
Firma ANDE

ANDE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELEC)DAD
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES DE TRANSMISIÓN E INFRAESTRUCTURA
DIVISION DE SUPERVISION DE GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN
GERENCIA TECNICA

CERTIFICADO Nº 11

L.P.N. Nº 1573/2020. "Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo."
CONTRATO Nº 8488/2021
CONTRATISTA: CONSORCIO PC (PUNTAL CONSTRUCCIONES - CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.)
CORRESPONDE AL MES: AGOSTO/2023 FECHA: 30/08/2023

ITEM	DESCRIPCION	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDADES MEDIDAS				MONTOS EN GUARANIES			MONTOS TOTALES CONTRATO
				Previsto Contrato	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Mes	Acumulado Actual	
12	Excavación	Metros cúbicos	40.100	400	200,00	200,00	400,00	8.020.000	8.020.000	16.040.000	16.040.000
14	Estructura de H°A° - Zapata (incluye hormigón de regularización, relleno, eliminación de material sobrante y todo lo necesario conforme a las EETT)	Metros cúbicos	1.610.800	120	48,00	62,00	110,00	77.318.400	99.869.600	177.188.000	193.296.000
15	Estructura de H°A° - Fuste	Metros cúbicos	2.806.700	7	-	7,00	7,00	-	19.646.900	19.646.900	19.646.900
16	Estructura de H°A° - Viga de Fundación	Metros cúbicos	1.857.900	76	-	65,39	65,39	-	121.488.081	121.488.081	141.200.400
17	Estructura de H°A° - Pilar a la vista	Metros cúbicos	2.806.700	18	-	9,00	9,00	-	25.260.300	25.260.300	50.520.600
168	Estructura de H°A° - Plataforma de Hormigón Armado 210 - Losa base, h=20 cm (incluye canaletas y registros colectores de derrames, murete de seguridad y rampa de acceso, juntas de dilatación y contracción)	Metros cúbicos	446.600	350	280,00	27,50	307,50	125.048.000	12.281.500	137.329.500	156.310.000
186	Piso Cerámico,para alto tránsito (previa carpeta de mortero para colocación), para baños y oficinas.	Metros cuadrados	83.400	340	-	170,00	170,00	-	14.178.000	14.178.000	28.356.000
187	Zócalo cerámico similar al piso	Metro lineal	22.100	165	-	50,00	50,00	-	1.105.000	1.105.000	3.646.500
191	Azulejo cerámico esmaltado	Metros cuadrados	88.600	223	-	112,00	112,00	-	9.923.200	9.923.200	19.757.800
215	Provisión e instalación de Sistema de tratamiento (incluye todas las cañerías, codos, conexiones, llaves de paso, grifería y accesorios)- Según planos y detalles	Unidad	556.086.600	1	-	0,35	0,35	-	194.630.310	194.630.310	556.086.600
247	Provisión e instalación de Alimentación a Tableros eléctricos(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	Unidad	245.172.300	1	0,45	0,25	0,70	110.327.535	61.293.075	171.620.610	245.172.300
248	Provisión e instalación de cajas con elementos de protección de circuitos(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	Unidad	118.641.700	1	0,45	0,25	0,70	53.388.765	29.660.425	83.049.190	118.641.700
249	Provisión e instalación de cajas con elementos de alimentación a circuitos eléctricos(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	Unidad	510.246.100	1	0,45	0,25	0,70	229.610.745	127.561.525	357.172.270	510.246.100
250	Provisión e instalación de mecanismo de encendido y tomas(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	Unidad	54.900.000	1	0,30	0,40	0,70	16.470.000	21.960.000	38.430.000	54.900.000
287	Provisión e instalación de Aire comprimido (Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	Unidad	5.861.100	1	0,10	0,20	0,30	586.110	1.172.220	1.758.330	5.861.100
288	Provisión e instalación de Sistema de CCTV (Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	Unidad	134.708.600	1	0,10	0,30	0,40	13.470.860	40.412.580	53.883.440	134.708.600
											-
							TOTAL GENERAL	6.244.417.170	788.462.716	7.032.879.886	11.444.714.616

Son Guaraníes: Setecientos ochenta y ocho millones Cuatrocientos sesenta y dos mil setecientos dieciseis.(IVA Incluído)

CONSORCIO PC

ING. LUIS ROVEDA
Departamento Legal

Firma CONTRATISTA
Fecha:

Ing. Oscar Medina J.
Jefe Dpto. de Obras Civiles
de Transmisión e Infraestructura

Firma ANDE
Fecha:

Contenido

(conforme al Numeral 23, literal (b) de las Condiciones Contractuales del PBC). El Informe deberá presentarse en tamaño oficio, debidamente encarpetado o encuadernado, suscrito en cada hoja por el Representante de la firma Contratista, con el sello de la empresa

1.- Evaluación general de los ítems ejecutados en el Certificado respectivo (dificultades, imprevistos, acciones y rectificaciones implementadas para solucionar los inconvenientes, etc.).

2.- Descripción de las medidas de seguridad, higiene y ambientales adoptadas en el mes certificado en relación a los ítems ejecutados.

.- Cronograma de suministros previstos y utilizados.

4.- Cuadro comparativo de recursos humanos previstos y utilizados.

5.- Fotografías nítidas y fechadas de los trabajos ejecutados, tamaños mínimos aproximados de 8x10cm, con una breve descripción de cada foto o con flechas indicativas, en cantidad mínima de seis (6) y máxima de doce (12).

1.- Evaluación general de los ítems ejecutados en el Certificado respectivo (dificultades, imprevistos, acciones y rectificaciones implementadas para solucionar los inconvenientes, etc.).

(describir por Localidad)

Localidad	Dificultades	Imprevistos	Acciones y rectificaciones implementadas/Observaciones
SE- SAN LORENZO	----------	----------	No se encontraron dificultades ni imprevistos para la ejecución de los trabajos

2.- Descripción de las medidas de seguridad, higiene y ambientales adoptadas en el mes certificado en relación a los ítems ejecutados.

(describir por Localidad)

Localidad	Medidas de seguridad	Medidas de higiene	Medidas ambientales
SE- SAN LORENZO	- Se utilizaron Cintas y mallas de seguridad para delimitar la zona de obra - Todo el personal afectado a la obra utilizó equipos de seguridad (Casco, zapaton, chalecos, arnes, guantes, antiparras, etc.	- En cada zona de trabajo se proveyó los insumos y equipos necesarios para cumplir con las medidas de higiene acordes a la obra.	Se utilizo basureros clasificadores y utilización de contenedores para retiro de escombros Utilización de vehículos en perfectas condiciones mecánicas en relación a las exigencias requeridas en el Contrato

3.- Cronograma de suministros previstos y utilizados.

(puede ser en tabla, de acuerdo al cronograma fisico, con listado de equipos, materiales y herramientas, previstos y utilizados)

EQUIPOS DE SEGURIDAD	Cantidad Equipos de Seguridad Previstos	Cantidad de Equipos de Seguridad Utilizados	
		SE-SAN LORENZO	TOTAL
Casco	15	15	15
Zapatones	15	15	15
Cinturones	15	10	10
Guantes	15	15	15

Conos Señalizadores	10	10	10
Cintas Demarcatorias	200	150	150
Botiquín de Primeros Auxilios	1	1	1
Arneses Anticaídas	5	5	5
Chalecos Reflectantes	50	50	50
Mascarillas	10	10	10
Lentes protectores	5	5	5

HERRAMIENTAS	Cantidad de Herramientas Previstas	Cantidad de Herramientas utilizadas	
		SE-SAN LORENZO	TOTAL
Escaleras	3	3	3
Carretillas	5	5	5
Serruchos	4	0	0
Hormigoneras	3	3	3
Baldes	10	10	10
Palas	5	5	5
Taladros	2	0	0
Azadas	4	4	4
Cortadoras a disco	2	2	2
Pulidoras	2	0	0
Picos	3	3	3
Tenazas	4	4	4
Pinzas	5	5	5
Martillos	5	5	5
Pinceles	5	0	0
Rodillos	4	0	0
Cucharas de albañil	10	10	10
Tablones	5	5	5

Nivel de Burbujas	3	3	3
Nivel de manguera	3	3	3
Fratachos	5	5	5
Caballetes	10	10	10
Punzones y Cortahierros	10	10	10
Barretas	2	2	2
Vibrocompactadores	1	1	1
Desmalezadora	1	0	0
Vibradora de Hormigón	2	2	2
Andamios Tubulares	7	7	7
Bomba de Agua Portátil	1	1	1
Martillete Manual	1	0	1
Silleta de Pintura en Altura	2	0	0
Maderas de Encofrados	15	15	15

MATERIALES	Cantidad de Materiales Previstos	Cantidad de Materiales Utilizados	
		SE-SAN LORENZO	TOTAL
Cemento	1500	1400	1400
al	100	50	50
Arena Lavada	150	150	150
Sellador	50	0	0
Lijas	100	0	0
Pinceles/Rodillos/Brochas	20	0	0
Varillas de hierro	8500	8500	8500
Tela	50	0	0
Impacril	10	0	0
Pintura látex acrílico	15	0	0
Pintura sintética	10	0	0

Enduido acrílico	5	0	0
Artefactos sanitarios	0	0	0

4.- Cuadro comparativo de recursos humanos previstos y utilizados.

(Nombre y CI de los profesionales que intervinieron en el mes)

RECURSOS HUMANOS	Cantidad Recursos Humanos Previstos	Cantidad Recursos Humanos Utilizados			
		SE-SAN LORENZO			DPTO. DE TRANSMISION ESTE
Administrador del Contrato (Supervisor General de Obras)	1	1			1
Jefe de Obra (Arquitecto o Ingeniero Civil, residente de obra)	1	1			1
Capataz de Obra (maestro mayor de obra)	1	1			1
Hormigón	1	1			1
Plomería	1	1			1
Herrería	1	1			1
Carpintería	1	1			1
Electricidad	1	1			1
Refrigeración y calefacción	1	0			0
Señales débiles (telefonía e informática)	1	0			0
PCI (prevención contra incendio)	1	0			0
Revestimientos (piso/azulejos)	1	0			0
Pintura	1	0			0
TOTAL (por Localidad)	13	8			

5.- Fotografías nítidas y fechadas de los trabajos ejecutados, tamaños mínimos aproximados de 8x10cm, con una breve descripción de cada foto o con flechas indicativas, en cantidad mínima de seis (6) y máxima de doce (12).

Localidad: SE SAN LORENZO

Descripción: Excavación

Descripción: Cargamento de zapatas

DIRECCION DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

Dpto. de Servicios Meteorológicos e Hidrológicos para el Público

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) AÑO 2023

Localidad	Latitud Sur	Longitud Oeste	Elevación
AEROPUERTO "SILVIO PETTIROSSI", LUQUE	25° 14' 09,99"	57° 30' 53,08"	83 m s.n.m.m

Mes / Día	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1								0,0				
2								0,0				
3								0,0				
4								0,0				
5								0,0				
6								0,0				
7								0,0				
8								5,4				
9								0,0				
10								0,0				
11								0,0				
12								0,0				
13								0,0				
14								0,0				
15								0,0				
16								0,0				
17								0,0				
18								22,3				
19								0,0				
20								0,0				
21								0,0				
22								0,0				
23								T				
24								T				
25								0,0				
26								0,0				
27								0,0				
28								0,0				
29								0,0				
30								0,0				
31								2,8				
Total								31				
Máx. 24h								22,3				
Día Máx.								18				

DIRECCIÓN DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA - DINAC - Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público

Ing. Diana Rocío Valdez
Dpto. Serv. Met. e Hid. para el Público
DMH - DINAC

Referencias: 0,0 sin precipitación; T precipitación no medible (Trazas); - sin datos de precipitación

ANDE

4.- Cronograma de avance de obra comparativo entre lo previsto y lo ejecutado

L.P.N. N° 1573/2020. "Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laureity - San Lorenzo."

CONTRATO N° 8488/2021

CONTRATISTA: CONSORCIO PC (PUNTAL CONSTRUCCIONES - CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.)

2022/2023

Item	Descripción	AVANCE (%)	JUNIO				JUNIO (M1)				JULIO (M2)				AGOSTO (M3)				SEPTIEMBRE (M4)				OCTUBRE (M5)				NOVIEMBRE (M6)				DICIEMBRE (M7)				ENERO (M8)				FEBRERO (M9)				JULIO (M10)				AGOSTO (M11)			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	DESCRIPCION					FOI																																												
12	Excavación	100				29																																												
14	Estructura de H°A° - Zapata (incluye hormigón de regularización, relleno, eliminación de material sobrante y todo lo necesario conforme a las EETT)	92				29																																											
15	Estructura de H°A° - Fuste	100				29																																											
16	Estructura de H°A° - Viga de Fundación	86				29																																										
17	Estructura de H°A° - Pilar a la vista	50				29																																										
168	Estructura de H°A° - Plataforma de Hormigón Armado 210 - Losa base, h=20 cm (incluye canaletas y registros colectores de derrames, murete de seguridad y rampa de acceso, juntas de dilatación y contracción)	88				29																																										
186	Piso Cerámico,para alto tránsito (previa carpeta de mortero para colocación), para baños y oficinas.	50				29																																										
187	Zócalo cerámico similar al piso	30				29																																										
191	Azulejo cerámico esmaltado	50				29																																										
215	Provisión e instalación de Sistema de tratamiento (incluye todas las cañerías, codos, conexiones, llaves de paso, griferías y accesorios)- Según planos y detalles	35				29																																										
247	Provisión e instalación de Alimentación a Tableros eléctricos(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	70				29																																										
248	Provisión e instalación de cajas con elementos de protección de circuitos(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	70				29																																										
249	Provisión e instalación de cajas con elementos de alimentación a circuitos eléctricos(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	70				29																																										
250	Provisión e instalación de mecanismo de encendido y tomas(Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	70				29																																										
287	Provisión e instalación de Aire comprimido (Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	30				29																																										
288	Provisión e instalación de Sistema de CCTV (Ver detalle lista de materiales y cantidades que incluye el ítem en E.E.T.T.)	40				29																																										

Referencias:

FOI Fecha de Orden de Inicio

O.S. Periodo de Ejecucion Previsto

Periodo de ejecucion total

Periodo de ejecucion parcial

ING. LUIS PROVEDA
Representante Legal
CONSORCIO PC

CONSORCIO PC

Curva de Avance Financiero - Certificado 11

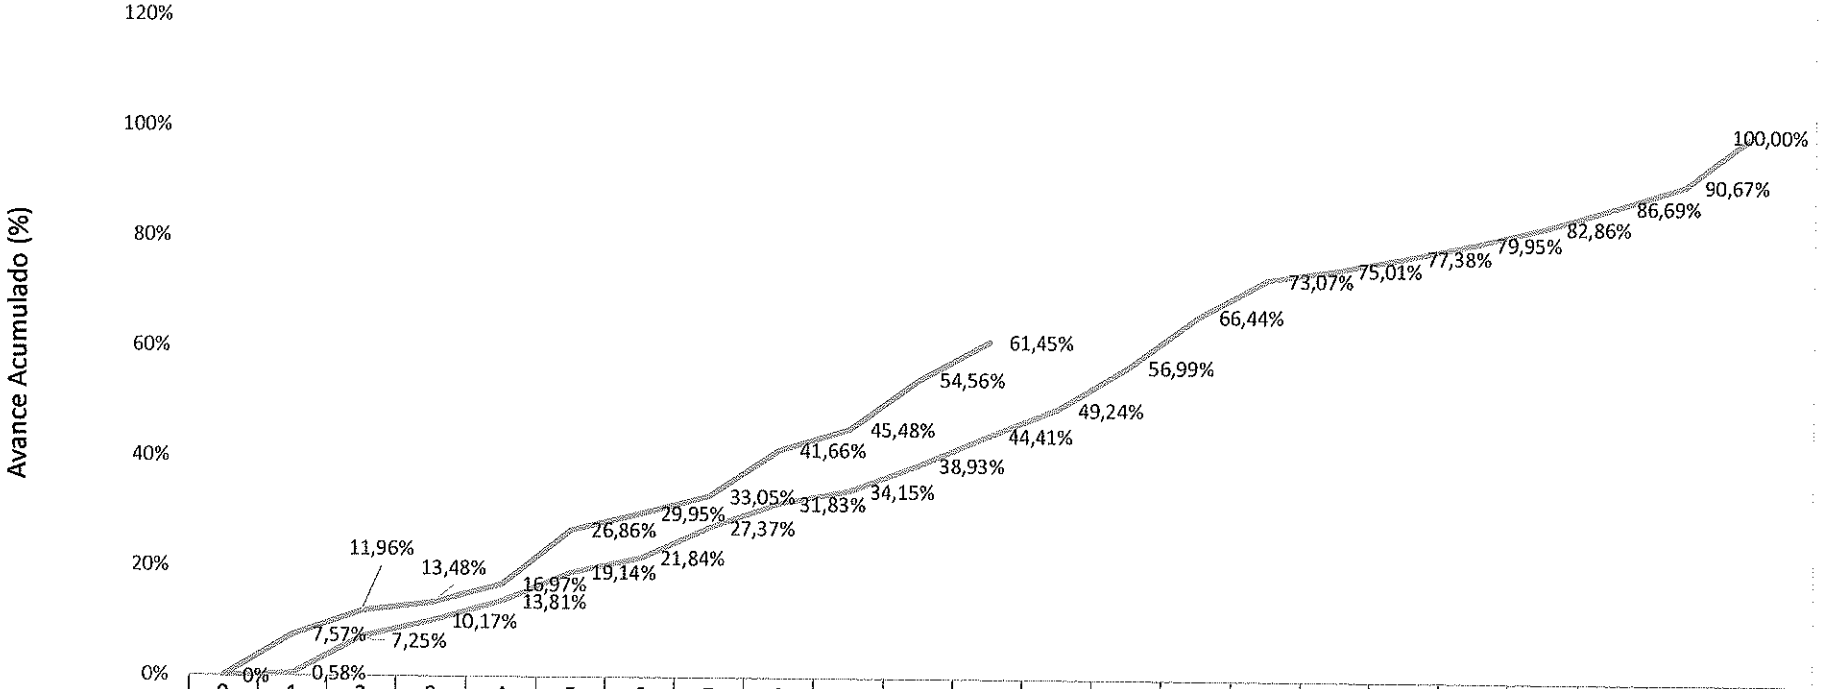

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Contractual	0%	0,58%	7,25%	10,17	13,81	19,14	21,84	27,37	31,83	34,15	38,93	44,41	49,24	56,99	66,44	73,07	75,01	77,38	79,95	82,86	86,69	90,67	100,0
Ejecutado	0%	7,57%	11,96	13,48	16,97	26,86	29,95	33,05	41,66	45,48	54,56	61,45											

Avance Acumulado

CONSORCIO PC
RUC: 80112949-4

Ing. Carlos E. Barrios O.
GT/OCI-1

PUNTAL CONSTRUCCIONES | CALDETEC INGENIERIA S.R.L.

CONSORCIO PC

Asunción, 20 de Setiembre de 2023

Ing. Félix Eladio Sosa
Administración Nacional de Electricidad – ANDE
Presidente
PRESENTE

Ref. Presentación Factura correpsondiente a Certificado de Avance de Obra No. 11 .

Me dirijo a usted, a fin de solicitar iniciar trámites de pago correspondiente al **CERTIFICADO No. 11 (AGOSTO 2023) de la obra "EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN EN EL COMPLEJO LAURELTY- SAN LORENZO " - CONTRATO 8488/2021 - LPN N° 1573/2020 - ID N° 377.327**

El Monto del Certificado asciende a la suma de Guaranies IVA INCLUIDO: **749.039.580**

SON GUARANIES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA .--

Para el efecto, Solicito tenga en consideración los siguintes datos

RUC EMPRESA CONTRATISTA	80112949-4
RAZON SOCIAL CONTRATISTA	**CONSORCIO PC**
NUMERO DE FACTURA	001-001-00000162
NUMERO DE TIMBRADO	16189156 VENCIMIENTO : 29/02/2024
NUMERO DE CONTRATO	**CONTRATO 8488/2021 - LPN N° 1573/2020 EJECUCION DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DISTRIBUCIÓN EN EL COMPLEJO LAURELTY- SAN LORENZO ID N° 377.327**
NUMERO CUENTA CORRIENTE BANCARIA	BANCO CONTINENTAL CTA. CTE. No.62360916605
DIRECCION DE EMAIL DE LA EMPRESA	administracion@puntal.net

Se adjunta:
Factura Crédito Original
Certificado de Cumplimiento Tributario
Certificado de Cumplimiento Seguro Social
Repse
Formulario FIP
Formulario FIS

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal
CONSORCIO PC

Ing. Luis Boveda
REPRESENTANTE LEGAL
Contratista

continental

Asunción, 04 de Abril del 2023

Señores:

" ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE "

Presente

CR N° 0623040315

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de proporcionarles la presente referencia bancaria.

A tal efecto informamos que el cliente " CONSORCIO PC " con RUC N° 80112949-4, opera en nuestra Entidad con la Cuenta Corriente Gs. N° 00062360916605, desde la fecha 25/09/2020, encontrándose la misma vigente a la fecha.

Esta referencia se emite a solicitud expresa de nuestro cliente, sin implicancias de responsabilidad o garantía alguna, por parte del Banco Continental S.A.E.C.A.

Sin otro particular, les saludamos atentamente.

BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.

José Sagovia
Oficial de Negocios - Sucursales
Banco Continental S.A.E.C.A.

CONSORCIO PC
RUC: 80112949-4

Mcal. López N 3235 e/ Gral. Garay
+595 21 419 3000
Asunción, Paraguay

www.bancontinental.com.py

Consorcio "PC"

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Tte. Machio e/ Juan León Mallorquin y Garibaldi
Tel.: (021) 290 225
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO N° 16189156
Válido desde el: 02/02/2023 hasta el 29/02/2024
RUC: 80112949 - 4

FACTURA

N° 001-001 0000162

Fecha de Emisión: 19 de Setiembre de 2023 — Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☑

Nombre o razón Social: Ande - Administración Nacional de Electricidad — RUC: 80009735-1

Dirección: Avda España 1268 — Tel.:

Nota de Remisión N°: — Fecha: — Condición de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	5%	10%
	Certificado N° 11 de la obra "Ejecución de obras civiles para la construcción de laboratorio y talleres de mantenimiento de equipos de construcción - Asunción				
	Contrato N° 8488/21 LPN 1593/20				
	Monto de los trabajos Gs. 788.462.716				
	(-) Devolución Anticipo Gs. (39.423.136)				
	(=) Monto a Facturar Gs. 749.039.580	749.039.580	—	—	749.039.580
SUB TOTALES					

TOTAL A PAGAR Gs. (en letras): Setecientos cuarenta y nueve millones treinta y nueve mil quinientos ochenta. — 749.039.580

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 68.094.507 TOTAL IVA: 68.094.507

Imprenta Imagen - RUC: 2661961 - 0 - 1 tal.50x3 del 151 al 200.- 2/2023
HABILITACIÓN N° 1395 - KM. 12 R.TRANS CHACO" TEL 0981 941 509 - de Ruth Delgado

ORIGINAL (blanco) : COMPRADOR - COPIA : ARCH. TRIBUTARIO - TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Lote 5656780541 , Consu: 2

SET
TRIBUTACIÓN
FORM.427-1

SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION NUMERO 4270180556572

FECHA 25/06/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC 80112949

DV 4

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

CONSORCIO PC

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 24/09/2023

NÚMERO DE CONTROL: 8BA056D

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN

4271801129498BA056D

CONSORCIO PC
RUC: 80112949-4

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 3030461

NRO. CERTIFICADO: 401929

FECHA EMISION: 20-09-2023

VENCIMIENTO: 17-10-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80112949

Nro. Certificado: 401929

Razon Social: CONSORCIO PC

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Fecha de Inscripcion: 25-07-2022

Cantidad de Asegurados: 54

Nro. Patronal(es): 0002-40-1104 - 0007-40-0413 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N)
EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados."

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

CONSORCIO PC

RUC

80112949-4

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 377327 / LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo

Monto del contrato

11.444.714.616

Empleados vinculados al contrato

Nro	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
CONSORCIO PC		80112949-4				
1	ARSENIO	AGUERO PEREIRA	1791653	EXCLUSIVA	LABORAL	
2	OSVALDO ANTONIO	ALVAREZ	4910694	EXCLUSIVA	LABORAL	
3	ADRIAN ERNESTO	ESTIGARRIBIA	5067993	EXCLUSIVA	LABORAL	
4	JUAN BAUTISTA	LUGO	6119297	EXCLUSIVA	LABORAL	30/11/2022
5	ISMAEL DE LOS SANTOS	NUÑEZ	2916196	EXCLUSIVA	LABORAL	

Usuario Impresión: CONSORCIOpc

Fecha Impresión: 10/02/2023

DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

GOBIERNO NACIONAL

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

CONSORCIO PC

RUC

80112949-4

Entidad Contratante

Administración Nacional de Electricidad

Descripción del llamado / Contrato

ID: 377327 / LPN 1573-2020.Ejecución de Obras Civiles para Construcción de Laboratorio de PCB y Taller de Mantenimiento de Equipos de Distribución en el Complejo Laurelty - San Lorenzo

Monto del contrato

11.444.714.616

Año: 2023 **Periodo:** Agosto

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
CONSORCIO PC		80112949-4				
2	OSVALDO ANTONIO	ALVAREZ	Cumplio	2550307	Contratista	Activo
3	ADRIAN ERNESTO	ESTIGARRIBIA	Cumplio	6700000	Contratista	Activo
4	ISMAEL DE LOS SANTOS	NUÑEZ	Cumplio	2550307	Contratista	Activo
5	ARSENIO	AGUERO PEREIRA	Cumplio	2550307	Contratista	Activo

Consorcio "PC"

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Tte. Machio e/ Juan León Mallorquin y Garibaldi
Tel.: (021) 290 225
San Lorenzo - Paraguay

TIMBRADO N° 16189156
Válido desde el: 02/02/2023 hasta el 29/02/2024
RUC: 80112949 - 4

FACTURA

N° 001-001 0000162

Fecha de Emisión: 19 de Setiembre de 2023 — Cond. de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o razón Social: Ande- Administración Nacional de Electricidad — RUC: 80009735-1

Dirección: Avda España 1268 — Tel.:

Nota de Remisión N°: — Fecha: — Condición de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
	Certificado N° 11 de la obra "Ejecución de				
	obras civiles para la construcción de talleres				
	y talleres de mantenimiento de equipos				
	de construcción - Jauretu				
	Contrato N° 8488/21 LPN 1573/20				
	Monto de los trabajos Gs. 788.462.716				
	-) Devolución Anticipo Gs. (39.423.136)				
	(=) Monto a Facturar Gs. 749.039.580 =	749.039.580	—	—	749.039.580
SUB TOTALES					

REGISTRADO 2023 N° Administración y Finanzas

TOTAL A PAGAR Gs. (en letras) Setecientos cuarenta y nueve millones treinta y nueve mil Quinientos ochenta. — 749.039.580

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 68.094.507 TOTAL IVA: 68.094.507

Imprenta Imagen - RUC: 2661961 - 0 - 1 tal 50x3 del 151 al 200.- 2/2023
HABILITACIÓN N°.1395 - KM. 12 R.TRANS CHACO° TEL 0981 941 509 - de Ruth Delgado

ORIGINAL (blanco) : COMPRADOR - COPIA : ARCH. TRIBUTARIO - TRIPLICADO: CONTABILIDAD

Consorcio "PC"

CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

Sgto. 1° Juan Ramón Cespedes c/ Santisimo Sacramento
Tel.. 021 290 225- Asunción - Paraguay

Gs. 714.992.326

RUC: 80112949 - 4

RECIBO DE DINERO

N° 0000038

Recibí de: Administración Nacional de Electricidad RUC / CI: 8000 9735-1

La cantidad de guaraníes: Setecientos catorce millones, novecientos noventa y dos mil trescientos veinte y seis

En concepto de: Cancelación de la Factura Crédito N° 001-001-162 de Fecha 19 de Setiembre de 2023

Efectivo Cheque N°..... Banco:.....

Asunción 24 de Noviembre, 2023
Fecha - Lugar

Firma Federico Fetu

Imprenta Imagen RUC: 2661961 - 0 - 1 tal 50x3 del 001 al 050 - 11/2020
HABILITACIÓN N° 1395 - KM. 12 R. TRANS CHACO* TEL 298369 - de Ruth Delgado

ORIGINAL: COMPRADOR // DUPLICADO: CLIENTE

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
AV. ESPAÑA Nº 1268 Y PADRE CARDOZO
TELEF.: 211001/20 -222713/16 -FAX (595-21)212371
CASILLA DE CORREO N°: 604
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py
Generacion, Transmision, Distribucion y Comercializacion de Energía Eléctrica

RUC: 80009735-1
Comprobante de Retencion
No Impositivo

Orden de Pago N° 2000015935 **Fecha de Pago** 22.09.2023

Beneficiario: 1000001207 CONSORCIO PC
SARGENTO CESPEDES CASI AVENIDA SACR

Comprobante N°	Fecha	Procedimiento N°	Contrato N°	Importe	Moneda
001-001-0000162	19.09.2023	1573/2020	3070000004	749.039.580	PYG
Retenciones	**Concepto**				
	Ley 0.4% - Ret Renta Pago			2.642.067	PYG
	Caucional 5% en Factura			34.047.254	PYG
	TOTAL			**36.689.321**	**PYG**

Código de Contratación: LP-25002-22-214684

* Observación: El Fondo de Reparo y/o Retención Caucional podrá ser devuelto una vez.

USUARIO: ASU11940

FECHA: 22.09.2023

HORA: 15:05:36
