MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"
LOTE 2 Calle Alider Vera Guillen e/ Mcal. Lopez y Cerro Cora, Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti
LICITACION POR CONCUROS DE OFERTA No.01/2023 ID N°: 434.598 CONTRATO N° 27/2023
EMPRESA CONTRATISTA:WYLL SERVICIOS GENERALES
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:02
PERIODO: ENERO 2024

FECHA DE PRESENTACION	05/02/2024
FECHA DE INICIO	06/12/2023
PLAZO INICIAL (DIAS)	120
DIAS DE LLUVIA	0
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	120
DIAS TRANSCURRIDOS	61
DIAS DE RETRAZO	0
FECHA FIN DE PLAZO DE EJCUCION	03/04/2024

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN		MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"		114.510.398	37,95%	42,25%	80,19%	43.452.980	48.375.150	91.828.130
DEDUCCIONES A LA FECHA									
B.1	0,05% x dia	MULTAS	57.255				-	-	-
B.2	20%	DESCUENTO DEL ANTICIPO	22.902.080	37,95%	42,25%	80,19%	8.690.596	9.675.030	18.365.626
B.3	5%	RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	5.725.520	37,95%	42,25%	80,19%	2.172.649	2.418.758	4.591.407
B	TOTAL DEDUCCIONES		28.627.600	37,95%	42,25%	80,19%	10.863.245	12.093.788	22.957.033
C	MONTO NETO A PAGAR (A - B)						32.589.735	36.281.363	68.871.098

SON GUARANÍES: TREINTA SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES .-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"
LOTE 2 Calle Alider Vera Guillen e/ Mcal. Lopez y Cerro Cora, Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti
LICITACION POR CONCUROS DE OFERTA No.01/2023 ID N°: 434.598 CONTRATO N° 27/2023
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:02

PERIODO: ENERO 2024

FECHA DE PRESENTACION	05/02/2024
FECHA DE INICIO	06/12/2023
PLAZO INICIAL (DIAS)	120
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	120
DIAS TRANSCURRIDOS	61
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO DE EJCUCION	03/04/2024

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación (Calle Alider Vera Guillen entre Mariscal López y Cerro Cora)	Metros cuadrados	520	2.418	1.257.360	520,00		520,00	1.257.360		1.257.360	100,00%		100,00%
2	Desmonte de terreno	Unidad Medida Global	1											
2.1	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas desmontes varios	Metros cuadrados	520	1.693	880.360	520,00		520,00	880.360		880.360	100,00%		100,00%
3	Cartel con impresion	Unidad	1	1.755.000	1.755.000									
4	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1											
4.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado	Metros cuadrados	520	3.627	1.886.040	520,00		520,00	1.886.040		1.886.040	100,00%		100,00%
5	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	115	43.766	5.033.090	50,00		50,00	2.188.300		2.188.300	43,48%		43,48%
6	Construccion de cordon	Unidad Medida Global	1											
6.1	Provision y colocacion de cordon cuneta prefabricado de hormigon	Metro lineal	130	84.630	11.001.900	60,00	70,00	130,00	5.077.800	5.924.100	11.001.900	46,15%	53,85%	100,00%
6.2	Provision y colocacion de cordon simple prefabricado de hormigon	Metro lineal	16	50.830	813.280		16,00	16,00		813.280	813.280			
6.3	Relleno lateral de contencion de cordon	Metros cúbicos	68	32.643	2.219.724		50,00	50,00		1.632.150	1.632.150		73,53%	73,53%
7	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1											
7.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de areana (AREANA DE RIO 50%)	Metros cuadrados	520	50.278	26.144.560	250,00	200,00	450,00	12.569.500	10.055.600	22.625.100	48,08%	38,46%	86,54%
7.2	Compactacion manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	520	3.627	1.886.040		520,00	520,00		1.886.040	1.886.040		100,00%	100,00%
7.3	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI	Metros cuadrados	520	3.864	2.009.280		450,00	450,00		1.738.800	1.738.800			
8	Construccion de cuneta	Unidad Medida Global	1											
8.1	Construccion de baden de HºAº de 15 cm de espesor ancho 1,60 m.	Metros cúbicos	4	1.813.500	7.254.000		2,00	2,00		3.627.000	3.627.000		50,00%	50,00%
9	Limpieza de Obras - retiro de escombros y entrega de obra	Metros cuadrados	520	3.143	1.634.360		450,00	450,00		1.414.350	1.414.350		86,54%	86,54%
10	Replanteo y Marcación (Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti)	Metros cúbicos	490	2.418	1.184.820	490,00		490,00	1.184.820		1.184.820	100,00%		100,00%
11	Desmonte de terreno	Unidad Medida Global	1											
11.1	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas desmontes varios	Metros cuadrados	490	1.693	829.570	490,00		490,00	829.570		829.570	100,00%		100,00%
12	Cartel con impresion	Unidad	1	1.755.000	1.755.000		1,00	1,00		1.755.000	1.755.000		100,00%	100,00%
13	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1											

WYL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"
LOTE 2 Calle Alider Vera Guillen e/ Mcal. Lopez y Cerro Cora, Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti
LICITACION POR CONCUROS DE OFERTA No.01/2023 ID N°: 434.598 CONTRATO N° 27/2023
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:02

PERIODO: ENERO 2024

FECHA DE PRESENTACION	05/02/2024
FECHA DE INICIO	06/12/2023
PLAZO INICIAL (DIAS)	120
DIAS DE LLUVIA	
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	120
DIAS TRANSCURRIDOS	61
DIAS DE RETRAZO	
FECHA FIN DE PLAZO DE EJCUCION	03/04/2024

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
13.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado	Metros cuadrados	490	3.627	1.777.230	490,00		490,00	1.777.230		1.777.230	100,00%		100,00%
14	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	147	43.766	6.433.602	50,00		50,00	2.188.300		2.188.300	34,01%		34,01%
15	Construccion de cordon	Unidad Medida Global	1											
15.1	Provision y colocacion de cordon simple prefabricado de hormigon	Metro lineal	147	50.830	7.472.010	70,00	77,00	147,00	3.558.100	3.913.910	7.472.010	47,62%	52,38%	100,00%
15.2	Relleno lateral de contencion de cordon	Metros cúbicos	44	32.643	1.436.292		30,00	30,00		979.290	979.290		68,18%	68,18%
16	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1											
16.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de areana (AREANA DE RIO 50%)	Metros cuadrados	490	50.278	24.636.220	200,00	200,00	400,00	10.055.600	10.055.600	20.111.200	40,82%	40,82%	81,63%
16.2	Compactacion manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	490	3.627	1.777.230		490,00	490,00		1.777.230	1.777.230		100,00%	100,00%
16.3	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI	Metros cuadrados	490	3.864	1.893.360		400,00	400,00		1.545.600	1.545.600		81,63%	81,63%
17	Limpieza de Obras - retiro de escombros y entrega de obra	Metros cuadrados	490	3.143	1.540.070		400,00	400,00		1.257.200	1.257.200		81,63%	81,63%
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**114.510.398**				**43.452.980**	**48.375.150**	**91.828.130**	**37,95%**	**42,25%**	**80,19%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"
LOTE 2 Calle Alider Vera Guillen e/ Mcal. Lopez y Cerro Cora, Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti
LICITACION POR CONCUROS DE OFERTA No.01/2023 ID N°: 434.598 CONTRATO N° 27/2023
EMPRESA CONTRATISTA:WYLL SERVICIOS GENERALES
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:02
PERIODO: ENERO 2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 05 días del mes de febrero del año 2024, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "WYLL SERVICIOS GENERALES", REPRESENTADA POR el SR. WULIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación (Calle Alider Vera Guillen entre Mariscal López y Cerro Cora)	Metros cuadrados	520	520,00		520,0
2	Desmonte de terreno	Unidad Medida	1			0,0
2.1	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas desmontes varios	Metros cuadrados	520	520,00		520,0
3	Cartel con impresion	Unidad	1			0,0
4	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1			0,0
4.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado	Metros cuadrados	520	520,00		520,0
5	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	115	50,00		50,0
6	Construccion de cordon	Unidad Medida Global	1			0,0
6.1	Provision y colocacion de cordon cuneta prefabricado de hormigon	Metro lineal	130	60,00	70,00	130,0
6.2	Provision y colocacion de cordon simple prefabricado de hormigon	Metro lineal	16		16,00	16,0
6.3	Relleno lateral de contencion de cordon	Metros cúbicos	68		50,00	50,0
7	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1			0,0
7.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de areana (AREANA DE RIO 50%)	Metros cuadrados	520	250,00	200,00	450,0
7.2	Compactacion manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	520		520,00	520,0
7.3	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI	Metros cuadrados	520		450,00	450,0
8	*Construccion de cuneta*	Unidad *Medida* Global	1			0,0
8.1	Construccion de baden de HºAº de 15 cm de espesor ancho 1,60 m.	Metros cúbicos	4		2,00	2,0
9	Limpieza de Obras - retiro de escombros y entrega de obra	Metros cuadrados	520		450,00	450,0
10	Replanteo y Marcación (Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti)	Metros cúbicos	490	490,00		490,0
11	Desmonte de terreno	Unidad Medida Global	1			0,0
11.1	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas desmontes varios	Metros cuadrados	490	490,00		490,0
12	Cartel con impresion	Unidad	1		1,00	1,0
13	Preparacion de obra	Unidad Medida	1			0,0
13.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado	Metros cuadrados	490	490,00		490,0
14	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	147	50,00		50,0
15	Construccion de cordon	Unidad Medida Global	1			0,0
15.1	Provision y colocacion de cordon simple prefabricado de hormigon	Metro lineal	147	70,00	77,00	147,0
15.2	Relleno lateral de contencion de cordon	Metros cúbicos	44		30,00	30,0

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wulian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"

LOTE 2 Calle Alider Vera Guillen e/ Mcal. Lopez y Cerro Cora, Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti

LICITACION POR CONCUROS DE OFERTA No.01/2023 ID N°: 434.598 CONTRATO N° 27/2023

EMPRESA CONTRATISTA:WYLL SERVICIOS GENERALES

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:02

PERIODO: ENERO 2024

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 05 días del mes de febrero del año 2024, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA "WYLL SERVICIOS GENERALES", REPRESENTADA POR el SR. WULIAN DAMIAN BALBUENA RECALDE, la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
16	Construcción de empedrado	Unidad Medida Global	1			0,0
16.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de areana (AREANA DE RIO 50%)	Metros cuadrados	490	200,00	200,00	400,0
16.2	Compactacion manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final	Metros cuadrados	490		490,00	490,0
16.3	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI	Metros cuadrados	490		400,00	400,0
17	Limpieza de Obras - retiro de escombros y entrega de obra	Metros cuadrados	490		400,00	400,0
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"

LOTE 2 Calle Alider Vera Guillen e/ Mcal. Lopez y Cerro Cora, Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti

LICITACION POR CONCURSOS DE OFERTA No.01/2023 ID N°: 434.598 CONTRATO N° 27/2023

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"
MONTO TOTAL DE OBRA Gs	114.510.398
TIEMPO DE EJECUCION	120 dias

ITEM	DESCRIPCIÓN	ene-24				feb-24				mar-24				abr-24				Monto	%
		30 dias				60 dias				90 dias				120 dias					
1	Replanteo y marcación (Calle Alider Vera Guillen entre Mariscal López y Cerro Cora)																	1.257.360	1,10
2	Desmonte de terreno																	0	0,00
2.1	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas desmontes varios																	880.360	0,77
3	Cartel con impresion																	1.755.000	1,53
4	Preparacion de obra																	0	0,00
4.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado																	1.886.040	1,65
5	Relleno y compactacion de terreno																	5.033.090	4,40
6	Construccion de cordon																	0	0,00
6.1	Provision y colocacion de cordon cuneta prefabricado de hormigon																	11.001.900	9,61
6.2	Provision y colocacion de cordon simple prefabricado de hormigon																	813.280	0,71
6.3	Relleno lateral de contencion de cordon																	2.219.724	1,94
7	Construcción de empedrado																	0	0,00
7.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de areana (AREANA DE RIO 50%)																	26.144.560	22,83
7.2	Compactacion manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final																	1.886.040	1,65
7.3	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI																	2.009.280	1,75
8	Construccion de cuneta																	0	0,00
8.1	Construccion de baden de HºAº de 15 cm de espesor ancho 1,60 m.																	7.254.000	6,33
9	Limpieza de Obras - retiro de escombros y entrega de obra																	1.634.360	1,43
10	Replanteo y Marcación (Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti)																	1.184.820	1,03
11	Desmonte de terreno																	0	0,00
11.1	Desmonte de cañerias/ traslado y/o reposicion de cañerias averiadas desmontes varios																	829.570	0,72
12	Cartel con impresion																	1.755.000	1,53
13	Preparacion de obra																	0	0,00
13.1	Preparacion de terreno para caja de empedrado																	1.777.230	1,55
14	Relleno y compactacion de terreno																	6.433.602	5,62
15	Construccion de cordon																	0	0,00
15.1	Provision y colocacion de cordon simple prefabricado de hormigon																	7.472.010	6,53
15.2	Relleno lateral de contencion de cordon																	1.436.292	1,25
16	Construcción de empedrado																	0	0,00
16.1	Pavimento tipo empedrado. Incluye colchon de areana (AREANA DE RIO 50%)																	24.636.220	21,51
16.2	Compactacion manual en el proceso y a rodillo según especificaciones al final																	1.777.230	1,55
16.3	Ripiado final con ripio basaltico. Piedra VI																	1.893.360	1,65
17	Limpieza de Obras - retiro de escombros y entrega de obra																	1.540.070	1,34
	TOTAL																	114.510.398	100,00

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

WYL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"

LOTE 2 Calle Alider Vera Guillen e/ Mcal. Lopez y Cerro Cora, Calle Sin Nombre y Tte. Brusquetti

LICITACION POR CONCUROS DE OFERTA No.01/2023 ID N°: 434.598 CONTRATO N° 27/2023

CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA:	OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - PROCESO PLURIANUAL"
MONTO TOTAL DE OBRA Gs	114.510.398
TIEMPO DE EJECUCION	120 dias

Contractual				
Monto Bruto Mensual Contractual	28.627.600	28.627.600	28.627.599	28.627.599
Porcentaje Avance Mensual Contractual	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
Certificado				
Monto Bruto Mensual Certificado	43.452.980	48.375.150		
Porcentaje Avance Mensual Certificado	37,95%	42,25%		
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	37,95%	80,19%		

	Mes1	Mes2	Mes3	Mes4
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Contractual	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
Porcentaje Avance Acumulado Mensual Certificado	37,95%	80,19%	0,00%	0,00%

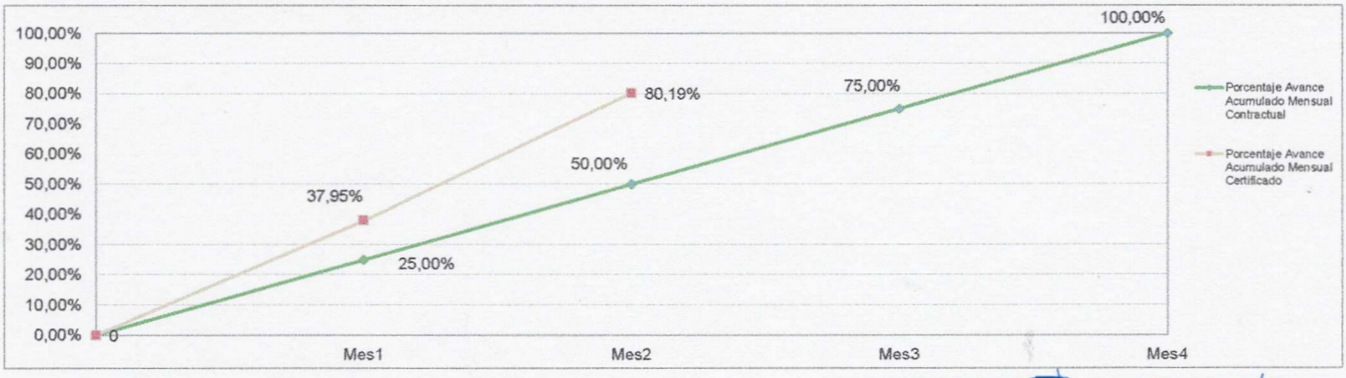

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra
