STF 166 /2021
Proyecto 822

15/11/2021 15:09

REGISTRO DE ENTRADA DE CORRESPONDENCIA

UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMAS
UCP-MEC/BID

Nro. Entrada: 10039 **Año:** 2021

Fecha 15/11/2021 **Fecha Ingreso:** 15/11/2021

Fecha Límite: 15/11/2021

Clasificador: PROYECTOS Y OPERACIONES>PO-Prestamos>PO-Activos>FEEI>Ampliación y Reposición en 822 Establecimientos Educativos del MEC... >DESEMBOLSO>

Referencia: MEMO 0107 CPI

Tipo de Doc: Memo

Asunto: Solicitud de pago. Certificado N° 6 Orden de Servicios N °02/2021 Contrato N° 31/2020. Anexa 4 biblioratos.

De	Para	Fecha. Deriv.	Derivado en	Estado	Nota
Natalia	Natalia	15/11/2021	Archivo	Terminado	Entrada del Documento
Natalia	Juan José	15/11/2021	Departamento de Control y	Pendiente	

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMORANDUM C.P.I. Nº 107/2021

A: **Lic. Santiago López Ibáñez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Administración y Finanzas - UEPP

De: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: *Solicitud de pago*
Certificado N°6. Orden de Servicio N° 02/2021. Contrato N° 31/2020– Lote 6
Licitación 360254 - Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los proyectos financiados por el FEEI

Fecha: 15/11/2021

Por la presente, la Coordinación de Proyectos de Infraestructura de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos – UEPP, del Ministerio de Educación y Ciencias, se dirige a Ud. a fin de poner a su consideración el Memo Interno N° 050/2021, elaborado por el Arq. Guillermo Godoy (Jefe de Supervisión y Certificación) y la Arq. Graciela Acosta (Supervisora de Obras).

El mismo se adjunta a la presente y corresponde al Certificado de referencia. Al respecto, solicito sus buenos oficios para el pago del mismo.

U.E.P.P. MEC
Exp. Nº 10039
Folios
15 NOV 2021 1510

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MEMO INTERNO Nº 050/2021

A: **Ing. Zoilo Benítez.** *Coordinador Interino*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

De: **Arq. Guillermo Godoy.** Jefe de Certificación y Supervisión
Coordinación de Proyectos de Infraestructura – UEPP

Arq. Graciela Acosta B. *Supervisora de Obras*
Coordinación de Proyectos de Infraestructura - UEPP

Ref.: ***Solicitud de Pago.***
Remisión del Certificado N° 6. Orden de Servicio N° 02/2021. Contrato N° 31/2020 – LPN/SBE N° 02/2020 "Construcciones, Ampliaciones, Reparaciones y Terminaciones de 272 Establecimientos Educativos en el marco de los Programas Financiados por el Fondo de la Excelencia de la Educación y la Investigación" – ID N° 360.254.

Fecha: 08/11/2021

Por la presente, me dirijo a Ud. y a quien corresponda, con el objeto de solicitar el pago del Certificado de referencia; considerando la nota presentada por la Fiscalización en fecha 19/10/2021, a través de la cual **aprueba y solicita el pago del Certificado N° 6, Orden de Servicio N° 2,** emitida en echa 05-04-2021, Para la Empresa constructora **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.** en el marco de la Contratación LPN/SBE 02/2020CONSTRUCCIONES , Ampliaciones, Reparaciones y terminaciones de 272 Establecimientos Educativos en el marco de los programas financiados por el fondo de la excelencia de la Educación y la Investigación –ID N° 360.254

En respuesta al Memorándum CAF N°050/2021, por el cual se solicita "Aprobación de proceso de pago", correspondiente al **Contrato N°31/2020**.

Atentamente.

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

ww.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

1 - DATOS GENERALES DEL CONTRATO.

a. Lote N°: **6**
b. Contrato N°: **31/2020**
c. Departamento: **CAAZAPA**
d. Cantidad de establecimientos.: **19**
e. Contratista: **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A**
f. Supervisión: **CPI - UEPP – MEC**
g. Fiscalización: **UNCA**-UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZU
h. Plazo: **150 días**.
i. Fecha de Contrato :**11/12/ 2020**
j. Orden de Servicio 1/2020: **28/12/2020**
k. Orden de Servicio N°:2/2021: **05/04/2021**
l. Obras iniciadas: **18**
m. Inicio Plazo de ejecución:**07-04-2021**
n. Garantía fiel cumplimiento: **31-03-2022**
o. Garantía anticipo: **31-10-2021**
p. Seguro contra terceros: **31-12-2022**
q. Accidentes personales: **31-12-2021**
r. Fondo de reparo: 5% de cada certificado
s. Cronograma físico-financiero: Aprobado.
t. Monto máximo de contrato: 8.616.133.328 Gs.
u. **Monto del contrato: Lote 6: 7.115.600.074 Gs.**
v. Monto del Certificado acumulado: 6.837.771.509 Gs.
w. Fondo de reparo: 355.780.004 Gs.
x. Monto del Certificado en el mes: 326.645.756 Gs.
y. **Monto Neto Certificado en el mes: 244.984.317 Gs**.
z. Avance físico financiero: 96,1 % (acumulado) – 4,59 % (del mes)

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

ww.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

2- CUADRO DE AVANCES DE OBRAS:

	INSTITUCION	DISTRITO	ACTUAL	ACUMULADO
1	Esc. Bás. N° 256 Pbro. Julio C. Duarte Ortellado	Caazapá	0,94 %	95,54 %
2	Esc. Bás. N° 60 Fray Luis de Bolaños	Caazapá	1,20 %	98,18 %
3	Colegio Nacional Dr. Felipe Molas López	Yuty	5,08 %	98,74 %
4	Colegio Nacional de Capiitindy	3 de mayo	2,17 %	98,76 %
5	Esc. Bas.N° 941 " Constantino Trociuk"	Tavai	6,90 %	93,26 %
6	Esc. Bás. N° 147 Esteban Tomboly	Dr. Moisés Bertoni	11,40 %	97,55 %
7	Colegio Nacional Don Emilio Napout	Fulgencio Yegros	4,08 %	97,52 %
8	Esc. Bás. N° 2189 San Gerardo	San Juan Nepomuceno	6,09 %	94,80 %
9	Esc. Bás. N° 1893 San Miguel	Dr. Moisés Bertoni	1,09 %	96,46 %
11	Esc. Bás. N° 5112 Santa Teresa	Dr. Moisés Bertoni	0,81 %	95,26 %
12	Esc. Bás. N° 4231 San Roque	3 de mayo	2,46 %	97,37 %
13	Esc. Bás. N° 3005 Sta. Teresita del Niño Jesús	Gral. Higinio Morínigo	7,36 %	95,04 %
14	Esc. Bás. N° 1563 San Antonio	Abaí	7,13 %	95,27 %
15	Esc. Bás. N° 1631 San Isidro de Labrador	Tavaí	Aula 5,40 % SSHH 20,,58 %	Aula 93,12 % SSHH 89,22 %
16	Esc. Bás. N° 1941 Tupasy Ykua	3 de mayo	Aula 2,21 % SSHH 1,48 %	Aula 97,37 % SSHH 94,72 %
17	Esc. Bás. N° 5131 San Rafael	Yuty	Aula 2,42 % SSHH 0,36 %	Aula 96,40 % SSHH 95,11 %
18	Esc. Bás. N° 998 Virgen de Fátima	Caazapá	1,48 %	97,08 %
19	Esc. Bás. N° 1795 Defensores del Chaco	Buena Vista	8,21 %	95,46 %

Guillermo Godoy
ARQUITECTO

F:\CAAZAPA CERTIFICADO 6-orden 2 - MEMO INT -2021.docx

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

ww.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy
uepp@mec.gov.py

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

3- CONCLUSIONES:

Vigencia de pólizas: A la fecha todas las pólizas se encuentran vigentes. Las mismas podrán requerir algún tipo de ajuste, dependiendo de las fechas en que se verifiquen las Recepciones Provisorias y Definitivas podrían requerir ajuste en el futuro.

aa. Visto y analizado el Certificado de Obra N°6, correspondiente a la Orden de Servicio N°2, teniendo en cuenta el informe donde la Fiscalización UNCA, da por **APROBADO el CERTIFICADO N°6 de la Orden de Servicio N°2 – Contrato N° 31/2020 – Empresa Constructora SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A**

Esta Coordinación aprueba el Certificado N°6 de la Orden 2

4- ANEXOS:

--2 Biblioratos
-- C D

OBSERVACION: el presente certificado N° 6 consigna en su interior 7 días de ejecución de las obras, en razón de que el contrato fue suspendido, (suspensión del 8 de setiembre al 22 de noviembre de 2021 con resolución N°212 de fecha 28-09-2021), en espera de la concesión de la adenda de inclusión de ítems.

Arq. Graciela Acosta B.
Supervisora de Obras –CPI-UEPP-MEC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Coordinación de Proyectos de Infraestructura

Arq. Guillermo Godoy
Jefe de Supervisión y Certificación

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
Gral Diaz esq. Hernandarias (Edificio Natura)
Tel: (595.21) 452380/2

ww.mec.gov.py
MEC Digital @MECpy

TEKOMBO'E HA MBA'EKUAA MOTENONDEHA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZU** PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO 6 ORDEN DE SERVICIO 2 **PRO - 006**	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo PARAGUAY

NOTA UNCA/MEC N° 481/2021 / LOTE 06

Coronel Oviedo, 18 de octubre de 2021

Ing. Zoilo Benítez
Coordinador de Proyectos de Infraestructura
Presente:

Nos dirigimos a Usted, a fin de **Aprobar y Solicitar** el pago del **Certificado 6 - Orden de Servicio Nº 2**, correspondiente al **Lote Nº 06.**, presentado por la Empresa Contratista **SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**, a través de Nota, como adjudicataria de la Obra del Llamado LPN/SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"

Los datos del Contrato que rige, para el presente pedido de pago son los siguientes:

1	Objeto del Informe	Solicitud de Pago del Certificado Nº 06 Orden de Servicio Nº 02
2	Lote	6
3	Departamento	Caazapá
4	Cantidad de Establecimientos	19
5	Contratista	**SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**
6	Fiscalización	UNCA – Universidad Nacional de Caaguazú
7	N.º de Contrato	N.º 31/2020
8	Resolución de Adjudicación N.º	Resolución UEPP - MEC N.º 437/2020
9	Fecha de Contrato	11/12/2020
10	Fecha de Orden de Servicio 1	28/12/2021
11	Fecha de Orden de Servicio 2	5/4/2021
12	Inicio Plazo de Ejecución	7/4/2021
13	Obras Iniciadas	18
14	Cronograma Físico Financiero	Aprobado
15	Descripción de la Obra	"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"
16	% de Avance Físico Financiero	96,1% (acumulado) – 4,59% (Del mes)
17	Plazo de Ejecución Orden de Servicio 1	**30 DIAS**
18	Plazo de Ejecución Orden de Servicio 1	**150 DIAS**
19	Monto del Contrato	₲ **8.616.133.328**
20	Monto Planilla Ejecutiva	₲ 7.115.600.074
21	Monto Certificado acumulado	₲ 6.837.771.509
22	Monto Certificado en el mes	₲ 326.645.756
23	Fondo de Reparo	₲ 355.780.004
24	Monto neto a pagar	₲ 244.984.317

U.E.P. MEC
Exp. Nº 8703
Recibido por: Natalia
DIA MES AÑO HORA
19 10 21 1200

Dirección: Carmelo Peralta e/ Juan A. Benítez, Cnel. Oviedo.
Teléfono: 0521 204 666
http://www.unca.edu.py/
e-mail: framirez@fctunca.edu.py

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

TEKOMBOTE HA MBA'EKUAA MOTENONDEHA MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS	"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" **UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZU** PEDIDO DE PAGO CERTIFICADO 6 ORDEN DE SERVICIO 2 **PRO - 006**	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAAGUAZÚ Coronel Oviedo PARAGUAY

Conforme a la Planilla de Resumen del **CERTIFICADO 6 - Orden de Servicio N°2, LOTE N° 06,** el monto a ser pagado es de guaraníes:**(244.984.317) Doscientos cuarenta y cuatro millones novecientos ochenta y cuatro trecientos diecisiete**

En cumplimiento de los deberes y responsabilidades delegados a nuestra empresa fiscalizadora, mediante convenio celebrado con este ministerio, representada por la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos como instancia de Gerencia de Obras; y en virtud de la Fiscalización de las Obras del Contrato **N° 31/2020,** manifestamos en carácter de **Declaración Jurada** que de conformidad a las Cláusulas contractuales que rigen para la contratista y los Términos de Referencias que rigen nuestros servicios, y además documentos suscritos en dicho marco, que el presente pedido de pago se ajusta plenamente al Contrato firmado entre el Ministerio de Educación y Ciencias y la empresa contratista SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A, y que los datos y valores expuestos han sido debidamente verificados y en consecuencia CERTIFICADOS por nuestra firma, asumiendo toda la responsabilidad civil y penal emergente de este trámite.

Así mismo, esta certificación da fe del cumplimiento cabal de la empresa Contratista, en la ejecución y calidad de las obras, de conformidad a las Especificaciones Técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones y las normas vigentes.
Por los tramites de rigor, se adjuntan, las siguientes documentaciones en el Orden siguiente:

1	Nota de aprobación de los Certificados y solicitud de trámite de pago según proforma adjunta a este manual (en carácter de Declaración Jurada) – original
2	Nota de pedido de aprobación de Certificados de la Contratista a la Fiscalización - Original
3	Planilla de Resumen de Certificados - Identificando Lote - Nº 06 - septiembre (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
4	Certificados – Identificando Lote - Nº 06 - septiembre (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
5	Acta de Mediciones de los rubros ejecutados en cada lote, identificando Lote- Nº 06 - septiembre (Impreso y Digital en archivo editable)
6	Certificado de Contabilización de Plazos como producto del análisis de los días de lluvia u otro evento consignado en los libros de obra y el Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC), correspondientes al periodo de certificación. Original.
7	Cronograma Físico-Financiero – Aprobado y debidamente firmado
8	Cronograma de Avance de Obras y Curva de Avance de Obras. – Aprobado y debidamente firmado
9	Formulario FC N° 09 – Hoja de Costos de Inversiones del Ministerio de Hacienda – con firma del Fiscal de Obras y el Representante Legal de la Fiscalización.
10	Libro de Obra – foja correspondiente a la Contratante
11	Registro Fotográfico de Rubros Ejecutados (en medio magnético – ordenado en una carpeta digital por institución)

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Dirección: Carmelo Peralta e/ Juan A. Benítez, Cnel. Oviedo.
Teléfono: 0521 204 666
http://www.unca.edu.py/
e-mail: framirez@fctunca.edu.py

Esta fiscalizadora luego de verificar las correcciones solicitadas a la contratista, da por APROBADO el CERTIFICADO N° 6 de la Orden de Servicio N° 2 – Contrato N° 31/2020 – Empresa SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. para su remisión a efectos de elevar a las instancias correspondientes a fin de realizar el pago.

Se adjunta:

- 4 biblioratos

Sin otro particular, lo saludamos atentamente.

.....

Ing. Fredy Gabriel Ramírez Villanueva
Coordinador General de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Dirección: Carmelo Peralta e/ Juan A. Benítez, Cnel. Oviedo.
Teléfono: 0521 204 666
http://www.unca.edu.py/
e-mail: framirez@fctunca.edu.py

DEPARTAMENTO	Nº DPTO	LPN/LOTE	PERIODO DE FISCALIZACIÓN	Nro. De informe
CAAZAPA	VI	LOTE 06 – Caazapá	Del 01-septiembre-21 a 30-septiembre-21	Nº 06 (S-2021)

CERTIFICADO DE CONTABILIZACIÓN y REGISTRO DE PLAZOS

INFORME DE FISCALIZACIÓN Nº 06

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Departamento - Distrito - Localidad	Caazapá	
Contratista:	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	
Contrato Nº.	31/2020	
Objeto del Contrato:	LPN/SBE Nº 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"	
Fiscalizadores:	UNCA (Convenio Específico c/Univers. Nac. Caaguazú)	
Fecha de suscripción del Contrato:	11-Diciembre-2020	
Monto Total del Contrato en Gs.:	8.616.133.328 Gs.	**Plazo Contrato(Días):** 150 DIAS
Fecha de Entrega del anticipo:	28- Diciembre-2020	Monto del anticipo: [illegible] Porcentaje Nº 22% del M[illegible]
Fecha de inicio de las obras:	5-abril-2021- Orden de Servicio 2	
Fecha de inicio efectivo de las obras:	07-abril-2021 - Orden Servicio 2	Fecha de vencimiento del plazo según Cronograma Plazo Fiscalizado: 03/09/2021

2. CONTABILIZACIONES DE DÍAS DE LLUVIA y OTRAS INCIDENCIAS.

a.	Cantidad de Días Calendario (01-septiembre-2021 al 07-septiembre-2021)	07
b.	Cantidad de días de lluvias registradas (desde el 01-09-2021 al 30-09-2021), Regist. DINAC y Libros de Obra	03
c.	Cantidad de días no trabajados por cuestiones técnicas imputables a la contratista (en días):	0
d.	Suspensión de Plazo por cuestiones técnicas no imputables al contratista (en días):	*
e.	Días de Ejecución Efectiva al mes del Certificado 6 (cuyo periodo tiene en total: 07 días)	04
f.	Condiciones de accesibilidad:	
g.	Otras Observaciones:	

*Importante: Todos los datos anteriores se refieren a las 18 instituciones del Lote N° 6 - Caazapá

b. CONTABILIZACIÓN DE PLAZOS

a. Plazo Contractual (días): **150** días

b. Plazo de Ejecución efectiva (días): **124 días (6° Fiscalización)**

i. Certificado 1: **21 días.**

ii. Certificado 2: **29 días**

iii. Certificado 3: **24 días**

Ing. Fredy O. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

iv. Certificado 4: **28 días**
v. Certificado 5: **18 días**
vi. Certificado 6: **4 días**

c. Plazo Restante (días): **-26 días (respecto al plazo de ejecución original)**

c. **AVANCE FISICO DE OBRAS: 96,1%**
Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

d. **AVANCE FINANCIERO DE OBRAS: 96,1 % = Gs. 6.837.771.509**
Observación: Ninguna aparte de las ya informadas a la Comitente.

e. **MULTAS APLICADAS**
a. Monto del mes: **Gs. 0**

b. Multa Acumulada (%): **0 %**

f. **VIGENCIA DE GARANTIAS**
a. Garantía de cobertura de anticipo: VIGENTE.
i. Cubre hasta 31/Octubre/2021
ii. Empresa de Seguros: ***ROYAL SEGUROS S.A.***
b. Garantía de Cumplimiento de Contrato: VIGENTE.
i. Cubre hasta 31/Marzo/2022.
ii. Empresa de Seguros: ***ROYAL SEGUROS S.A***
c. Seguro contra accidentes de trabajo:
i. Cubre hasta 31/Diciembre/2021.
ii. Empresa de Seguros: ***ROYAL SEGUROS S.A***
d. Seguro contra los riesgos en zona de obras:
i. Cubre hasta 31/Diciembre/2022.
ii. Empresa de Seguros: ***ROYAL SEGUROS S.A***

Coordinador de Fiscalización

Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

	"Construcciones, ampliaciones, reparaciones y terminaciones de 272 establecimientos educativos en el marco de los programas financiados por el fondo de la excelencia de la educación y la investigación"	**Sociedad Constructora Chaco S.A.**
	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.	
	PEDIDO DE PAGO A LA CONTRATISTA	Pariri 1013 c/Tobatí
	PRO – 014	Tel-Fax: (021) 550283

NOTA SCC / LOTE 06 / CONTRATO N.° 31/2020

Asunción, 4 de Octubre de 2021

Señor:
Ing. Fredy Ramírez Villanueva
Coordinador General de Fiscalización
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAAGUAZÚ
Presente

A la atención de :
Coordinador de Fiscalización

Me dirijo a Usted, a fin de remitir el Certificado N° 06 Orden de Servicio N° 02, de las obras del Lote N.° 6, para su aprobación; y solicito, como adjudicataria del Lote mencionado, de la licitación pública nacional – LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN", sea tramitado por vuestra firma el pago correspondiente a dicho certificado, de ₲ 244.984.317 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE), IVA incluido .-

Para los fines correspondientes se adjuntan los siguientes datos y documentos adjuntos:

Datos

1	Objeto del Informe	Solicitud de Pago del Certificado N° 06 Orden de Servicio N° 02	
2	Lote	6	
3	Departamento	Caazapá	
4	Cantidad de Establecimientos	19	
5	Contratista	**SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.**	
6	Fiscalización	UNCA – Universidad Nacional de Caaguazú	
7	N.° de Contrato	N.° 31/2020	
8	Resolución de Adjudicación N.°	Resolución UEPP - MEC N.° 437/2020	
9	Fecha de Contrato	11/12/2020	
10	Fecha de Orden de Servicio 1	28/12/2021	
11	Fecha de Orden de Servicio 2	5/4/2021	
12	Inicio Plazo de Ejecución	7/4/2021	
13	Obras Iniciadas	18	
14	Cronograma Físico Financiero	Aprobado	
15	Descripción de la Obra	"CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"	
16	% de Avance Físico Financiero	96,1% (acumulado) – 4,59% (Del mes)	
17	Plazo de Ejecución Orden de Servicio 1	**30 DIAS**	
18	Plazo de Ejecución Orden de Servicio 2	**150 DIAS**	
19	Monto del Contrato	₲	**8.616.133.328**
20	Monto Planilla Ejecutiva	₲	7.115.600.074
21	Monto Certificado acumulado	₲	6.837.771.509
22	Monto Certificado en el mes	₲	326.645.756
23	Fondo de Reparo	₲	355.780.004
24	Monto neto a pagar	₲	244.984.317

MESA DE ENTRADA
CONVENIO UNCA-MEC
UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recibido por: Franco González

DÍA	MES	AÑO	HORA
05	10	2021	09:30

Documentos

1	Nota de pedido de aprobación de Certificados de la Contratista a la Fiscalización – original
2	Planilla de Resumen de Certificados - Identificando Lote - N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
3	Certificados – Identificando Lote - N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable para control) Aprobado y debidamente firmado
4	Acta de Mediciones de los rubros ejecutados en cada lote, identificando Lote- N.° - mes (Impreso y Digital en archivo editable
5	Registro de Precipitaciones Diarias (DINAC), correspondientes al periodo de certificación. Original.
6	Cronograma Físico-Financiero – debidamente firmado
7	Cronograma de Avance de Obras y Curva de Avance de Obras. – debidamente firmado
8	Libro de Obra – foja correspondiente a la Contratante

PEDIDO DE APROBACION DE CERTIFICADOS A FISCALIZACION (PRO-014)

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mitarovaiche
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

SETIEMBRE 2021 **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**LOTE 06 - CONTRATO N° 31/2020** **LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254**

RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO

CERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
CONTRATO 31/2020	100,00%	8.616.133.328	928.197.534	6.187.402.540	7.115.600.074	91,50%	6.511.125.753	4,59%	326.645.756	96,10%	6.837.771.509

Devolución de Anticipo (20%)	100,00%	1.723.226.666		100%	1.723.226.666	75,57%	1.302.225.151	3,79%	65.329.151	79,36%	1.367.554.302
Para fondo de reparo (5%) ☐	100,00%	430.806.666		100%	355.780.004	91,50%	325.556.288	4,59%	16.332.288	96,10%	341.888.576
Otras deducciones											-
IMPORTE LIQUIDADO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO (A-B)											
MULTAS											
IMPORTE NETO A PAGAR SEGÚN PRESENTE CERTIFICADO(C1-C2-C3)											

ARANIES: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE, IVA INCLUIDO .-

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.897
Fiscal de Obra

Residente de obra

Coordinador de Fiscalización
Ing. Fredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Director de Obra

Ángel Rodríguez González
Rector

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Ministerio de EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

SETIEMBRE 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	LOTE 06 - CONTRATO N° 31/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

RESUMEN POR INSTITUCIÓN

Monto Maximo: 8.616.133.328

ERTIFICADO POR OBRAS EJECUTADAS											
SCUELA BASICA N 256 PBRO JULIO C. DUARTE ORTELLADO - AULA MPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,64%	330.451.971	44.031.053	286.420.918	**330.451.971**	94,60%	312.595.952	0,94%	3.114.634	**95,54%**	**315.710.586**
SCUELA BASICA N° 60 FRAY LUIS DE BOLAÑOS - AULA GENERAL DOBLE	5,61%	399.223.449	51.169.494	348.053.955	**399.223.449**	96,98%	387.184.752	1,20%	4.771.051	**98,18%**	**391.955.803**
OLEGIO NACIONAL DR. FELIPE MOLAS LOPEZ - AULA GENERAL DOBLE	5,69%	404.898.401	51.177.491	353.720.910	**404.898.401**	93,65%	379.207.034	5,08%	20.574.307	**98,74%**	**399.781.341**
OLEGIO NACIONAL DE CAPIITINDY - AULA GENERAL DOBLE	5,83%	414.706.430	51.480.816	363.225.614	**414.706.430**	96,59%	400.573.817	2,17%	9.005.325	**98,76%**	**409.579.142**
SCUELA BÁSICA Nº 941"CONSTANTINO TROCIUK" AULA GENERAL MPLE	3,18%	226.287.485	44.613.981	181.673.504	**226.287.485**	86,36%	195.427.176	6,90%	15.608.246	**93,26%**	**211.035.422**
SCUELA BÁSICA Nº 147 ESTEBAN TOMBOLY - AULA DOBLE 1° CICLO EEB ON SSHH INTEGRADO	6,80%	483.785.756	53.160.341	430.625.415	**483.785.756**	86,14%	416.737.056	11,40%	55.172.426	**97,55%**	**471.909.482**
OLEGIO NACIONAL DON EMILIO NAPOUT - AULA GENERAL SIMPLE	3,14%	223.729.444	41.983.055	181.746.389	**223.729.444**	93,44%	209.051.785	4,08%	8.124.928	**97,52%**	**218.176.713**
SCUELA BÁSICA N° 2189 SAN GERARDO - AULA GENERAL SIMPLE	3,15%	224.123.961	42.377.572	181.746.389	**224.123.961**	88,71%	198.815.781	6,09%	13.647.382	**94,80%**	**212.463.163**
SCUELA BÁSICA Nº 1893 SAN MIGUEL - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SHH INTEGRADO	4,60%	327.485.596	45.525.731	281.959.865	**327.485.596**	95,37%	312.318.359	1,09%	3.583.604	**96,46%**	**315.901.963**
SCUELA BÁSICA Nº 5112(10662) SANTA TERESA - AULA DOBLE 1° CICLO EB CON SSHH INTEGRADO	6,74%	479.550.023	53.327.608	426.222.415	**479.550.023**	94,45%	452.958.777	0,81%	3.868.773	**95,26%**	**456.827.550**
SCUELA BÁSICA N° 4231 SAN ROQUE - AULA GENERAL DOBLE	5,73%	407.555.723	52.213.769	355.341.954	**407.555.723**	94,90%	386.778.628	2,46%	10.038.445	**97,37%**	**396.817.073**
SCUELA BÁSICA Nº 3005 STA. TERESITA DEL NIÑO JESÚS - AULA DOBLE CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,80%	483.948.634	53.323.219	430.625.415	**483.948.634**	87,68%	424.311.432	7,36%	35.623.799	**95,04%**	**459.935.231**
SCUELA BÁSICA N° 1563 SAN ANTONIO - AULA GENERAL SIMPLE	3,21%	228.405.534	42.256.145	186.149.389	**228.405.534**	88,14%	201.326.351	7,13%	16.278.214	**95,27%**	**217.604.565**

el Rodríguez González
Rector

Soc

Ing. Freily G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2.897

SCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - AULA GENERAL IMPLE	3,26%	231.683.053	49.936.664	181.746.389	**231.683.053**	87,72%	203.224.123	5,40%	12.520.051	93,12%	**215.744.174**
SCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - SSHH IFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	**269.306.937**	68,64%	184.858.857	20,58%	55.414.683	89,22%	**240.273.540**
SCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - AULA GENERAL DOBLE	5,74%	408.343.834	58.365.474	349.978.360	**408.343.834**	95,16%	388.599.859	2,21%	9.005.325	97,37%	**397.605.184**
SCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - SSHH DIFERENCIADO E ICLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	**269.306.937**	93,23%	251.077.000	1,48%	3.998.331	94,72%	**255.075.331**
SCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - AULA GENERAL IMPLE	3,42%	243.626.889	49.926.910	193.699.979	**243.626.889**	93,98%	228.965.808	2,42%	5.890.298	96,40%	**234.856.106**
SCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - SSHH IFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	12.841.400	256.465.537	**269.306.937**	94,75%	255.174.638	0,36%	974.097	95,11%	**256.148.735**
SCUELA BÁSICA Nº 998 VIRGEN DE FATIMA - AULA GENERAL DOBLE	5,52%	392.453.027	51.293.067	341.159.960	**392.453.027**	95,61%	375.211.483	1,48%	5.794.976	97,08%	**381.006.459**
SCUELA BÁSICA N°1795 DEFENSORES DEL CHACO - AULA GENERAL OBLE	5,59%	397.420.053	53.510.944	343.909.109	**397.420.053**	87,24%	346.727.085	8,21%	32.636.861	95,46%	**379.363.946**

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2.897
Fiscal de Obra

Representante de obra

Coordinador de Fiscalización

Director de Obra

Ing. Bredy G. Ramirez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mitarendáicha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

SETIEMBRE 2021 ORDEN DE SERVICIO N° 02	LOTE 06 - CONTRATO N° 31/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

Monto Maximo: 8.616.133.328

ESCUELA BÁSICA N 256 PBRO JULIO C. DUARTE ORTELLADO - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,64%	330.451.971	0,13%	0,48%	0,61%	0,31%	0,30%	2,82%
ESCUELA BÁSICA N° 60 FRAY LUIS DE BOLAÑOS - AULA GENERAL DOBLE	5,61%	399.223.449	0,15%	0,58%	0,74%	0,37%	0,37%	3,40%
COLEGIO NACIONAL DR. FELIPE MOLAS LÓPEZ - AULA GENERAL DOBLE	5,69%	404.898.401	0,15%	0,58%	0,75%	0,38%	0,37%	3,45%
COLEGIO NACIONAL DE CAPIITINDY - AULA GENERAL DOBLE	5,83%	414.706.430	0,16%	0,60%	0,77%	0,39%	0,38%	3,53%
ESCUELA BÁSICA Nº 941"CONSTANTINO TROCIUK" - AULA GENERAL SIMPLE	3,18%	226.287.485	0,09%	0,33%	0,42%	0,21%	0,21%	1,93%
ESCUELA BÁSICA Nº 147 ESTEBAN TOMBOLY - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,80%	483.785.756	0,18%	0,70%	0,90%	0,45%	0,44%	4,12%
COLEGIO NACIONAL DON EMILIO NAPOUT - AULA GENERAL SIMPLE	3,14%	223.729.444	0,08%	0,32%	0,41%	0,21%	0,21%	1,91%
ESCUELA BÁSICA N° 2189 SAN GERARDO - AULA GENERAL SIMPLE	3,15%	224.123.961	0,09%	0,32%	0,42%	0,21%	0,21%	1,91%
ESCUELA BÁSICA Nº 1893 SAN MIGUEL - AULA SIMPLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	4,60%	327.485.596	0,12%	0,47%	0,61%	0,31%	0,30%	2,79%
ESCUELA BÁSICA Nº 5112(10662) SANTA TERESA - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,74%	479.550.023	0,18%	0,69%	0,89%	0,45%	0,44%	4,09%
ESCUELA BÁSICA N° 4231 SAN ROQUE - AULA GENERAL DOBLE	5,73%	407.555.723	0,15%	0,59%	0,76%	0,38%	0,37%	3,47%
ESCUELA BÁSICA Nº 3005 STA. TERESITA DEL NIÑO JESÚS - AULA DOBLE 1° CICLO EEB CON SSHH INTEGRADO	6,80%	483.948.634	0,18%	0,70%	0,90%	0,45%	0,44%	4,13%

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2.897

ESCUELA BÁSICA N° 1563 SAN ANTONIO - AULA GENERAL SIMPLE	3,21%	228.405.534	0,09%	0,33%	0,42%	0,21%	0,21%	1,95%
ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - AULA GENERAL SIMPLE	3,26%	231.683.053	0,09%	0,33%	0,43%	0,22%	0,21%	1,97%
ESCUELA BÁSICA Nº 1631 SAN ISIDRO DE LABRADOR - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	0,10%	0,39%	0,50%	0,25%	0,25%	2,30%
ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - AULA GENERAL DOBLE	5,74%	408.343.834	0,15%	0,59%	0,76%	0,38%	0,38%	3,48%
ESCUELA BÁSICA Nº 1941 TUPASY YKUA - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	0,10%	0,39%	0,50%	0,25%	0,25%	2,30%
ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - AULA GENERAL SIMPLE	3,42%	243.626.889	0,09%	0,35%	0,45%	0,23%	0,22%	2,08%
ESCUELA BÁSICA Nº 5131 SAN RAFAEL (AZAMA CUE) - SSHH DIFERENCIADO E INCLUSIVO	3,78%	269.306.937	0,10%	0,39%	0,50%	0,25%	0,25%	2,30%
ESCUELA BÁSICA Nº 998 VIRGEN DE FÁTIMA - AULA GENERAL DOBLE	5,52%	392.453.027	0,15%	0,57%	0,73%	0,37%	0,36%	3,35%
ESCUELA BÁSICA N°1795 DEFENSORES DEL CHACO - AULA GENERAL DOBLE	5,59%	397.420.053	0,15%	0,57%	0,74%	0,37%	0,37%	3,39%

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2.897
Fiscal de Obra

Roque Ramírez Parquet
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 1153
Residente de Obra
Sociedad Constructora Chaco S.A.

Coordinador de Fiscalización

Ing. Freddy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Director de Obra

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S

CURVA DE AVANCE GENERAL – RESUMEN DEL PROYECTO

TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mbosyvoka
Ministerio de EDUCACIÓN · CIENCIAS

■ TETÃ REKUÁI
■ GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA - UNIDAD EJECUTORA DE PROGRAMAS y PROYECTOS

CERTIFICADO DE OBRAS N° 06 SETIEMBRE 2021 **ORDEN DE SERVICIO N° 02**	**EMPRESA CONTRATISTA:** SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A. LOTE 06 - CONTRATO N° 31/2020 LPN/SBE N°02/2020 - ID 360.254

CURVA DE AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

DETALLE	ORDEN DE SERVICIO 1	MES 1 DE OBRA	MES 2 DE OBRA	MES 3 DE OBRA	MES 4 DE OBRA	MES 5 DE OBRA	MES 6 DE OBRA
% Mensual Previsto	2,70%	10,27%	13,19%	6,65%	6,54%	60,65%	29,53%
% Acumulado PREVISTO	2,70%	12,97%	26,16%	32,81%	39,35%	100,00%	100,00%
DIAS LABORABLES	0	24	31	30	31	31	7
DIAS NO TRABAJADOS	0	3	2	6	3	13	3
% de ajuste	No APLICA	1,28%	0,85%	1,33%	0,63%	25,44%	12,66%
% Acumulado AJUSTADO	2,70%	11,69%	24,55%	29,34%	35,32%	79,47%	91,57%
% Mensual Ejecutado	13,04%	11,62%	10,32%	21,58%	15,90%	19,05%	4,59%
% Acumulado EJECUTADO	13,04%	24,66%	34,98%	56,56%	72,46%	91,50%	96,10%
Certificacion Mensual Gs	192.121.202	822.727.880	1.861.333.053	2.334.579.996	2.799.757.493	7.115.600.074	

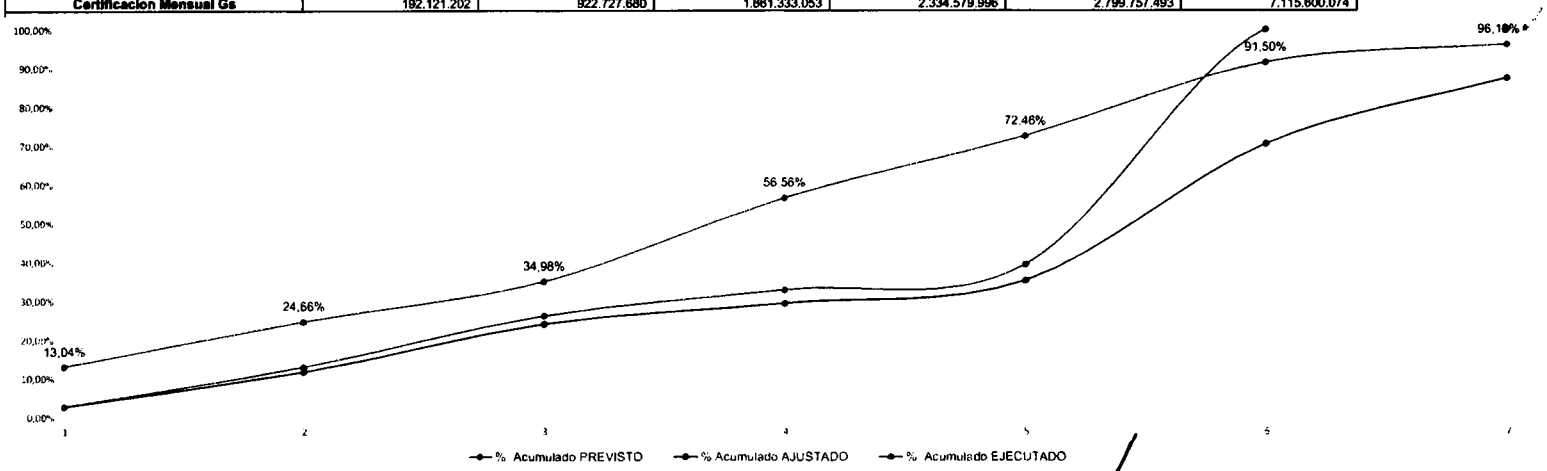

Fiscal de Obra

Residente de obra

Coordinador de Fiscalización

Director de Obra

Ing. Luis M. Gulino C.
Representante Legal
Sociedad Constructora Chaco S.A

Carlos A. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2.897

Ing. Fredy G. Ramírez V.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector

FORMULARIO N° 09

HOJAS DE COSTO DE INVERSIÓN

Lugar: Caazapa

d	Ministerio de Educación y Ciencias
l Jerarq.	Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos
ición	Coordinación de Proyectos de Infraestructura
dencia	

Liquidación de Costos por Administración

Por Materiales Gs.	
Por Mano de Obra Gs.	
Por Gastos Indirectos Gs.	
Costo Total Gs.	

Por Construcción Gs.	7.115.600.074
Por Instalación en Gral. Gs.	
Por Equipam. En Gral Gs.	
Total Gral. De la Obra Gs.	7.115.600.074

a.		

Obra	LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN"
Proyecto Nº de Contrato	Contrato Nº 31/2020

Fecha de Iniciación	7/4/2021
Fecha de Terminación	

tem	Fecha	Tipo	Nº	Certificado	Descripcion	Total
1		FACTURA		Certificado Nº 06 Orden de Servicio Nº 02	LPN/SBE N° 02/2020 "CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES, REPARACIONES Y TERMINACIONES DE 272 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS FINANCIADOS POR EL FONDO DE LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN" - Contrato N° 31/2020	244.984.317
UARANIES: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE, IVA INCLUIDO .-						244.984.317

ación: **Monto Maximo del Contrato: 8.616.133.328**

Carlos I. González Ayala
Arquitecto
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 2.897

Fiscal de Obras del MEC

Jefe de Dpto. de Patrimonio

Director de Area Responsable

Ing. Fredy G. Ramírez P.
Coordinador de Fiscalización
UNCA

Ángel Rodríguez González
Rector
