TEKOMBO'E HA TEMBIKUAA
Mitondeha
Ministerio de
EDUCACIÓN y CIENCIAS

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - MEC

CERTIFICADO DE OBRAS
NOVIEMBRE 2022

EMPRESA CONTRATISTA: SENDERO S.A.
CONTRATO N° 21/2021
LPN N° 05/2021 - ID 388.700

ESCUELA BÁSICA Nº 4661 "BASILIO MANCUELLO RIVEROS" - GUARAMBARÉ

REPARACION BLOQUE DE 5 AULAS

ITEM DE CONTRATO	ITEMS	DESCRIPCION	Unidad de medida	Cantidad total	Precio unitario Contrato (IVA incl)	Precio total	Avance físico			Monto Certificado		
							Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Total
	1	OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS										
	1.1	**Preparación de la Obra**										
	1.1.1	Vallado perimetral protección de obras de... (madera/chapa)	m2	84,00	170.000	14.280.000	84,00	-	84,00	14.280.000	-	14.280.000
	1.2	**Remociones y otros**					-	-	-			
	1.2.3	Desmontaje de tejas, tejuelones y/o tejuelitas de techo con recuperación de materiales en Planta Baja y/o Planta Alta	m2	367,00	50.000	18.350.000	367,00	-	367,00	18.350.000	-	18.350.000
	1.2.17	Remoción de revoque	m2	24,00	13.000	312.000	24,00	-	24,00	312.000	-	312.000
	1.2.18	Remoción de contrapiso	m2	70,00	15.000	1.050.000	70,00	-	70,00	1.050.000	-	1.050.000
	1.2.19	Remoción de pisos	m2	70,00	30.000	2.100.000	70,00	-	70,00	2.100.000	-	2.100.000
	1.7	**Aislación asfáltica de muros horizontal y vertical con panderete y aislación de losa**			0		-	-	-	-	-	-
	1.7.5	Colocación de membrana asfáltica 4mm. sobre techo de losas, chapa, tejas, tejuelón	m2	367,00	105.000	38.535.000	367,00	-	367,00	38.535.000	-	38.535.000
	1.8	**Muro de elevación**			0		-	-	-	-	-	-
	1.8.12	Envarillado de muros por rajaduras	ml	17,50	47.200	826.000	17,50	-	17,50	826.000	-	826.000
	1.10	**Techos**			0		-	-	-	-	-	-
	1.10.7	Reparación de techos con estructura de madera (cambio total de tejas)	m2	367,00	250.000	91.750.000	367,00	-	367,00	91.750.000	-	91.750.000
	1.11	**Revoques**			0		-	-	-	-	-	-
	1.11.1	Interior y Exterior de muros a 1 capa	m2	24,00	54.900	1.317.600	24,00	-	24,00	1.317.600	-	1.317.600
	1.12	**Alfeizar de ventana**			0		-	-	-	-	-	-
	1.12.2	De moldura lineal en balancines y puertas	ml	5,00	38.000	190.000	5,00	-	5,00	190.000	-	190.000
	1.13	**Contrapiso**					-	-	-	-	-	-
	1.13.1	Contrapiso de hormigón de cascotes 10 cm	m2	70,00	62.600	4.382.000	70,00	-	70,00	4.382.000	-	4.382.000
	1.14	**PISOS**			0		-	-	-	-	-	-
	1.14.1	Piso de mosaico calcáreo color	m2	70,00	160.000	11.200.000	70,00	-	70,00	11.200.000	-	11.200.000
	1.15	**Zócalos**			0		-	-	-	-	-	-
	1.15.1	Zócalos calcareo	ml	26,00	55.000	1.430.000	26,00	-	26,00	1.430.000	-	1.430.000
	1.16	**Aberturas de Madera, Marcos y Contramarcos**			0		-	-	-	-	-	-
	1.16.1	De 0,90 x 2,10 tablero con provisión de herrajes y cerraduras	m2	8,00	385.000	3.080.000	3,80	4,20	8,00	1.463.000	1.617.000	3.080.000

Arq. Julio R. Elizeche
Infraestructura - MEC
Cel.: (0986) 450 - 245

SENDERO S.A.
Carmelo Desv[illegible]s
Representante Legal

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS

1.16.8	Provisión y colocación de contramarco de madera de cedro de 3 cm	ml	54,00	33.000	1.782.000	54,00	-	54,00	1.782.000	-	1.782.000
1.18	**Pinturas**			0		-	-	-	-	-	-
1.18.1	De paredes revocadas al látex	m2	804,00	57.000	45.828.000	804,00	-	804,00	45.828.000	-	45.828.000
1.18.3	De pilares revocados al látex	m2	42,00	57.000	2.394.000	42,00	-	42,00	2.394.000	-	2.394.000
1.18.6	De abertura de madera al barniz	m2	16,00	62.000	992.000	16,00	-	16,00	992.000	-	992.000
1.18.10	De abertura metálica con esmalte sintético	m2	57,60	70.000	4.032.000	57,60	-	57,60	4.032.000	-	4.032.000
1.18.13	De tejuelón y maderamen al barniz, con tratamiento de fungicida	m2	367,00	63.000	23.121.000	367,00	-	367,00	23.121.000	-	23.121.000
1.18.16	De canaleta y bajada con esmalte sintético	m2	17,00	70.000	1.190.000	-	17,00	17,00	-	1.190.000	1.190.000
1.19	**Revestido de azulejos**					-	-	-			
1.19.2	Revestido de azulejos 20 x 20	m2	1,00	195.000	195.000	1,00	-	1,00	195.000	-	195.000
1.20	**Vidrios dobles**					-	-	-			
1.20.1	Vidrios dobles 4mm	m2	5,40	320.000	1.728.000	5,40	-	5,40	1.728.000	-	1.728.000
1.23	**Desagüe pluvial - provisión y colocación**					-	-	-	-	-	-
1.23.1	Canaletas y caños de bajada - chapa galvanizada N° 24	ml	41,90	132.000	5.530.800	41,90	-	41,90	5.530.800	-	5.530.800
1.27	**Líneas embutidas**			0		-	-	-	-	-	-
1.27.1	Cable multifilar 2mm², ducto de 3/4"	ml	144,00	11.300	1.627.200	144,00	-	144,00	1.627.200	-	1.627.200
1.27.2	Cable multifilar 4mm², ducto de 3/4"	ml	14,00	15.800	221.200	14,00	-	14,00	221.200	-	221.200
1.31	**Bocas de Instalación Eléctrica**					-	-	-			
1.31.1	Boca de iluminación con interruptor (cableado hasta 6m de tablero)	Unidad	20,00	160.000	3.200.000	20,00	-	20,00	3.200.000	-	3.200.000
1.31.3	Boca tomacorriente (cableado hasta 6m del tablero)	Unidad	6,00	160.000	960.000	6,00	-	6,00	960.000	-	960.000
1.31.6	Boca para tomacorriente con conductor a tierra, hasta 6 m	Unidad	2,00	170.000	340.000	2,00	-	2,00	340.000	-	340.000
1.33	**Artefactos de Iluminación - Provisión y colocación - Montajes de artefactos de iluminación**			0		-	-	-	-	-	-
1.33.1	Artefactos fluorescentes led de 1 x 18 w (blanco)	Unidad	11,00	155.000	1.705.000	11,00	-	11,00	1.705.000	-	1.705.000
1.33.2	Artefactos fluorescentes led de 2 x 18 w (blanco)	Unidad	10,00	285.000	2.850.000	10,00	-	10,00	2.850.000	-	2.850.000
1.33.3	Artefactos fluorescentes led de 3 x 18 w (blanco)	Unidad	4,00	410.000	1.640.000	4,00	-	4,00	1.640.000	-	1.640.000
1.34	**Sustituciones**			0		-	-	-	-	-	-
1.34.5	Llave de ventilador de techo metálica con 7 velocidades	Unidad	10,00	115.000	1.150.000	10,00	-	10,00	1.150.000	-	1.150.000
1.35	**Desmontajes de artefactos eléctricos**			0		-	-	-	-	-	-
1.35.1	De artefactos fluorescentes sin recuperación de material.	Unidad	25,00	24.000	600.000	25,00	-	25,00	600.000	-	600.000
1.41	Otros			0		-	-	-	-	-	-
1.41.3	Reparación y mantenimiento de Pizarra Acrílica	Unidad	5,00	150.000	750.000	5,00	-	5,00	750.000	-	750.000
1.42	**Limpieza**					-	-	-			
1.42.1	Limpieza final	m2	183,00	12.000	2.196.000	100,00	83,00	183,00	1.200.000	996.000	2.196.000
1.42.2	Retiro de escombros en contenedor	m3	73,00	40.000	2.920.000	73,00	-	73,00	2.920.000	-	2.920.000
					295.754.800				291.951.800	3.803.000	295.754.800

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS ★ REPUBLICA DEL PARAGUAY ★ Dirección de Infraestructura

Arq. Julio [illegible] Elizeche
Coordinador de Infraestructura - MEC
Tel. (021) 450 - 245

SENDERO S.A.
Carmen Desvars
Representante Legal

ESC. BÁS. Nº 4661 BASILIO MANCUELLO (GUARAMBARÉ)

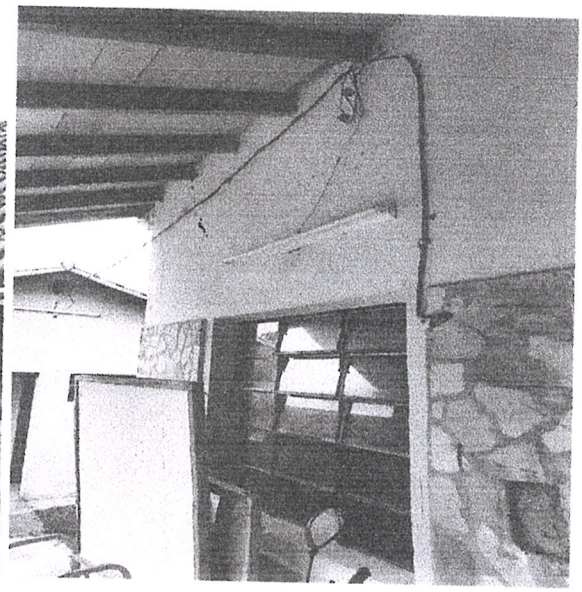

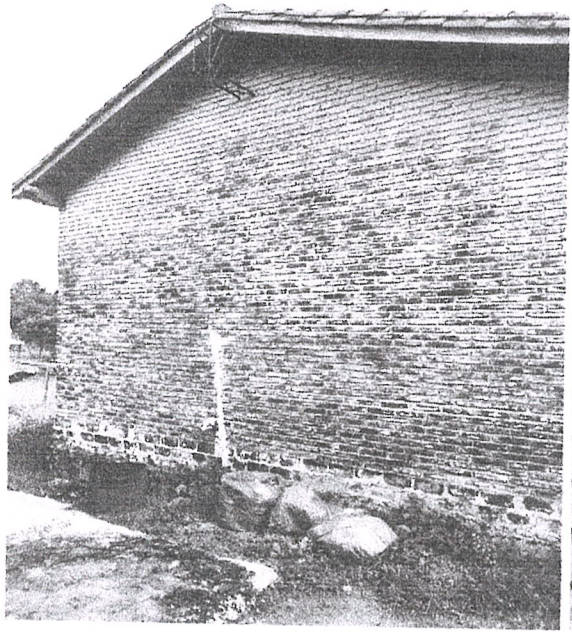

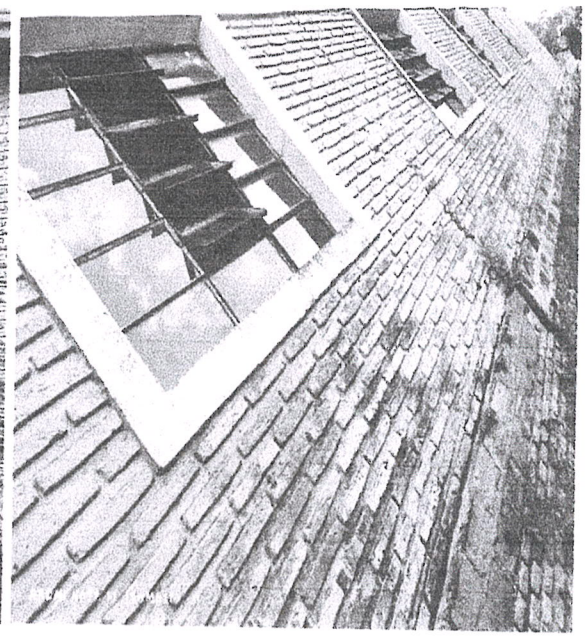

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

Arq. Julio Rodríguez
Infraestructura - MEC
C.I. (0608) 4.0 - 24

GENERAL
Carmen Rosas
Representante Legal

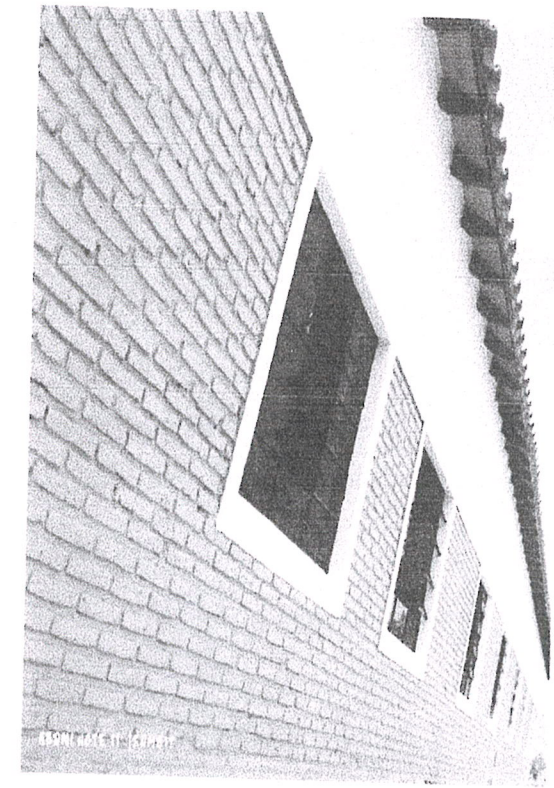

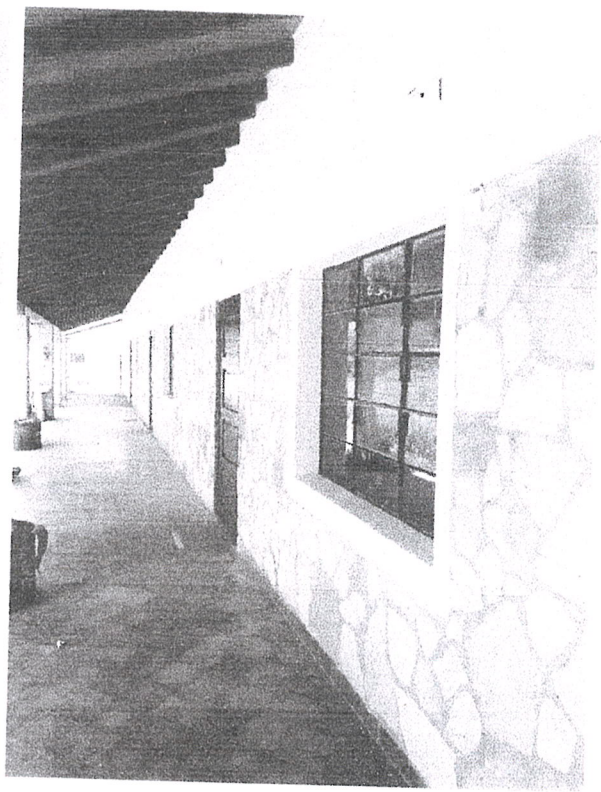

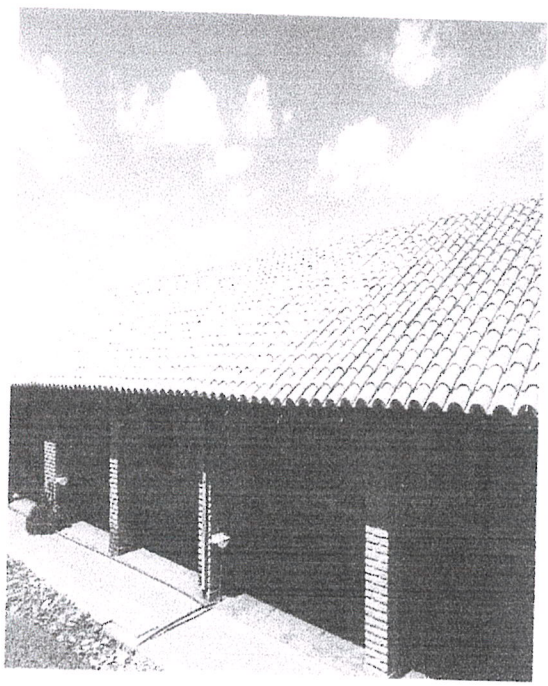

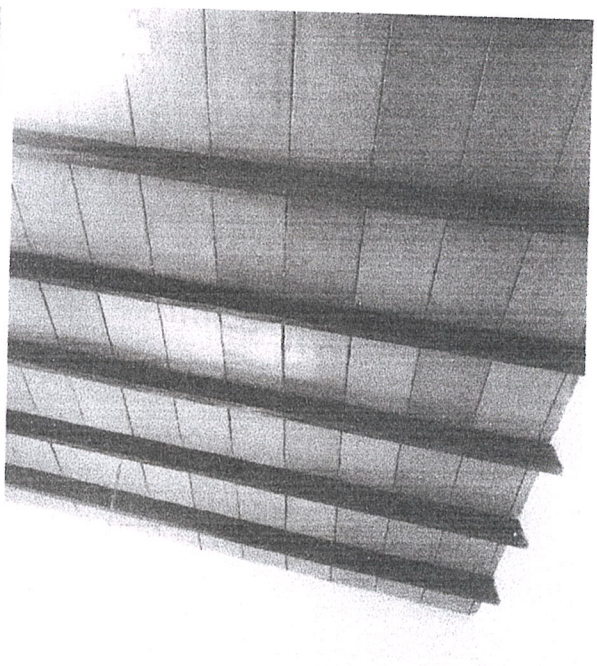

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Dirección de Infraestructura

Representante Legal

Arq. Julio [illegible] Elizeche
Inf[illegible]
Ca[illegible] 245

LPN Nº 05/ 2021 ID N° 388.700 Contratista: SENDERO S.A

Establecimiento Escolar	**ESCUELA BÁSICA N° 4661 BASILIO MANCUELLO RIVEROS**
Distrito – Localidad	GUARAMBARE – CENTRO URBANO – CENTRAL

10. DOCUMENTACIÓN y REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍAS DEL INICIO DE OBRAS: 16/08/2022- PLAZO 140 DIAS

ANTES:	AULA EN PROCESO DE PINTURA	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE ARTEFACTOS Y LAMPARAS
PROCESO	FACHADA CON TEJAS NUEVAS	FOTO DE PROCESO : DEFINICION PARA CAMBIO DE PISO
ANTES : HUNDIMIENTO DE PISO	ESCOMBROS A SER RETIRADOS – FOTO DE PROCESO- EL ESCOMBRO FUE RETIRADO	PROCESO

VALLADO: EN EPOCA DE CLASE SE REALIZO EL TRABAJO DE REPARACIONES	BLOQUE REPARADO	AULAS REPARADAS, PINTURA E INSTALACIONES ELECTRICA

Arq. Julio C. Elizeche
Infraestructura - MEC
Cel.: (0986) 450 - 245

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

 FACHADA POSTERIOR . NUEVA CARA	COLOCACION DE VIDRIOS	AULA PINTURA . TECHO
PROCESO COLOCACION DE CANALETAS- 10 ML MAS QUE EN PLANILLA	HOY: GALERÍA, CANALETA PINTADA Y RETIRO DE ESCOMBROS	TRABAJOS PISO AL FONDO
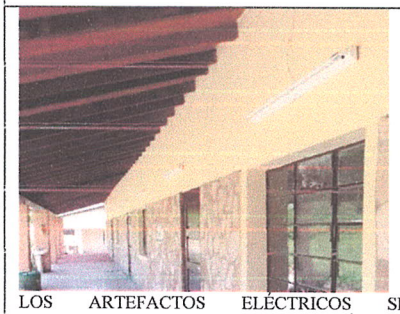 LOS ARTEFACTOS ELÉCTRICOS SE COLOCARON EN LA PARED DE GALERÍA	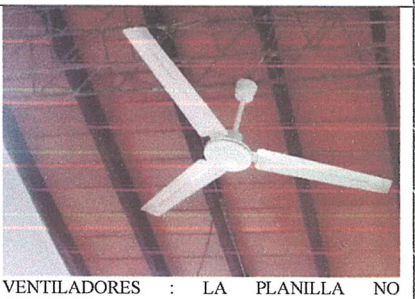 VENTILADORES : LA PLANILLA NO CONTEMPLA COMPRA DE LOS MISMOS	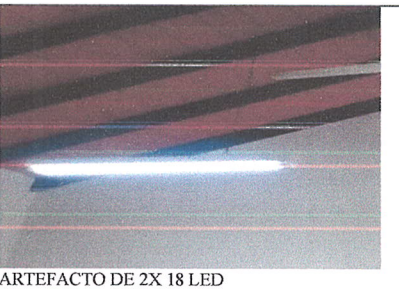 ARTEFACTO DE 2X 18 LED

FISCAL DE OBRAS
Dirección de Infraestructura

Elaborado por el Arq. Julio R. Elizeche

Arq. Julio R. Elizeche
Infraestructura - MEC
Cel.: (0985) 450 - 245

Revisado por la Lic. Gloria Candía

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.
