APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

— Apolat —

Asunción, 04 de mayo de 2026.

Arq. Bertha Pastore
Dirección de Infraestructura Física
Corte Suprema de Justicia

Presente

Ref.: PRESENTACION DE CERTIFICADO DE OBRA Nº 05.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL P.A.C. Nº 86/2024. CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YAU – PLURIANUAL – ID 457449.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en el marco del contrato de referencia, con el objeto de presentarle el Certificado de Obra Nº 05, con la correspondiente aprobación de la fiscalización.

Se adjuntan 4 (cuatro) copias del certificado.

Sin otro particular, me despido atentamente.

Ing. Osvaldo Aponte Rodríguez
Representante Legal
APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

RECIBIDO
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CSJ
Fecha 04 MAYO 2026
ME: 951 Hora: 12:48

Fátima Lenguaza
DIF - CSJ

RECIBIDO
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
Ent. Nº 292 Fecha 5/5 Firma: Deisy Escobar.

(+595 21) 208 334 / 208 357 / 212 034
(+595 981) 257 801
www.apontelatorre.com.py
info@apontelatorre.com.py
J.F. Kennedy 960 c/ Teodoro S. Mongelós
Asunción, Paraguay

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM - Nº51/2025

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

CERTIFICADO DE OBRA N°5
ABRIL-2026

RESUMEN GENERAL

RESUMEN DE CERTIFICADO DE OBRAS Nº 5

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Circunscripcion Judicial: Concepción					INICIO DE OBRAS:	01/12/2025		
Empresa Contratista: APONTE LATORRE S.A.					PERIODO :	01/04/2026 al 30/04/2026		
Contrato Nº: 51/2025								
Monto Total del Contrato:					Gs.	25.367.351.736		
Descripción	CANTIDADES EJECUTADAS				MONTO EN GUARANIES			
	Monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado anterior	Certificado actual	Certificado acumulado	
Total	25.367.351.736	5,30%	0,98%	6,28%	1.345.612.888	247.765.876	1.593.378.764	
TOTAL ACOPIOS		0,00%	0,00%	0,00%	0	0	0	
TOTAL Certificado Nº 6					1.345.612.888	247.765.876	1.593.378.764	
					ESTE CERTIFICADO:	247.765.876		

DEDUCCIONES							
Concepto	Monto de contrato	% acumulado anterior	Ejecutado en el periodo	Acumulado actual	Certificado acumulado antelor	Certificado actual	Certificado acumulado
Devolución del Anticipo (20%)	5.073.470.347	5,30%	0,98%	6,28%	269.122.578	49.553.175	318.675.753
Retención Para Fondo de Reparo (5%)	1.268.367.587	5,30%	0,98%	6,28%	67.280.644	12.388.294	79.668.938
					Monto en Factura:	198.212.701	
					RETENCIONES ACUMULADAS PARA FONDO DE REPAROS:	79.668.938	

Saldo:	23.773.972.972

MULTAS	
Concepto de la multa	Monto

Contratista	Fiscalizacion	Supervision de Infraestructura Fisica	Direccion de Infraestructura Fisica

APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Ing. Kevin Alexander Ferreira
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

ARQ. BERTHA PASTORE
DIRECTORA INTERINA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PLANILLAS DE CERTIFICADO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025

Periodo: 01/04/2026 al 30/04/2026

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 5 (CINCO)

Item	Descripción de los Rubros	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
						Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
1	TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS	Unidad Medida Global									
1.1	Limpieza de terreno	metros cuadrados	5.760,00	1.426	8.213.760	8.213.760	100,00%	-	0,00%	8.213.760	100,00%
1.2	Gastos de movilización y ejecución durante el periodo de obra. Ver Items de las Especificaciones Técnicas.	Unidad Medida Global	1,00	691.672.589	691.672.589	691.672.589	100,00%	-	0,00%	691.672.589	100,00%
2	TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS	Unidad Medida Global						-			
2.1	Replanteo y marcación de obra	metros cuadrados	5.760,00	9.955	57.340.800	17.202.240	30,00%	5.734.080	10,00%	22.936.320	40,00%
3	MOVIMIENTO DE SUELO - EXCAVACIÓN	Unidad Medida Global						-			
3.1	Desbroce de terreno	metros cuadrados	5.760,00	1.798	10.356.480	10.356.480	100,00%	-	0,00%	10.356.480	100,00%
3.2	Área de implantación del edificio.	metros cubicos	298,00	36.631	10.916.038	10.916.038	100,00%	-	0,00%	10.916.038	100,00%
3.3	En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	metros cubicos	1.110,00	36.631	40.660.410	20.634.242	50,75%	-	0,00%	20.634.242	50,75%
3.4	Excavación para Tanque inferior	metros cubicos	333,00	45.773	15.242.409	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.5	Excavación para planta de tratamiento	metros cubicos	118,00	45.773	5.401.214	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
3.6	Excavación para caja de ascensor	metros cubicos	14,00	45.773	640.822	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	MOVIMIENTO DE SUELO - RELLENO Y COMPACTACIÓN	Unidad Medida Global						-			
4.1	Área de implantación del edificio.	metros cubicos	1.282,00	38.756	49.685.192	44.714.735	90,00%	-	0,00%	44.714.735	90,00%
4.2	En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	metros cubicos	2.027,00	38.756	78.558.412	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5	CIMENTACIONES - PLANTA SUBSUELO	Unidad Medida Global						-			
5.1	Pilote Ø50 de HoAo	metros cubicos	32,00	2.023.179	64.741.728	64.741.728	100,00%	-	0,00%	64.741.728	100,00%
5.2	Cabezales y Arranques de HoAo	metros cubicos	8,00	1.798.381	14.387.048	14.387.048	100,00%	-	0,00%	14.387.048	100,00%
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	metros cubicos	6,00	1.517.384	9.104.304	9.104.304	100,00%	-	0,00%	9.104.304	100,00%
5.4	Losas de Ho Ao maciza	metros cubicos	11,00	2.809.970	30.909.670	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
5.5	Tanque inferior de HoAo	metros cubicos	73,00	2.809.970	205.127.810	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Ing. Kevin Alexander Ferreira
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

ARQ. BERTHA PASTORE
DIRECTORA INTERINA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025

Periodo: 01/04/2026 al 30/04/2026

Item	Descripción de los Rubros	CERTIFICADO DE OBRA Nº: 5 (CINCO)								
		Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
						Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
6	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA BAJA	Unidad Medida Global						-			
6.1	Pilote Ø50 de HoAo	metros cubicos	100,00	2.023.179	202.317.900	202.317.900	100,00%	-	0,00%	202.317.900	100,00%
6.2	Cabezales y Arranques de HoAo	metros cubicos	35,00	1.798.381	62.943.335	62.943.335	100,00%	-	0,00%	62.943.335	100,00%
6.3	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	11,00	2.809.970	30.909.670	22.479.760	72,73%	5.338.943	17,27%	27.818.703	90,00%
6.4	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	70,00	2.809.970	196.697.900	98.348.950	50,00%	59.009.370	30,00%	157.358.320	80,00%
6.5	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	14,00	3.034.768	42.486.752	-	0,00%	42.486.752	100,00%	42.486.752	100,00%
6.6	Losas de Ho Ao maciza	metros cubicos	165,00	2.809.970	463.645.050	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.7	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	3,00	2.641.372	7.924.116	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
6.8	Muro de HoAo	metros cubicos	25,00	2.809.970	70.249.250	42.149.550	60,00%	28.099.700	40,00%	70.249.250	100,00%
7	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PRIMER PISO	Unidad Medida Global						-			
7.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	35,00	2.809.970	98.348.950	25.430.229	25,86%	28.043.501	28,51%	53.473.730	54,37%
7.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	78,00	2.809.970	219.177.660	-	0,00%	21.917.766	10,00%	21.917.766	10,00%
7.3	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	185,00	3.034.768	561.432.080	-	0,00%	56.143.208	10,00%	56.143.208	10,00%
7.4	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	6,00	2.641.372	15.848.232	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - AZOTEA	Unidad Medida Global						-			
8.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	28,00	2.809.970	78.679.160	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	72,00	2.809.970	202.317.840	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8.3	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	138,00	3.034.768	418.797.984	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
8.4	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	3,00	2.641.372	7.924.116	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA TECHO	Unidad Medida Global						-			
9.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	15,00	2.809.970	42.149.550	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	22,00	2.809.970	61.819.340	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
9.3	Losas de Ho Ao aligerada y maciza	metros cubicos	40,00	3.034.768	121.390.720	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - ESTRUCTURAS ADICIONALES	Unidad Medida Global						-			
10.1	Pisos exteriores (estacionamiento/explanada)	metros cubicos	431,00	2.616.915	1.127.890.365	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10.2	Zapatas y pilares de estacionamientos y pergolas	metros cubicos	9,00	2.561.235	23.051.115	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%

APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Ing. Kevin Alexander Ferreira
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

ARQ. BERTHA PASTORE
DIRECTORA INTERINA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025 — **Período: 01/04/2026 al 30/04/2026**

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 5 (CINCO)

Item	Descripción de los Rubros	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
						Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
120	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - TOMACORRIENTE - PUESTOS DE TRABAJO - TOMA Schuko - SECAMANO - PLANTA BAJA							-			
120.1	Conductor 2x2,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	840,00	13.524	11.360.160	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.2	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar F-N	Metro lineal	3.520,00	4.154	14.622.080	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.3	Conductor 1x2,5 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	1.760,00	4.154	7.311.040	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.4	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	unidad	35,00	32.369	1.132.915	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.5	Caja de conexion octogonal de plastico	unidad	80,00	5.072	405.760	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.6	Caja de llave rectangular de plastico	Metro lineal	175,00	5.072	887.600	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.7	Electroducto corrugado antillama 1"	unidad	920,00	4.283	3.940.360	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.8	Toma corriente Tipo Euroamericano c/ Tierra	unidad	175,00	61.987	10.847.725	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.9	Toma corriente Tipo Schuko	unidad	1,00	101.433	101.433	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
120.10	Accesorios de montaje.	Unidad Medida Global	1,00	1.273.853	1.273.853	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
121	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN - RECUPERADORES DE CALOR - EXTRACTORES - BOMBA DE DESAGOTE - PLANTA BAJA							-			
121.1	Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	180,00	18.164	3.269.520	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
121.2	Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	180,00	7.515	1.352.700	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
121.3	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	870,00	16.906	14.708.220	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
121.4	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	870,00	7.601	6.612.870	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
121.5	Caja de conexión octogonal de plástico	unidad	35,00	5.072	177.520	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
121.6	Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	175,00	2.593	453.775	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
121.7	Accesorios de montaje.	Unidad Medida Global	1,00	1.352.436	1.352.436	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
122	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL - PLANTA BAJA							-			
122.1	Bandeja portacable ZI 450 mm	Metro lineal	5,00	394.460	1.972.300	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
122.2	Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	70,00	315.568	22.089.760	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
122.3	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	unidad	1,00	1.310.502	1.310.502	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
123	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PLANTA BAJA							-			
123.1	Caja de conexion octogonal de plastico	unidad	30,00	5.072	152.160	-	0,00%	152.160	100,00%	152.160	100,00%
123.2	Caja plastica de embutir 20x20	unidad	10,00	32.369	323.690	-	0,00%	323.690	100,00%	323.690	100,00%
123.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200,00	1.771	354.200	-	0,00%	354.200	100,00%	354.200	100,00%
123.4	Accesorios, alambres para sujecion	Metro lineal	1,00	162.506	162.506	-	0,00%	162.506	100,00%	162.506	100,00%

APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Ing. Kevin Alexander Ferreira
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

Arq. BERTHA PASTORE
DIRECTORA INTERINA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025

Periodo: 01/04/2026 al 30/04/2026

CERTIFICADO DE OBRA Nº: 5 (CINCO)

Item	Descripción de los Rubros	Unid.	Cantidad	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Acumulado Anterior		Presente Certificado		Acumulado Actual	
						Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%	Monto (Gs.)	%
206	ASCENSORES - SALA DE CONTROL Y OTROS							-			
206.1	Instalación de software de monitoreo en computadora	Unidad Medida Global	1,00	2.785.167	2.785.167	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.2	Instalación de intercomunicadores	unidad	2,00	3.249.362	6.498.724	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.3	Interconexión de cámaras de vídeo, cableado estructurado en cable movil para conexión de camara de la cabina.	unidad	2,00	6.498.724	12.997.448	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.4	Asistencia técnica al integrador electrónico para la inclusión de los controladores de los ascensores al BMS del Edificio	Unidad Medida Global	1,00	5.106.140	5.106.140	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.5	Manuales de operación y mantenimiento en idioma español	Unidad Medida Global	1,00	1.114.067	1.114.067	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
206.6	Capacitación a funcionarios para operación y control del sistema	Unidad Medida Global	1,00	1.392.584	1.392.584	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
				Total por Grupo:	25.367.351.736	1.345.612.888	5,30%	247.765.876	0,98%	1.593.378.764	6,28%

APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Ing. Kevin Alexander Ferreira
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

ARQ. BERTHA PASTORE
DIRECTORA INTERINA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTAS DE MEDICIÓN

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025 **Periodo:** 01/04/2026 al 30/04/2026

PLANILLA DE MEDICIONES

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Contrato	Cantidades			Certificado de Obra en %		
			Cantidad	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
1	TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS								
1.1	Limpieza de terreno	metros cuadrados	5.760,00	5.760,00		5.760,00	100,00%	0,00%	100,00%
1.2	Gastos de movilización y ejecución durante el periodo de obra. Ver Items de las Especificaciones Técnicas.	Unidad Medida Global	1,00	1,00		1,00	100,00%	0,00%	100,00%
2	TRABAJOS PRELIMINARES OBRAS PROVISORIAS								
2.1	Replanteo y marcación de obra	metros cuadrados	5.760,00	1.728,00	576,00	2.304,00	30,00%	10,00%	40,00%
3	MOVIMIENTO DE SUELO - EXCAVACIÓN			0,00		0,00			
3.1	Desbroce de terreno	metros cuadrados	5.760,00	5.760,00		5.760,00	100,00%	0,00%	100,00%
3.2	Área de implantación del edificio.	metros cubicos	298,00	298,00		298,00	100,00%	0,00%	100,00%
3.3	En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	metros cubicos	1.110,00	563,30		563,30	50,75%	0,00%	50,75%
3.4	Excavación para Tanque inferior	metros cubicos	333,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.5	Excavación para planta de tratamiento	metros cubicos	118,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
3.6	Excavación para caja de ascensor	metros cubicos	14,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
4	MOVIMIENTO DE SUELO - RELLENO Y COMPACTACIÓN								
4.1	Área de implantación del edificio.	metros cubicos	1.282,00	1.153,75		1.153,75	90,00%	0,00%	90,00%
4.2	En áreas de pisos, camineros, veredas, rampas y escaleras exteriores hasta cota de contrapiso.	metros cubicos	2.027,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5	CIMENTACIONES - PLANTA SUBSUELO								
5.1	Pilote Ø50 de HºAº	metros cubicos	32,00	32,00		32,00	100,00%	0,00%	100,00%

APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Ing. Kevin Alexander Ferreira
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025

Periodo: 01/04/2026 al 30/04/2026

PLANILLA DE MEDICIONES

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Contrato	Cantidades			Certtificado de Obra en %		
			Cantidad	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
5.2	Cabezales y Arranques de HoAo	metros cubicos	8,00	8,00		8,00	100,00%	0,00%	100,00%
5.3	Vigas de Fund y Equilibrio de Ho Ao	metros cubicos	6,00	6,00		6,00	100,00%	0,00%	100,00%
5.4	Losas de Ho Ao maciza	metros cubicos	11,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
5.5	Tanque inferior de HoAo	metros cubicos	73,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA BAJA								
6.1	Pilote Ø50 de HoAo	metros cubicos	100,00	100,00		100,00	100,00%	0,00%	100,00%
6.2	Cabezales y Arranques de HoAo	metros cubicos	35,00	35,00		35,00	100,00%	0,00%	100,00%
6.3	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	11,00	8,00	1,90	9,90	72,73%	17,27%	90,00%
6.4	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	70,00	35,00	21,00	56,00	50,00%	30,00%	80,00%
6.5	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00%	100,00%	100,00%
6.6	Losas de Ho Ao maciza	metros cubicos	165,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6.7	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6.8	Muro de HoAo	metros cubicos	25,00	15,00	10,00	25,00	60,00%	40,00%	100,00%
7	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PRIMER PISO								
7.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	35,00	9,05	9,98	19,03	25,86%	28,51%	54,37%
7.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	78,00	0,00	7,80	7,80	0,00%	10,00%	10,00%
7.3	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	185,00	0,00	18,50	18,50	0,00%	10,00%	10,00%
7.4	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	6,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - AZOTEA								
8.1	Pilares de Ho Ao	metros cubicos	28,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8.2	Vigas de Ho Ao	metros cubicos	72,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	Losas de Ho Ao aligerada	metros cubicos	138,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8.4	Escalera de Ho Ao	metros cubicos	3,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO - PLANTA TECHO								

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Ing. Kevin Alexander Ferreira
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

Licitación: 457449 - CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE YBY YA´U – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM

Contratista: APONTE LATORRE S.A.

Contrato Nº: 51/2025 **Período:** 01/04/2026 al 30/04/2026

PLANILLA DE MEDICIONES

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Contrato	Cantidades			Certificado de Obra en %		
			Cantidad	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual
120.9	Toma corriente Tipo Schuko	unidad	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
120.10	Accesorios de montaje.	Unidad Medida Global	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121	ILUMINACION , TOMACORRIENTES, ALIMENTACION CLIMATIZACIÓN - EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN - RECUPERADORES DE CALOR - EXTRACTORES - BOMBA DE DESAGOTE - PLANTA BAJA								
121.1	Conductor 2x6 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	180,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121.2	Conductor 1x6 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	180,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121.3	Conductor 2x4 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	870,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121.4	Conductor 1x4 mm2 Multifilar T - Verde/Amarillo	Metro lineal	870,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121.5	Caja de conexión octogonal de plástico	unidad	35,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121.6	Electroducto corrugado antillama 3/4"	Metro lineal	175,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
121.7	Accesorios de montaje.	Unidad Medida Global	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
122	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - BANDEJADO ELECTRICO HORIZONTAL - PLANTA BAJA								
122.1	Bandeja portacable ZI 450 mm	Metro lineal	5,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
122.2	Bandeja portacable ZI 300 mm	Metro lineal	70,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
122.3	Accesorios de montaje, Curvas, reducciones y soportes.	unidad	1,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
123	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - VARIOS - EMBUTIDOS EN LOSA - PLANTA BAJA								
123.1	Caja de conexion octogonal de plastico	unidad	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00%	100,00%	100,00%
123.2	Caja plastica de embutir 20x20	unidad	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00%	100,00%	100,00%
123.3	Caño electroducto liso de Polietileno 3/4"	Metro lineal	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00%	100,00%	100,00%
123.4	Accesorios, alambres para sujecion.	Metro lineal	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00%	100,00%	100,00%
124	ILUMINACIÓN , TOMACORRIENTES, ALIMENTACIÓN CLIMATIZACIÓN - ILUMINACIÓN - PISO 1								
124.1	Conductor 2x1,5 mm2 XLPE F-N	Metro lineal	200,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
124.2	Conductor 1x1,5 mm2 Multifilar F-N-T	Metro lineal	2.715,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%
124.3	Caja de derivacion cuadrangular 20x20	unidad	8,00	0,00		0,00	0,00%	0,00%	0,00%

APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

Ing. Kevin Alexander Ferreira
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos-D.I.F.

Juzgado de Primera Instancia de Yby Yau

CRONOGRAMA DE OBRA

Aponte Latorre S.A.

APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores

Ing. Tomás R. Sosa A.

Fiscal de Obras

Juzgado de Primera Instancia de Yby Yau

CRONOGRAMA DE OBRA

Aponte Latorre S.A.

APONTE LATORRE CONSTRUCTORA

TRSA Ingenieros & Consultores

Ing. Tomas R. Sosa A.

Fiscal de Obras

Juzgado de Primera Instancia de Yby Yau

CRONOGRAMA DE OBRA

Aponte Latorre S.A.

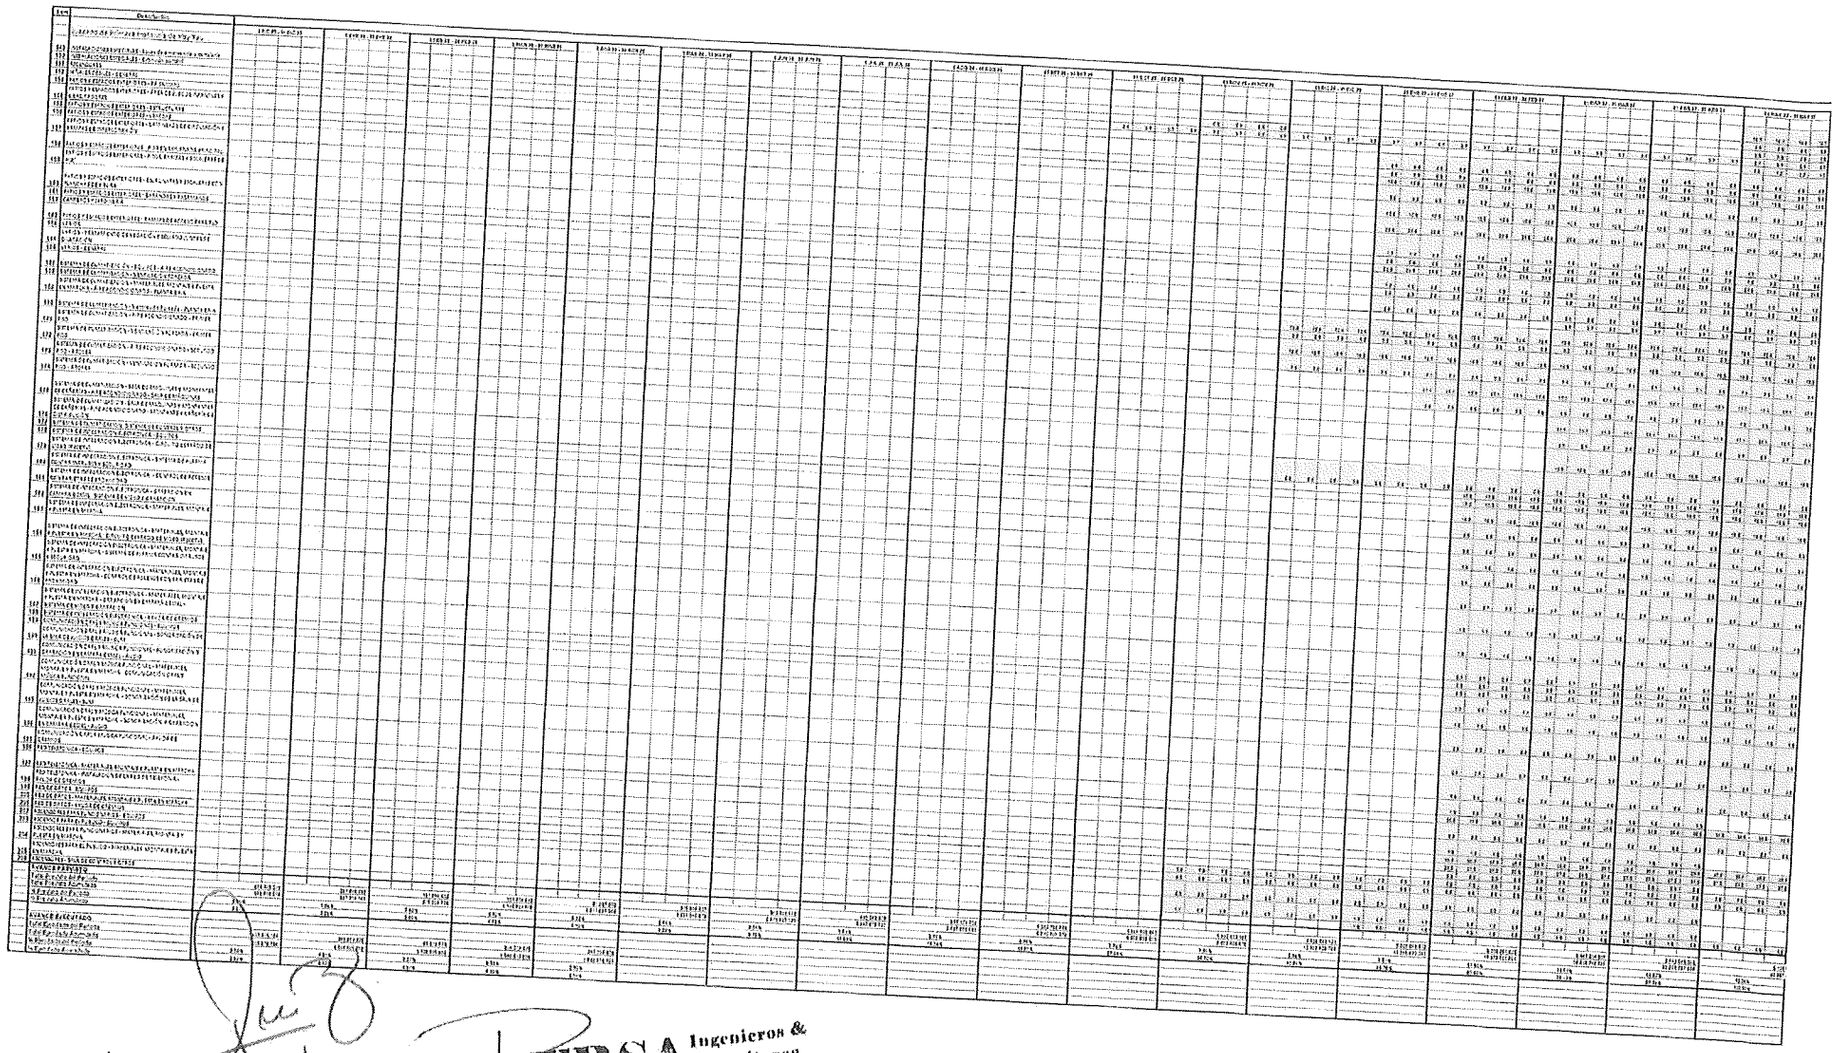

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA

TERSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE YBY YAU

Datos Contractuales

Contrato original G 25.367.351.736

Fecha Inicio: 01-dic-25
Plazo 547
Finalización: 31-may-27

CONTRATO Nº 51/2025

Certificado de Obras		AVANCE PREVISTO %		CERTIFICACION PREVISTA		EJECUTADO			
Nº	Mes	Mensual	Acumulado	Mensual	Acumulado	AVANCE EJECUTADO % Mensual	AVANCE EJECUTADO % Acumulado	CERTIFICACION EJECUTADA Mensual	CERTIFICACION EJECUTADA Acumulado
	01-dic-25		0,00%		0		0,00%		0
01	01-ene-26	2,21%	2,21%	559.909.079	559.909.079	2,59%	2,59%	655.874.164	655.874.164
02	01-feb-26	1,06%	3,26%	267.505.080	827.714.141	1,51%	4,10%	383.653.926	1.039.528.090
03	01-mar-26	0,60%	3,86%	151.554.632	979.268.774	0,27%	4,37%	69.870.563	1.109.398.653
04	01-abr-26	0,60%	4,46%	151.554.632	1.130.823.406	0,93%	5,30%	236.214.226	1.345.612.888
05	01-may-26	0,32%	4,78%	81.067.640	1.211.891.046	0,98%	6,28%	247.765.876	1.593.378.764
06	01-jun-26	2,44%	7,22%	619.654.627	1.831.545.673				
07	01-jul-26	2,54%	9,76%	643.889.440	2.475.435.121				
08	01-ago-26	1,83%	11,59%	465.043.610	2.940.478.731				
09	01-sep-26	2,75%	14,34%	697.171.750	3.637.650.481				
10	01-oct-26	4,94%	19,28%	1.252.755.889	4.890.406.370				
11	01-nov-26	7,76%	27,04%	1.969.285.841	6.859.992.211				
12	01-dic-26	7,85%	34,90%	1.992.462.367	8.852.454.578				
13	01-ene-27	5,04%	40,84%	1.506.949.191	10.359.403.769				
14	01-feb-27	7,91%	48,75%	2.007.046.512	12.366.450.281				
15	01-mar-27	11,39%	60,60%	3.006.261.620	15.372.711.901				
16	01-abr-27	13,59%	74,19%	3.447.034.857	18.819.746.758				
17	01-may-27	13,57%	87,76%	3.442.045.046	22.261.791.804				
18	31-may-27	12,24%	100,00%	3.105.559.932	25.367.351.736				
SUMATORIA		100,00%		25.367.351.736		6,28%		1.593.378.764	

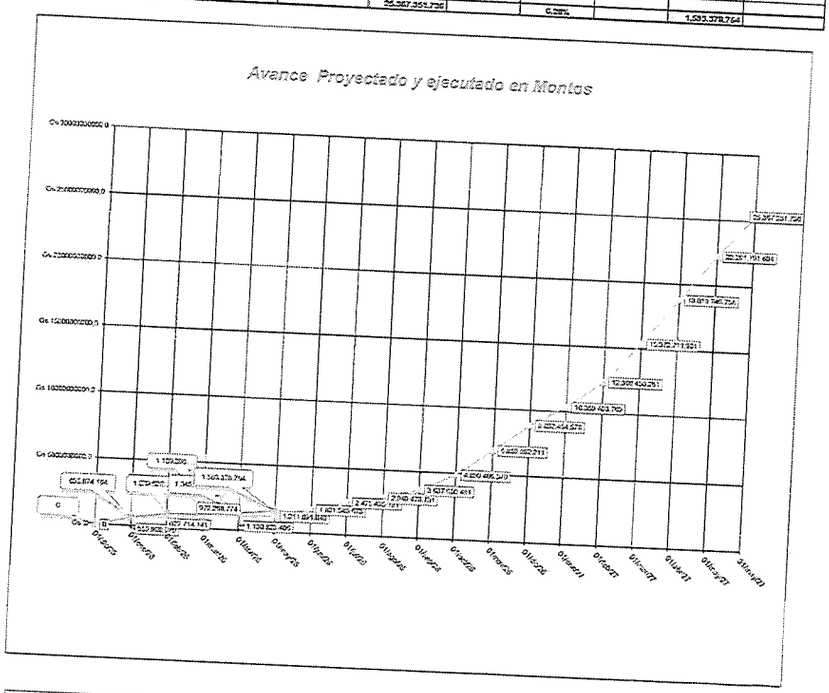

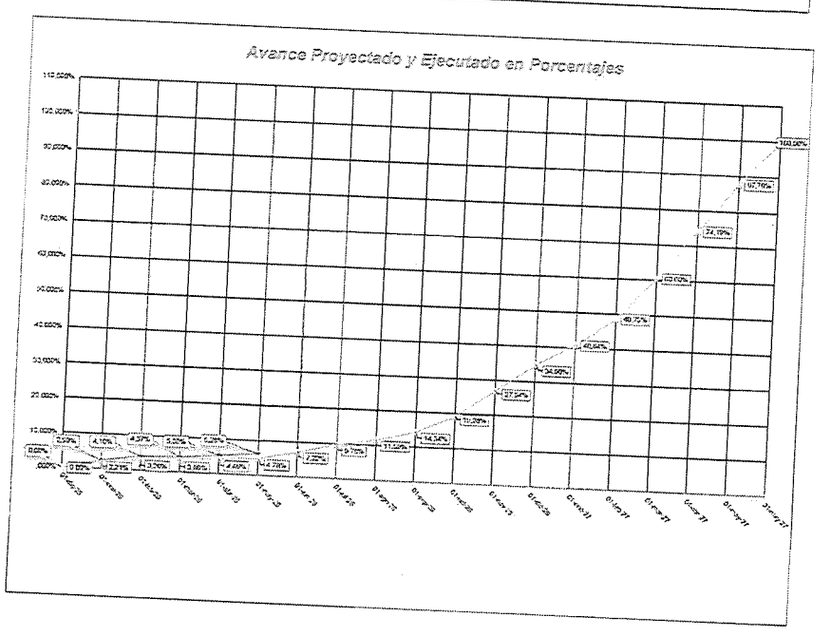

TRSA Ingenieros & Consultores
Ing. Tomás R. Sosa A.
Fiscal de Obras

APONTE LATORRE
CONSTRUCTORA
