CERTIFICADO DE OBRAS - BOGADO CONSTRUCCIONES DE JUAN BOGADO

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ - 1º CERTIFICADO - ID N° 448.121

FECHA: 31/10/2024

Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	CANTIDAD CERTIFICADA			MOTO TOTAL
							Presente Certificado	Acum hasta el Certificado Anterior	Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado	Monto del Presente Certificado
1	82101502-004	**Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Nueva Londres - Calle Harold Smith Mc Creen**	Un	1	1.511.225	1.511.225	100%	0%	100%	1.511.225
2	72131601-9974	Replanteo y marcación. Levantamiento plan altimétrico	m2	1.750	2.138	3.742.200	60%	0%	60%	2.245.320
3	72102905-001	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1.750	4.950	8.662.500	60%	0%	60%	5.197.500
4	72101703-004	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	710	36.630	26.007.300	60%	0%	60%	15.604.380
5	72131601-004	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,50m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck terminación a la vista.	m3	7	2.277.000	15.939.000	60%	0%	60%	9.563.400
6	72102905-001	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1.750	8.910	15.592.500	60%	0%	60%	9.355.500
7	72131701-002	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra) y compactación mecánica	m2	1.750	59.400	103.950.000	60%	0%	60%	62.370.000
8	72131701-014	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1.750	4.950	8.662.500	60%	0%	60%	5.197.500
9	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	1.750	1.634	2.858.625	60%	0%	60%	1.715.175
10	82101502-004	**Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Juan Manuel Frutos - Calles Cururupayty y 1ro de marzo**	Un	1	1.511.225	1.511.225	100%	0%	100%	1.511.225
11	72131601-9974	Replanteo y marcación. Levantamiento plan altimétrico	m2	3.771	2.138	8.063.906	60%	0%	60%	4.838.344
12	72102905-001	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	3.771	4.950	18.666.450	60%	0%	60%	11.199.870
13	72101703-004	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	1.118	36.630	40.952.340	60%	0%	60%	24.571.404
14	72131701-9998	Cuneta de hormigón ancho libre 50cm y espesor 12 cm con junta de dilatación cada 3m, altura libre en pendiente de 15cm. Hormigón cargado in situ (1:3:3) en moldes metálicos y terminación a la vista.	m3	668	96.228	64.280.304	60%	0%	60%	38.568.182
15	72131601-004	Badén de hormigón armado en boca calle de 1,20m de ancho y espesor 12cm. Armadura en malla de 30cm varilla de 8mm y hormigón 210fck metálicos y terminación a la vista.	m3	3	2.277.000	6.831.000	60%	0%	60%	4.098.600
16	72102905-001	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	3.771	8.910	33.599.610	60%	0%	60%	20.159.766

BOGADO CONSTRUCCIONES
Juan Ramón Bogado Lopez RUC 1.702.741-7

Ing Gustavo Velázquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

17	72131701-002	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	3.771	59.400	223.997.400	60%	0%	60%	134.398.440
18	72131701-014	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	3.771	4.950	18.666.450	60%	0%	60%	11.199.870
19	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	3.771	1.634	6.159.929	60%	0%	60%	3.695.957
20	82101502-004	**Cartel de obra 2,00m x 1,50m de chapa negra N-24 impreso en lona o adhesivo - Distrito de Mariscal F. Solano López - Barrio Caacupemi**	Un	1	1.511.225	1.511.225	100%	0%	100%	1.511.225
21	72131601-9974	Replanteo y marcación. Levantamiento plan altimétrico	m2	1.984	2.138	4.242.586	60%	0%	60%	2.545.551
22	72102905-001	Preparación y regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de escombros.	m2	1.984	4.950	9.820.800	60%	0%	60%	5.892.480
23	72101703-004	Cordón de hormigón de L:50cm H:40cm e:10cm. Prefabricado o cargado in situ	ml	637	36.630	23.333.310	60%	0%	60%	13.999.986
24	72102905-001	Colchón de arena o tierra roja para pavimento	m2	1.984	8.910	17.677.440	60%	0%	60%	10.606.464
25	72131701-002	Pavimento tipo empedrado piedra basáltica (piedra negra)	m2	1.984	59.400	117.849.600	60%	0%	60%	70.709.760
26	72131701-014	Provisión y colocación de triturada 6ta para terminación	m2	1.984	4.950	9.820.800	60%	0%	60%	5.892.480
27	72131601-013	Limpieza final de obra	m2	1.984	1.634	3.240.864	60%	0%	60%	1.944.518
						797.151.089				**480.104.123**
							PORCENTAJE CERTIFICACION		**60,23**	
							DESC. ANTICIPO 20%			**96.020.825**
							NETO A COBRAR			**384.083.298**
							FONDO DE REPARO 5%			**24.005.206**
							TOTAL A COBRAR			**360.078.092**

BOGADO CONSTRUCCIONES

Ing Gustavo Velázquez
Secretario de obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZU

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V. Dpto. de Caaguazú

INFORME

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS EN VARIOS DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAGUAZÚ – LOTE 2

LICITACIÓN: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN)

CONTRATO N°17/2024. ID N°448.121

PROVEEDOR: JUAN RAMON BOGADO LOPEZ

DISTRITO: NUEVA LONDRES – JUAN MANUEL FRUTOS – MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ

FECHA: 01/11/2024

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS DEPARTAMENTAL

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

.....

ING. CIVIL GUSTAVO VELÁZQUEZ BENÍTEZ

SECRETARIO DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2024-

RESUMEN

Se llevó a cabo la visita de inspección de obras en los espacios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 25/09/2024 con un plazo de ejecución de 90 días. Se procede a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la CERTIFICACION DE OBRAS Nº1, adjudicadas a la empresa de **JUAN RAMON BOGADO LOPEZ.**

Se verificó el estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes se emite el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones se encuentran en ejecución, he aquí el informe de obras respectivo.-

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº1.-

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRÁFICO Y CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA

Calle Harold Smith – Nueva Londres

Calles Curupayty y 1ro de marzo – Juan Manuel Frutos

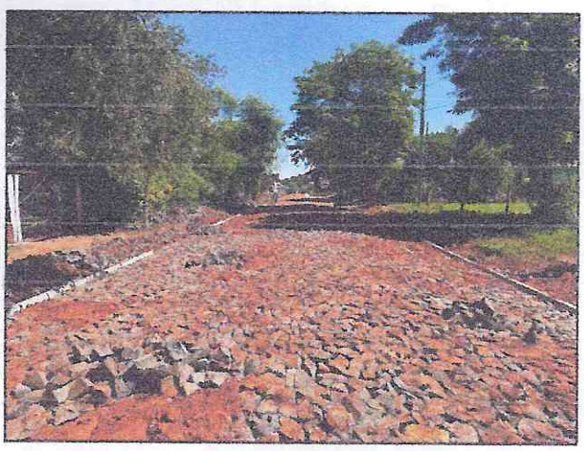

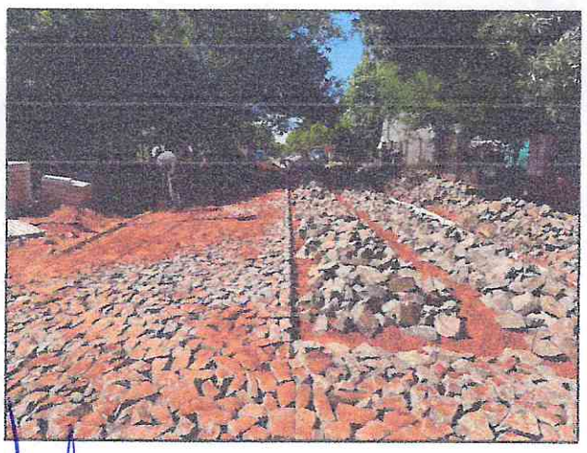

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú

Barrio Caacupemi – Mariscal F. Solano Lopez

Ing. Gustavo Velazquez
Secretario de Obras
GOBERNACIÓN DE CAAGUAZÚ

SECRETARIA DE OBRAS
Gobernación de V Dpto. de Caaguazú
