MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

MINGA GUAZÚ

***OBRA:* Construcción de pavimento tipo empedrado**

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: Km 17 Acaray - Fracción La Esperanza

Certificado de Obras N° 01						Certificado Actual		
Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit	Total	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares							
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	499.333	1.797.599	3,60	100	1.797.599
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	1.027,35	2.433	2.499.543	1.027,35	100	2.499.543
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	1.027,35	3.200	3.287.520	1.027,35	100	3.287.520
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	123,28	26.333	3.246.332	123,28	100	3.246.332
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	1.027,35	37.000	38.011.950	1.027,35	100	38.011.950
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	1.027,35	3.850	3.955.298	1.027,35	100	3.955.298
	Cordón de Hº							
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	70,00	39.667	2.776.690	70,00	100	2.776.690
8	Cordón cuneta de (0,10x0,40m)	ml	164,00	102.333	16.782.612	164,00	100	16.782.612
9	Badén de HºAº, incluye preparción de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) - colocado en bocacalles (2 baden en total)	m3	4,20	2.000.000	8.400.000	4,20	100	8.400.000
	Canal a cielo abierto de PBC							
10	Excavación manual de suelo natural para canal de PBC	m3	149,10	67.667	10.089.150	149,10	100	10.089.150
11	Base de H°, esp. 10cm	m3	14,75	717.667	10.585.588	14,75	100	10.585.588
12	Muro de PBC	m3	60,59	538.333	32.617.596	60,59	100	32.617.596
	Registro							
13	Excavación manual de suelo natural para Registro	m3	2,25	72.000	162.000	2,25	100	162.000
14	Base de H°, esp. 10cm	m3	0,45	584.333	262.950	0,45	100	262.950
15	Muro de PBC	m3	3,60	538.333	1.937.999	3,60	100	1.937.999
16	Rejilla para tapa de registro de 1,50x1,50m	un	2,00	776.667	1.553.334	2,00	100	1.553.334
	Compactación							
17	Compactación preliminar	m2	1.027,35	2.967	3.048.147	1.027,35	100	3.048.147
18	Compactación final	m2	1.027,35	3.200	3.287.520	1.027,35	100	3.287.520
	Limpieza final							
19	Limpieza final	m2	1.027,35	1.600	1.643.760	1.027,35	100	1.643.760
TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 27/2023				Total	₲ 145.945.588	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 145.945.588

un unidad
m metro
m2 metro cuadrado
m3 metro cúbico

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2026

Monto de Certificado	145.945.588
Descuento de Anticipo	-
Fondo de Reparo	7.297.279
Total a Pagar por Certificado	138.648.308

Richard
San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: Km 17 Acaray - Fracción La Esperanza

ACTA DE MEDICION

En la ciudad de Minga Guazú, a los 17 dias del mes de Octubre, siendo las 08:30 hs se constituye desde la Direccion de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú, el Arq. Miguel Caceres en su carácter de Fiscal y Director de Obra, a los efectos de realizar las medicones del Certificado N° 01, correspondiente a la Obra: Construccion de Pavimento tipo Km 17 Acaray - Fracción La Esperanza - Contrato N° 27 /2.023 - ID 422.716, firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y la Empresa San Francisco Emprendimientos.

Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	3,60
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	1.027,35	1.027,35
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	1.027,35	1.027,35
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	123,28	124,28
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	1.027,35	1.027,35
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	1.027,35	1.027,35
	Cordón de Hº			
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	70,00	70,00
8	Cordón cuneta de (0,10x0,40m)	ml	164,00	164,00
9	Badén de HºAº, incluye preparción de terreno para carga de Hº, parrilla 20x20, varilla Ø 10. Ancho: 2,00m. (ver detalle) - colocado en bocacalles (2 baden en total)	m3	4,20	4,20
	Canal a cielo abierto de PBC			
10	Excavación manual de suelo natural para canal de PBC	m3	149,10	149,10
11	Base de H°, esp. 10cm	m3	14,75	14,75
12	Muro de PBC	m3	60,59	60,59
	Registro			
13	Excavación manual de suelo natural para Registro	m3	2,25	-
14	Base de H°, esp. 10cm	m3	0,450	0,000
15	Muro de PBC	m3	3,6	0
16	Rejilla para tapa de registro de 1,50x1,50m	un	2	2
	Compactación			
17	Compactación preliminar	m2	1.027,35	1.027,35
18	Compactación final	m2	1.027,35	1.027,35
	Limpieza final			
19	Limpieza final	m2	1.027,35	1.027,35

un unidad
m metro

Municipalidad de Minga Guazú

Richard López
San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 27 /2.023-ID: N° 422.716.

CONTRATISTA: SR. RICHARD SAMUEL LOPEZ – SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.-RUC: 80039267-1

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los Diecisiete días del mes de octubre del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 27 /2.023-ID: N° 422.716 : LOTE N° 13 Construcción de Pavimento Tipo Empedrado- km 17 Acaray-Fracción la Esperanza"** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. RICHARD SAMUEL LOPEZ – SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.-RUC: 80039267-1.**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2026

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

Richard Lopez
San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

Sociedad Anonima

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - REPRESENTACIONES
COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS - COMPRA - VENTA DE MERCADERÍAS
CONSTRUCCIONES - SERVICIOS EN GENERAL

Calle Sin Nombre Casi Avda Republica de Colombia - Fracciona Vista del Lago
Tel.:(061) 575 038 - Ciudad del Este - Alto Paraná

R.U.C.: 80039267 - 1
Nº de Timbrado: 16636508

FACTURA

Fecha Inicio Vigencia: 29/08/2023
Fecha Fin Vigencia: 31/08/2024

001-001 0001260

Fecha de Emisión, 19 de octubre de.20 23 Condición de Venta: CONTADO ( ) CRÉDITO (/)

Nombre o Razón Social.: Municipalidad de Minga Guazú R.U.C. y/o C.I. Nº.: 800 10478 - 1

Dirección: Minga Guazu Tel.:

Nota de Remisión Nº: Fecha: Condición de Pago:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTAS		
			Exentas	IVA 5%	IVA 10%
	Pago de Certificado - Lote Nº 13				138.648.308 #
	Construcción de Pavimento tipo				
	empedrado - Km 17 Acaray - Fracción				
	La Esperanza - Licitación Publica				
	Nacional Nº 01/23 Construcción				
	de Pavimento tipo Empedrado para				
	el Distrito de Minga Guazú				
	ID 422716				
SUB- TOTALES					138.648.308 #

TOTAL A PAGAR: GS. (X) U$ ( ) (En Letras): Ciento treinta y ocho millones seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos ocho. — // — // — // 138.648.308 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 12.604.392 TOTAL IVA: 12.604.392

Gráfica NV - NATIVIDAD GIMENEZ YBARRA, AVDA SAN BLAS C/ AVDA COLOMBIA A 50 MTS DEL DIARIO VANGUARDIA -Tel.: (0982) 235 418 - Ciudad del Este - RUC: 3392320 - 5
HABILITACION Nº: 2458 - Numeracion: 1251 al 1350 - 50x3 - 08/23

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo tributario
TRIPLICADO : No válido para fines tributarios

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

Sociedad Anonima

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES - REPRESENTACIONES
COMERCIO DE PRODUCTOS DIVERSOS - COMPRA - VENTA DE MERCADERÍAS
CONSTRUCCIONES - SERVICIOS EN GENERAL

Calle, Km 7 Monday - Bº Corazon de Jesús
Cel.:(061) 575 038 - Puerto Pte.Franco - Alto Paraná

RECIBO DE DINERO

R.U.C.: 80039267 - 1

Nº 001 - 001- 0000134

FACTURA Nº	IMPORTE
1860	138.648.308

TOTAL 138.648.308

Fecha: 05 de Diciembre de 2023

Recibimos de: Municipalidad de Minga Guazú

RUC: 80010478-1

La cantidad de Ciento treinta y cuatro millones ochocientos sesenta y seis mil novecientos noventa

En Concepto de: pago por certificado N° 01 según contrato nro 27/23

☐ Efectivo ☑ Cheque Nº: 90537 C/Banco: Continental Interés por Mora

Gs. ☑ U$. ☐ 138.648.308

Firma y Sello

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A. RUC: 80039267-1

Gráfica NV - Victor Miranda Km 6.5 Acaray Calle Mburucuya A 110 Mts. De La Ruta Internacional Al Costado De Copetin La Vieja -Tel.: (0982) 235 418 - (061) 575 892 - Ciudad del Este - RUC: 3687065-0
HABILITACIÓN Nº: 1818 - Numeración: 001 al 250 - 50x3 - 01/19

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Archivo tributario
TRIPLICADO : No válido para fines tributarios

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 800392671 SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

Teléfono/s : 061575038 **Website** :

Fax : 061-577-240 **Email Corp.:** sanfranciscosa01@gmail.com

Dirección : CALLE SIN NOMBRE CASI AVDA. REPUBLICA DE COLOMBIA FRACCION VISTA DEL LAGO N° 19- CIUDAD DEL ESTE

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 005538

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 21/07/2024

Otorgado en Asunción, el 21/07/2016

Renovado el 21/09/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

800392671

03102023 0959 800392671 800392671

005538

Lote 5667807484 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270163692217

FORM.427-1

FECHA 16/10/2023

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	80039267	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	1	SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 15/11/2023

NÚMERO DE CONTROL : A31A0A0D

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427180039267A31A0A0D

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 1975626 NRO. CERTIFICADO: 405002

FECHA EMISION: 15-10-2023 VENCIMIENTO: 14-11-2023

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 80039267 Nro. Certificado: 405002

Razon Social: SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS SA

Actividad(es): COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Fecha de Inscripcion: 11-01-2010 Cantidad de Asegurados: 14

Nro. Patronal(es): 0515-61-0092 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Formulario de Identificación del Personal

En esta sección podrá administrar los Formularios de Identificación del Personal del contrato según lo establecido en el Decreto 6121/2016

ID Llamado: 422716

Llamado: LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ

Nombre	Apellido	Documento	Estado	Acción
LUIS MIGUEL	ALFONSO ESPINOLA	4979397	Activo	
MARCO	ALVISO	4890533	Activo	
RENE	BORDON CORVALAN	5759417	Activo	
TEOVALDO	ESCOBAR IBARRA	1360368	Activo	
ELVIO	GIMENEZ ACOSTA	3966512	Activo	
ADRIAN	GIMENEZ FERNANDEZ	6278764	Activo	
ELVIO DANIEL	ROLON ESTIGARRIBIA	7602258	Activo	
EVER SILVESTRE	VEGA GARCETE	4814687	Activo	
RAMON	VEGA GONZALEZ	3245298	Activo	
ALDO EDUARDO	VEGA SAMANIEGO	5111467	Activo	
TOMAS	VEGA GONZALEZ	1627842	Activo	

Nuevo Formulario de Identificacion del Personal

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

RUC

80039267-1

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 422716 / LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ

Monto del contrato

300.176.205

Año: 2023 **Periodo:** Octubre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	LUIS MIGUEL	ALFONSO ESPINOLA	Cumplio	1855638	Contratista	Activo
2	MARCO	ALVISO	Cumplio	1855638	Contratista	Activo
3	RENE	BORDON CORVALAN	Cumplio	1855638	Contratista	Activo
4	TEOVALDO	ESCOBAR IBARRA	Cumplio	1855638	Contratista	Activo
5	ELVIO	GIMENEZ ACOSTA	Cumplio	1855638	Contratista	Activo
6	ADRIAN	GIMENEZ FERNANDEZ	Cumplio	1855638	Contratista	Activo
7	ELVIO DANIEL	ROLON ESTIGARRIBIA	Cumplio	1855638	Contratista	Activo
8	EVER SILVESTRE	VEGA GARCETE	Cumplio	1855638	Contratista	Activo
9	ALDO EDUARDO	VEGA SAMANIEGO	Cumplio	1855638	Contratista	Activo
10	RAMON	VEGA GONZALEZ	Cumplio	1855638	Contratista	Activo
11	TOMAS	VEGA GONZALEZ	Cumplio	4000000	Contratista	Activo

Municipalidad de Ciudad del Este

CIUDAD DEL ESTE MUNICIPIO
ALTO PARANÁ - PARAGUAY

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
COMPROBANTE DE INGRESO

Nro.: 2023-19-872

PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIAL - 2023/0

NOMBRE: SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A R.M.C. 272408 R.U.C. 80039267-7 CDF
DOMICILIO:
RAZON SOCIAL: - RUC 80039267-7 - COL:RAMO - DIR: -
PERIODO: 2.023-1er/2do SEMESTRE -PATENTE - FICHA: 106490 - LIQUIDACION POR ACTIVIDAD
Obs.: TIPO C. ACT 4.956.012.927, CAT. P. RAMO/SUBRAMO F41/002 TIPO C. ACT 4.956.012.927, CAT. P.
RAMO/SUBRAMO F41/002

CODIGO	CONCEPTO	IMPORTE
10	IMPUESTO DE PATENTE A LA PROFESION, COMERCIO E INDUSTRIA - 2023	9.156.219
12	IMPUESTO A LA PUBLICIDAD Y PROPAGANDA - 2023	30.000
35	IMPUESTO AL PAPEL SELLADO Y ESTAMPILLA MUNICIPALES - 2023	1.800
23	TASAS POR SERVICIOS DE SALUBRIDAD - 2023	456.811
24	TASAS POR SERVICIOS DE DESINFECCION Y LUCHA C/ INSECTOS - 2023	300.000
26	TASAS POR INSPECCION DE INSTALACIONES - 2023	456.811
28	TASAS POR SERVICIOS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS - 2023	456.811
34	TASAS POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS - 2023	456.811
35	VENTA DE LIBROS, FORMULARIOS Y DOCUMENTOS - 2023	25.000
85	SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS - 2023	182.724

Retiro Plastificado.

10 ENE 2023

Alto Paraná

TOTAL EN GUARANIES: ONCE MILLONES QUINIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 11.502.987

Licitación 422716 - LICITACION PUBLICA NACIONAL 01/23 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ

ADJUDICADO: SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.

LOTE N° 13: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO - KM 17 ACARAY - FRACCIÓN LA ESPERANZA

Richard López.
San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

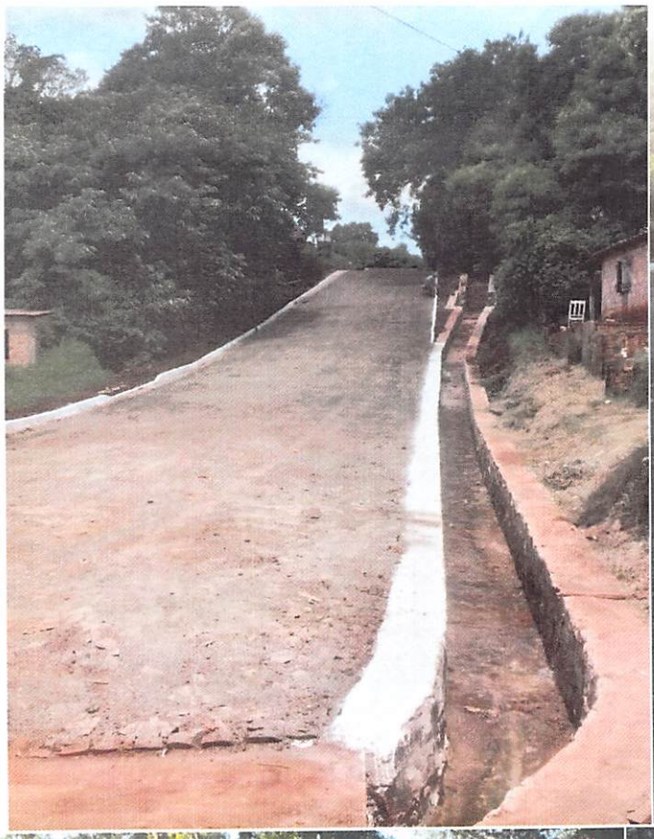

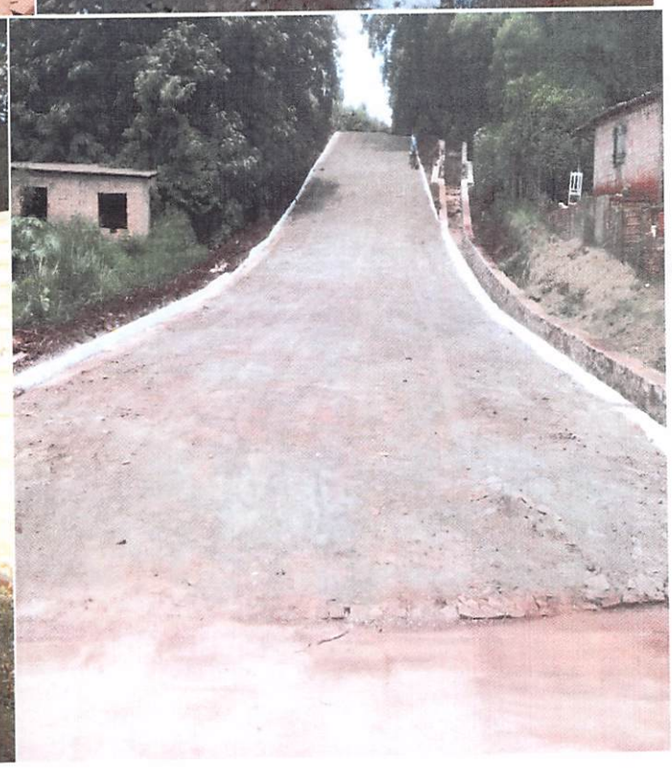

Richard López
San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

Richard López
San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

Richard López.
San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

Obra: Construcción de Pavimento tipo empedrado
Contratante: Municipalidad de Minga Guazú
Fiscalización: Dirección de Obras
Contratista: San Francisco emprendimientos
Ubicación de la Obra: Km 17 Acaray - Fracción los Esperanzas

RUC.:

San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

0000010

Libro de Obra

A los efectos de realizar un control de obra se establece la necesidad de contar con un libro de obras, que quedara en custodia y responsabilidad del contratista cuyas paginas seran enumeradas y cada una de ellas firmadas por el fiscal designado por la Municipalidad.
En dicho libro de obras se dejara constancia de todos los trabajos desde la preparación de la obra hasta la recepción definitiva.
Por lo tanto, en el dia de la fecha nos constatamos en el lugar correspondiente al contrato N°27/23 adjudicado a la empresa San Francisco emprendimientos.
Se ha llevado a realizada la apertura del libro de obras, se ha iniciado los trabajos de preparación de la obra.

Observaciones:

Firma del Fiscalizaste

San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1
Richard López
Firma del Contratista

Fecha:

Fecha:

Colgraphic Industria Publicitaria - Cel.: (0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - 01 Tel. 502 - 0000001 - 0000050 - 04/10/2023

Obra: Construcción de Pavimento tipo empedrado
Contratante: Municipalidad de Minga Guazu
Fiscalizacion: Direccion de Obras
Contratista: San Francisco Emprendimientos
Ubicacion de la Obra: Km 17 Acaray - Fraccion la Esperanza

RUC.:

San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

0000011

Libro de Obra

Semana
- Replanteo: Levantamiento Altimetrico y marcación
- Preparacion de suelo con motoniveladora (caja de empedrado)
- Acopio de materiales (piedra bruta basaltica) (cordón prefabricado 10x50x30cm) c/ proteccion lateral) (cordon Cuneta)
- Acopio de materiales (Cemento y arena para Colocacion de cordones)
- Preparacion de suelo de tierra colorada para colchón, Colocacion de Cordón (10x50x30cm) c/ proteccion lateral, colocacion de piedra a mano y martillo
- Colocación de Cordon Cuneta (0,10 x 0,40m)
- Excavacion manual para canal de PBC
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado para relleno,
- Fiscal de obras Verifica los trabajos realizados y toma varias fotografías

Semana
- Preparacion de suelo de tierra colorada para colchón, colocación de cordón (10x50x30cm) c/ proteccion lateral, Colocacion de piedra a mano y martillo
- Colocacion de cordon Cuneta (0,10 x 0,40m)
- Excavacion manual para canal de PBC
- Colocacion de cartel de obras
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado para relleno
- Fiscal de obras Verifica los trabajos realizados y toma varias fotografías

Semana
- Preparacion de suelo de tierra colorada para colchón, Colocacion de cordón (10x50x30cm) c/ proteccion Lateral, colocación de piedra a mano y martillo
- Colocacion de cordon Cuneta (0,10 x 0,40m)
- Excavacion manual para Registro y Canal
- Esparcido de Tierra Colorada para relleno
- Fiscal de obras Verifica los trabajos realizados y toma varias fotografías

Observaciones:

Firma del Fiscalizaste	San Francisco Emprendimientos S.A. RUC 80039267-1 Richard López Firma del Contratista
Fecha:	Fecha:

Colgraphic Industria Publicitaria - Cel.: (0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - 01 Tel. 502 - 0000001 - 0000050 - 04/10/2023

Obra: Construccion de Pavimento tipo Empedrado
Contratante: Municipalidad de Mugalburzo
Fiscalización: Direccion de Obras
Contratista: San Francisco Emprendimiento
Ubicación de la obra: Km 17 Acosay - Fracción La Esperanza

RUC.:

San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

0000012

Libro de Obra

Semana
- Preparacion de Suelo de tierra colorada para colchón, Colocacion de Cordon (10x50x30 cm) C/protección lateral, Colocacion de piedra a mano y martillo
- Colocación de Cordón Cuneta (0,10 x 0,40 m)
- Excavacion Manual para Registro
- Construccion de Canal a cielo abierto de PBC (Base y Muro)
- Construccion de Registro (base y muro)
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado para relleno
- Fiscal de Obras verifica los trabajos realizados y toma Varias Fotografias

Semana
- Preparacion de Suelo de tierra colorada para colchón, colocacion de cordón (10x50x30cm) C/protección lateral, Colocacion de piedra a mano y martillo
- Colocación de Cordón Cuneta (0,10 x 0,40 m)
- Construccion de Canal a Cielo abierto de PBC (base y muro)
- Construccion de Registro (base y muro)
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado para relleno
- Fiscal de obras toma varias fotografias, luego de verificar los trabajo

Semana
- Preparacion de Suelo de tierra colorada para Colchón, Colocacion de cordón (10x50x30cm) C/protección lateral, Colocación de piedra a mano y martillo
- Colocación de Cordón Cuneta (0,10 x 0,40 m)
- Construccion de canal a cielo abierto (base y Muro
- Construccion de Registro (base y muro)
- Construccion de badén de HºAº
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado para relleno
- Fiscal de Obras Verifica los trabajos realizados y toma Varias Fotografias

Observaciones:

Firma del Fiscalizaste	San Francisco Emprendimientos S.A. RUC 80039267-1 Richard López Firma del Contratista
Fecha:	Fecha:

Colgraphic Industria Publicitaria - Cel.: (0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - 01 Ta. 5042 - 0000001 - 0000050 - 04/10/2023

Obra: Construccion de pavimento tipo empedrado
Contratante: Municipalidad de Mingaburaso
Fiscalizacion: Direccion de Obras
Contratista: San Francisco emprendimientos
Ubicacion de la Obra: Km 17 Acaray - Fraccion la Esperanza

RUC.:

San Francisco Emprendimientos S.A.
RUC 80039267-1

0000013

Libro de Obra

Semana
- Preparacion de suelo de tierra colorada para colocacion, colocacion de cordon (10x50x30cm) c/ proteccion lateral, colocacion de piedra a mano y martillo
- Colocacion de Cordon Cuneta
- Construccion de Canal de HBC (Base y muro)
- Construccion de Registro (Base y muro)
- Construccion de Badon de H°A°
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado para relleno
- Compactacion preliminar
- Fiscal de obras Verifica los trabajos realizados y toma varias Fotografias

Semana
- Preparacion de suelo de tierra Colorada para Colchon, Colocacion de Cordon (10x50x30cm) c/ proteccion lateral, colocacion de piedra a mano y martillo
- Colocacion de Rejilla para tapa de Registro (1,50x1,50m)
- Esparcido de tierra colorada sobre empedrado para relleno
- Fiscal de obras Verifica los trabajos
- Trabajos de compactacion con rodillo mecanico liso 4 pasadas
- Acopio de triturada tipo VI y Esparcido sobre empedrado
- Trabajos de limpieza Final y recoleccion de materiales Sobrantes
- Se realiza las mediciones para Solicitar Certificacion
- Tomas fotograficas para la documentacion Correspondiente.

Observaciones:

Firma del Fiscalizaste	San Francisco Emprendimientos S.A. RUC 80039267-1 Richard López Firma del Contratista
Fecha:	Fecha:

Colgraphic Industria Publicitaria - Cel. (0973) 701 077 - E-mail: colgraphic.industria@gmail.com - 01 Tel. 502 - 0000001 - 0000050 - 04/10/2023
