Gobernación de Itapúa
Secretaría de Obras Públicas

Resumen Certificado Básico N°: 3
Mes: Marzo 2022

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA PLAZA MUNICIPAL AZTEKA DEL DISTRITO DE CORONEL BOGADO - PLURIANUAL

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificados por Obra Ejecutada								
A.1	Precios por Ajuste Alzado	0,00%		0,00%	-	0%	-	0%	-
A.2	Precios Unitarios	100,00%	886.645.898	11,39%	100.959.157	2,51%	22.298.444	13,90%	123.257.600
AII	**Totales por Obra**	**100,00%**	**886.645.898**	**11,39%**	**100.959.157**	**2,51%**	**22.298.444**	**13,90%**	**123.257.600**
B	Certificados por Obra Ejecutada								
B.1	Devolución de Anticipo	20%	-		20.191.831		4.459.689		24.651.520
B.2	Para Fondo de Reparo	0%	-						
B.3	Otras Deducciones	0%	0		0		0		0
BII	**Total Deducciones**		-		**20.191.831**		**4.459.689**		**24.651.520**

C.1	Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A-B)	17.838.755
C.2	Multas	0
C.	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A-B)**	**17.838.755**

Son Gs.: Diez y siete millones ochocientos treinta y ocho mil setecientos cincuenta y cinco.-

Resumen de Certificado Básico N° 3
Mes: Marzo 2022

ID N° 402.973
Contrato N° 29/21
Monto Gs. 886.645.898

Contratista: Lapacho Construcciones
Fecha de Inicio: 03/01/2022
Terminación: 03/08/2022
Plazo de ejecución: 240 días

Gobernación de Itapúa
Secretaría de Obras Públicas

Mesa de Entrada

Gregorio Vera Jara
Contratista Representante
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Arq. María Milagros Aqu
Fiscal de Obras
Gobernación de Itap

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Secretario de Obras Públicas

Ing. Nelson Tyrakowski
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA			Marzo 2022	Cert. N° 3
Secretaría de Obras Públicas			ID 402973	Planilla I
Precio Contratación Gs: 886.645.898	Plazo de ejecución: 240 días			Fecha de Inicio: 03/01/2022 Terminación: 03/08/2022

PLANILLAS DE IMPORTES POR PRECIO UNITARIO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA PLAZA MUNICIPAL AZTEKA DEL DISTRITO DE CORONEL BOGADO - PLURIANUAL

		UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL	INCIDENCIA	EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO EN GS.		
							ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUMULADO
1	**Trabajos Preliminares**																	
1.1	Obrador (3x5 m)	gl	1,00	2.242.217	2.242.217	0,0025	85,00%	15,00%	100,00%	0,0021	0,0004	0,0025	0,85	0,15	1,00	1.905.884	336.333	2.242.217
1.2	Cartel de obra	gl	1,00	2.262.483	2.262.483	0,0026	100,00%	0,00%	100,00%	0,0026	0,0000	0,0026	1,00	0,00	1,00	2.262.483	-	2.262.483
1.3	Demolicion de piso existente	m^2	570,0	14.396	8.205.720	0,0093	87,72%	12,28%	100,00%	0,0081	0,0011	0,0093	500,00	70,0	570,00	7.198.000	1.007.720	8.205.720
1.4	Demolicion de construccion existente. Sin recuperación	gl	1,00	620.828	620.828	0,0007	85,00%	15,00%	100,00%	0,0006	0,0001	0,0007	0,85	0,15	1,00	527.704	93.124	620.828
1.5	Vallado de obra, h= 1,50	m^2	150,00	60.950	9.142.500	0,0103	100,00%	0,00%	100,00%	0,0103	0,0000	0,0103	150,00	0,00	150,00	9.142.500	-	9.142.500
1.6	Replanteo	m^2	700,00	3.839	2.687.300	0,0030	50,00%	50,00%	100,00%	0,0015	0,0015	0,0030	350,00	350,00	700,00	1.343.650	1.343.650	2.687.300
1.7	Limpieza y preparación de terreno	m^2	700,00	8.629	6.040.300	0,0068	100,00%	0,00%	100,00%	0,0068	0,0000	0,0068	700,00	0,00	700,00	6.040.300	-	6.040.300
1.8	Placa de inauguración (40x30 cm) según PBC	m^2	1,00	911.317	911.317	0,0010	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
2	**Relleno y compactación de terreno**																	
2.1	Relleno y compactación	m^3	70,00	43.286	3.030.020	0,0034	50,00%	0,00%	50,00%	0,0017	0,0000	0,0017	35,00	0,00	35,00	1.515.010	-	1.515.010
3	**Excavación de Cimiento**																	
3.1	Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inferior)	m^3	26,9	30.810	828.789	0,0009	48,14%	11,86%	60,00%	0,0004	0,0001	0,0006	12,95	3,19	16,14	398.990	98.284	497.273
4	**Colocacion de hormigon armado**																	
4.1	Zapatas de hormigón (Según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	m^3	15	1.789.160	26.837.400	0,0303	33,33%	26,67%	60,00%	0,0101	0,0081	0,0182	5,00	4,00	9,00	8.945.800	7.156.640	16.102.440
4.2	Columnas de hormigón de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	m^3	27	2.343.561	63.276.147	0,0714	30,78%	0,00%	30,78%	0,0220	0,0000	0,0220	8,31	0,00	8,31	19.474.992	-	19.474.992
4.3	Viga inferior de hormigón (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	m^3	11,9	2.137.727	25.438.951	0,0287	32,10%	0,00%	32,10%	0,0092	0,0000	0,0092	3,82	0,00	3,82	8.166.117	-	8.166.117
4.4	Viga Intermedia de cara vista, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	m^3	8,3	2.167.772	17.992.508	0,0203	41,20%	0,00%	41,20%	0,0084	0,0000	0,0084	3,42	0,00	3,42	7.413.780	-	7.413.780
4.5	Viga Superior de cara vistas, sin esquinas (según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	m^3	8,3	2.167.772	17.992.508	0,0203	41,20%	0,00%	41,20%	0,0084	0,0000	0,0084	3,42	0,00	3,42	7.413.780	-	7.413.780
4.6	Graderías (incluye losa, vigas y zapatas de la gradería, según plano estructural adjunto) fck=210 kg/cm2	m^3	24	2.149.539	51.588.936	0,0582	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
4.7	Piso de hormigón de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2 (incluye pista)	m^2	520	133.650	69.498.000	0,0784	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
5	**Mamposteria de nivelación de 0.30**	m^2	36,00	130.407	4.694.652	0,0053	33,33%	0,00%	33,33%	0,0018	0,0000	0,0018	12,00	0,00	12,00	1.564.884	-	1.564.884
6	**Aislacion horizontal de 0.15 en U**	ml	180,00	25.009	4.501.620	0,0051	26,08%	0,00%	26,08%	0,0013	0,0000	0,0013	46,94	0,00	46,94	1.173.922	-	1.173.922
7	**Mamposteria de elevación**																	
7.1	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo visto ambas caras (ladrillo se	m^2	480,00	102.428	49.165.440	0,0555	19,56%	6,13%	25,69%	0,0108	0,0034	0,0142	94,34	29,42	123,76	9.663.058	3.013.432	12.676.489
7.2	Mamposteria de elevación de 0,15 ladrillo comun (para revocar)	m^2	35,00	76.631	2.682.085	0,0030	91,43%	8,57%	100,00%	0,0028	0,0003	0,0030	32,00	3,0000	35,00	2.452.192	229.893	2.682.085
7.3	Mamposteria de elevación de ladrillo convocó (ver detalles)	gl	400,00	132.931	53.172.400	0,0600	2,33%	16,96%	19,29%	0,0014	0,0102	0,0116	9,30	67,85	77,15	1.236.258	9.019.368	10.255.627
7.4	Mamposteria de elevación de 0,30 ladrillo común. (Paredes de escenar	m^2	16,00	132.857	2.125.712	0,0024	100,00%	0,00%	100,00%	0,0024	0,0000	0,0024	16,00	0,00	16,00	2.125.712	-	2.125.712
8	**Construccion/Colocacion de techo/tinglado - cubierta Metalica**																	
	Cubierta de Chapa trapezoidal zincalum N°24 sobre cavadores de perfil "C" y estructura metálica tipo Cabriada - Pend.15% - Sector Polideportivo (Según detalle de estructura) - incluye chapa cumbrera.	m^2	640,00	322.417	206.346.880	0,2327	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00		-	-
	Entrepiso de madera, incluye tirantes de madera semidura. 2"x5" y machimbre de pino	m^2	29,60	435.991	12.905.334	0,0146	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
9	**Colocacion de pisos - contrapisos**																	

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

Gobernación Departamental Itapúa
Fiscalización de Obras

Arq. María Milagros Aquir
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

	Contrapiso de 0,07 m (baños, y escenarios)	m^2	74,00	36.820	2.724.680	0,0031	36,49%	0,00%	36,49%	0,0011	0,0000	0,0011	27,00	0,00	27,00	994.140	-	994.140
10	**Colocacion de pisos - contrapisos - Carpeta alisado hidrofugo**																	
10.1	Carpeta para piso (baños, deposito y escenario)	m^2	74,00	24.664	1.825.136	0,0021	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	27,00	0,00	27,00			
11	**Colocacion de pisos - contrapisos - Piso cerámico (0,3x0,30 m) (baños, deposito y escenario)**	m^2	74,00	63.142	4.672.508	0,0053	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
12	**Colocacion de pisos - contrapisos -**	ml	40,00	45.167	1.806.680	0,0020	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
13	**Revestimiento de azulejos - Revestimiento cerámico (Azulejos) h = 1,75 m**	m^2	112,00	90.484	10.134.208	0,0114	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
14	**Revoques - Revoque con hidrófugo-interior/exterior**	m^2	86,00	32.173	2.766.878	0,0031	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15	**Construccion e instalaciones electricas**																	
15.1	Registro con tapa de HºAº , dimensiones interior : 40 x 40 x 40 cm . Fondo 10 cm de piedra triturada	un	3,00	295.907	887.721	0,0010	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.2	Suministro e Instalación de tablero metálico con barras Trifásico 24 módulos	un	1,00	719.010	719.010	0,0008	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.3	Alimentación eléctrica subterránea a 40 cm de profundidad en electro ducto con protección mecánica, cable subterráneo tipo NYY 4x6mm2	ml	45,00	68.260	3.071.700	0,0035	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.4	Puesta a tierra; una jabalina instalado en registro soldadura exotérmica con cable desnudo de 16mm2	gl	1,00	798.696	798.696	0,0009	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.5	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético trifásico	un	2,00	199.859	399.718	0,0005	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.6	Suministro e Instalación de disyuntor diferencial trifásico	un	1,00	417.434	417.434	0,0005	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.7	Suministro e Instalación de disyuntor termomagnético monofásico	un	7,00	69.635	487.445	0,0005	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.8	Suministro e Instalación de disyuntor diferencial monofasico	un	1,00	243.148	243.148	0,0003	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.9	Suministro e instalación de Reflector LED mínimo 20000Lm, máx. 200W	un	15,00	1.107.906	16.618.590	0,0187	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.10	Suministro e instalación de panel led tipo adosar luz fría 18W	un	6,00	59.462	356.772	0,0004	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.11	Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo proyector led de 30W luz cálida temperatura 3000°K	un	8,00	87.491	699.928	0,0008	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.12	Suministro e instalación de artefacto lumínico tipo AP, abierto con lámparas led de 70W, encendido con fotocélula, con contactor	un	8,00	582.073	4.656.584	0,0053	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.13	Alimentación de circuito de luces, en electroductos antillama	un	5,00	156.044	780.220	0,0009	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.14	Alimentación de circuito de tomas, en electroductos antillama	un	3,00	123.240	369.720	0,0004	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.15	Tomas corrientes común	un	8,00	37.589	300.712	0,0003	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.16	Tomas corriente tipo shuko	un	1,00	82.921	82.921	0,0001	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.17	Tomas corriente trifásico 3x32A con conductores sección mínima 6 mm2	un	2,00	299.887	599.774	0,0007	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.18	Suministro e instalación de fotocélula	un	1,00	38.457	38.457	0,0000	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
15.19	Puesto de distribución eléctrica. Incluye. Cimiento, aislación, mamp de 0,30 visto una cara,, registro de conexión, loseta, tablero metálico de distribución, conexión y adecuación de la conexión existente en la llave principal, y registro eléctrico - ver detalle	un	1,00	3.161.046	3.161.046	0,0036	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00			
16																		
16.1	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 1"	ml	30,00	33.633	1.008.990	0,0011	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
16.2	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 3/4"	ml	18,00	25.630	461.340	0,0005	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. Mario Milogros Aguir
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapu

16.3	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 1/2"	ml	25,00	13.307	332.675	0,0004	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
16.4	Provisión e instalación de canilla de servicio de 1/2", cromado	un	4,00	41.840	167.360	0,0002	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
16.5	Provisión e instalación de Llave de paso de 1", cromado con campana símil FV	un	2,00	279.565	559.130	0,0006	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
16.6	Provisión e instalación de Llave de paso de 3/4", cromado con campana símil FV	un	2,00	230.945	461.890	0,0005	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
16.7	Provisión e instalación de Llave de paso de 1/2", cromado con campana símil FV	un	7,00	113.041	791.287	0,0009	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
17	**Construccion de desague pluvial - desague Cloacal**																	
17.1	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 100 mm	ml	30,00	45.915	1.377.450	0,0016	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
17.2	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 50 mm	ml	10,00	26.793	267.930	0,0003	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
17.3	Provisión e instalación de caño PVC rígido de 40 mm	ml	35,00	22.046	771.610	0,0009	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
17.4	Provisión e instalación de RPS de 15 cm	un	6,00	229.135	1.374.810	0,0016	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
17.5	Registros cloacales de 60x60x40 , con doble tapa	un	4,00	414.464	1.657.856	0,0019	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
17.6	Cámara séptica de 1,50x1,20x1,10- ver detalles	un	1,00	1.351.328	1.351.328	0,0015	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
17.7	Pozo Absorbente diámetro de 2,00 m y h= 3 m - ver detalles	un	1,00	2.218.665	2.218.665	0,0025	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
18	**Instalaciones sanitarias - Artefactos Sanitarios**																	
18.1	Provisión e instalación de inodoro de porcelana blanco, asiento, y cisterna alta, incluye, bajada, bujes, flexibles, anilla de vedación	un	4,00	431.502	1.726.008	0,0019	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
18.2	Provisión e instalación de lavatorio tipo pedestal, mediano, color blanco	un	6,00	267.410	1.604.460	0,0018	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
18.3	Provisión e instalación de mingitorio, color blanco	un	3,00	486.200	1.458.600	0,0016	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
18.4	Provisión e instalación Canilla de pico bajo cromado, para lavamanos . Incluye flexibles de conexión	un	6,00	142.820	856.920	0,0010	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
18.5	Provisión e instalación de ducha eléctrica - 5000 W	un	4,00	133.705	534.820	0,0006	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
18.6	Jabonera, de adosar, metálico	un	10,00	97.240	972.400	0,0011	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
18.7	Porta rollos de adosar, metálico	un	4,00	85.693	342.772	0,0004	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
19	**Construccion de desague pluvial**																	
19.1	Canaleta alero de 0,60 de desarrollo chapa Galvanizada N° 24	ml	72	114.977	8.278.344	0,0093	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
19.2	Caños de bajada de PVC de 100 mm	ml	134,4	88.785	11.932.704	0,0135	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
19.3	Registro 40x40,con rejilla metálica	un	16	290.227	4.643.632	0,0052	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
19.4	Caños PVC de 100 mm, con protección mecánica de ladrillo común- hasta la calle	ml	194	101.955	19.779.270	0,0223	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
20	**Aberturas**																	
20.1	Ventiluz 1,10x0,5/1,60	un	2	277.755	555.510	0,0006	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
20.2	Puerta metálica de 0,90x2,10 m (marco de chapa N°18, bastidor 40x40x1,20, y enchapado con chapa N°20)	un	2	1.365.628	2.731.256	0,0031	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
20.3	Puerta de 0,60x1,65 para boxes, vaivén	un	8	842.963	6.743.704	0,0076	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
20.4	Portones de chapa, acceso frontal y posterior, incluye puerta peatonal	un	2	3.492.753	6.985.506	0,0079	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
21	**Servicio de pintura**																	
21.1	Pintura látex interior/exterior sin enduido (paredes de mampostería revocadas y pilares de hormigón)	m^2	86	24.383	2.096.938	0,0024	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
21.2	Tratamiento de ladrillo visto (limpieza y siliconado) incluye ladrillos convoco	m^2	1.760	18.378	32.345.280	0,0365	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
21.3	De aberturas de madera con barniz sintético	m^2	45	25.478	1.146.510	0,0013	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
21.4	De estructuras metálicas de techo, con pintura sintética y barandas	m^2	450	31.868	14.340.600	0,0162	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

Arq. María Milagros Aguir
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapu

21.5	Canaleta, cenefas y caño de bajada con pintura sintética	ml	72	22.850	1.645.200	0,0019	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
21.6	Pintura de cancha (fondo y líneas de área con pintura polideportiva-según plano)	m^2	316	7.348	2.321.968	0,0026	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
22	**Construccion de rampa peatonal - Obras Complementarias**																	
22.1	Escalera y rampa de acceso al escenario	gl	1	954.490	954.490	0,0011	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
22.2	Arcos metálicos para futbol (según diseño- incluye red de arco) - 2 unidades	gl	1	1.987.666	1.987.666	0,0022	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
22.3	Torre de básquet, rebatible, con sistema de protección (según diseño) - 2 unidades	gl	1	24.960.616	24.960.616	0,0282	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
22.4	Poste para red de vóley (Caño galv de 3"- según diseño)	gl	1	875.484	875.484	0,0010	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
22.5	Baranda de caño metálico para gradería, pasamanos escalera rampa de escenario (según planos)	ml	27	545.861	14.738.247	0,0166	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
22.6	Espejo para baños con bordes de madera (2,20x0,6 cant 2)	m^2	2,5	58.965	147.413	0,0002	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
22.7	Vidrios para ventanas	m^2	1,3	83.274	108.256	0,0001	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
23	**Servicio de retiro de vallado**	m^2	150,00	3.199	479.850	0,0005	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
24	**Limpieza de obra**	m^2	700,00	5.342	3.739.421	0,0042	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00			
TOTAL					**886.645.898**	**1,00**				**0,1138**	**0,0251**	**0,1390**				**100.959.157**	**22.298.444**	**123.257.600**

CONTRATISTA

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

GOBERNACIÓN DE ITAPUA

Ing. Mario Milagros Aquin
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Gobernación de Itapúa — **Marzo 2022**

Secretaría de Obras Públicas — **Contrato N° 29/21**

Precio Contratación Gs: 886.645.898 | Plazo de ejecución: 240 días | Fecha de Inicio: 03/01/2022 | Terminación: 03/08/2022

Cronograma Físico - Financiero

ID 402973

		1	2	3	4	5	6	7	8
	Rubros	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22
1	CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS EN EL TINGLADO COMUNITARIO DE PASO GUEMBE, DISTRITO DE TRINIDAD	31.209.936	30.677.948	89.551.236	164.650.143	204.460.544	103.737.570	88.664.590	173.693.931
	TOTALES	**31.209.936**	**30.677.948**	**89.551.236**	**164.650.143**	**204.460.544**	**103.737.570**	**88.664.590**	**173.693.931**
	Importe mensual previsto	31.209.936	30.677.948	89.551.236	164.650.143	204.460.544	103.737.570	88.664.590	173.693.931
	Acumulado mensual previsto	31.209.936	61.887.884	151.439.119	316.089.263	520.549.807	624.287.377	712.951.966	886.645.898
	Porcentaje mensual previsto	3,52%	3,46%	10,10%	18,57%	23,06%	11,70%	10,00%	19,59%
	Porcentaje acumulado previsto	3,52%	6,98%	17,08%	35,65%	58,71%	70,41%	80,41%	100,00%
	Importe mensual ejecutado	66.132.301	34.826.855	22.298.444	-	-	-	-	-
	Acumulado mensual ejecutado	66.132.301	100.959.156	123.257.600			-	-	-
	Porcentaje mensual ejecutado	7,46%	3,93%	2,51%					
	Porcentaje acumulado ejecutado	7,46%	11,39%	13,90%	-	-	-	-	-

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-
Contratista

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Gobernación de Itapúa

Arq. María Milagros Aquin
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapú

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MULTIUSO EN LA PLAZA MUNICIPAL AZTEKA DEL DISTRITO DE CORONEL BOGADO - PLURIANUAL con ID: 402973

Contrato N°: 29/21	
Monto del Contrato: 886.645.919 Gs	**Term. Prevista: 03/08/2022**
Plazo Contractual: 240 días	**Ampliaciones:**
Inicio de Obra: 03/01/2022	**Mes: Marzo 2022**

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 55/2020

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Enero	31.209.936	31.209.936	66.132.301	66.132.301	3,52%	3,52%	7,46%	7,46%
Febrero	30.677.948	61.887.884	34.826.855	100.959.156	3,46%	6,98%	3,93%	11,39%
Marzo	89.551.236	151.439.119	22.298.444	123.257.600	10,10%	17,08%	2,51%	13,90%
Abril	164.650.143	316.089.263	0		18,57%	35,65%		
Mayo	204.460.544	520.549.807	0		23,06%	58,71%		
Junio	103.737.570	624.287.377	0		11,70%	70,41%		
Julio	88.664.590	712.951.966	0		10,00%	80,41%		
Agosto	173.693.931	886.645.898	0		19,59%	100,00%		

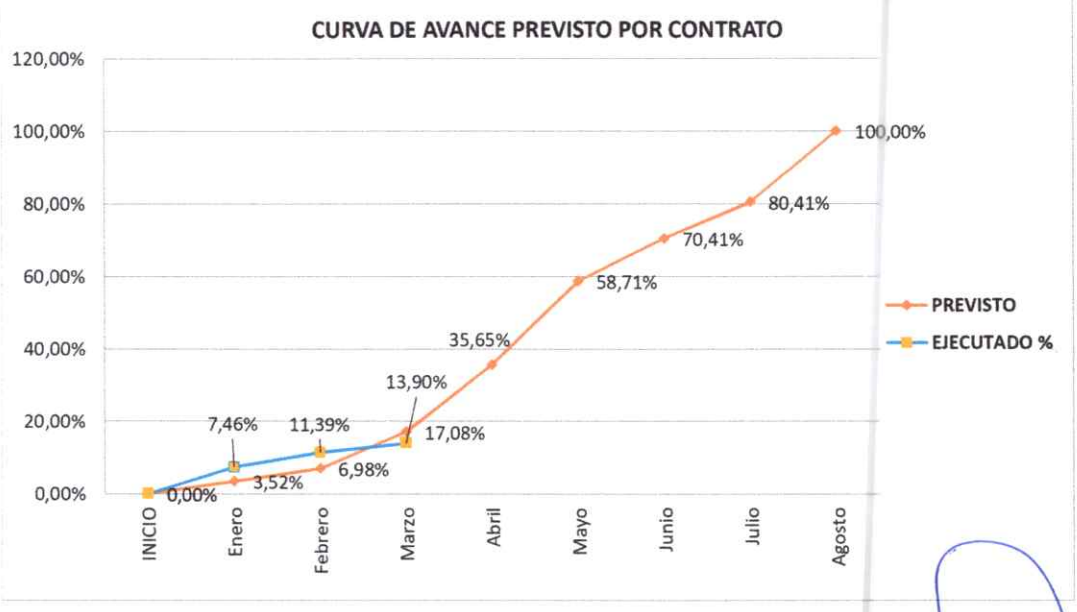

Contratista

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Mari Milagros Aquino
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
