Gobernación de Itapúa
Secretaría de Obras Públicas

Resumen Certificado Básico N°: 7
Periodo: abril 2026

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - Construcción del Polideportivo Municipal del Distrito de Coronel Bogado, Segunda Etapa - Plurianual - ID: 458665

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificados por Obra Ejecutada								
A.1	Refacción USF San Dionisio - Distrito de Gral. Delgado	100,00%	1.912.793.528	83,91%	1.604.993.828	7,57%	144.719.815	91,47%	1.749.713.643
AII	**Totales por Obra**	**100,00%**	**1.912.793.528**	**83,91%**	**1.604.993.828**	**7,57%**	**144.719.815**	**91,47%**	**1.749.713.643**

B	Certificados por Obra Ejecutada					
B.1	Devolución de Anticipo	5%	95.639.676	80.249.691	7.235.991	87.485.682
B.2	Para Fondo de Reparo	0%	-			
B.3	Otras Deducciones	0%	0	0	0	0
BII	**Total Deducciones**		**95.639.676**	**80.249.691**	**7.235.991**	**87.485.682**

C.1	Importe Líquido a Pagar Según Presente Certificado (A-B)	137.483.824
C.2	Multas	0
C.	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A-B)**	**137.483.824**

Son Gs.: Ciento treinta y siete millones cuatrocientos ochenta y tres mil ochocientos veinticuatro.-

Certificado Básico N°	**7**
Periodo:	**abr-26**
Contrato N°	**16/2025**
Monto Básico:	**1.912.793.528**
Contratista:	**Lapacho Construcciones de Gregorio Vera**
Fecha de inicio:	**3/10/2025**
Plazo de ejecución, días corridos:	**240**
Fecha de Terminación:	**31/5/2026**
Prórroga / Suspensión de plazo:	
Fecha de Terminación prevista:	
Vigencia Póliza Contrato:	**14/2/2027**
Vigencia Póliza Fondo de reparo:	**14/2/2027**
Vigencia Póliza Anticipo:	**14/2/2027**

Gobernación de Itapúa
Secretaría de Obras Públicas

Mesa de Entrada

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

Contratista
Representante Legal

Contratista
Residente de Obras
José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC N° 2.040

Fiscalización de Obras

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Fiscal de Obras
Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Secretario de Obras Públicas
Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

Secretaría de Obras Públicas

abr' 26 | Cert. N° 7 | Planilla I

Precio Contratación Gs: 1.912.793.528

PLANILLAS DE IMPORTES POR PRECIO UNITARIO

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - Construcción del Polideportivo Municipal del Distrito de Coronel Bogado, Segunda Etapa - Plurianual - ID: 458665

							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			MONTO EJECUTADO EN GS.		
		UNIDAD	CANT	P. UNITARIO	P. TOTAL	INCIDENCIA	ACUMUL. ANTERIOR	Periodo: octubre '25	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	PRESENTE	ACUM. TOTAL
1	Cartel de obra (1,50x2,00m)	UNIDAD	1,00	1.408.000	1.408.000	0,0007	100,00%	0,00%	100,00%	0,0007	0,0000	0,0007	1,00		1,00	1.408.000	-	1.408.000
2	Obrador según especificaciones técnicas	UNIDAD	1,00	4.182.500	4.182.500	0,0022	100,00%	0,00%	100,00%	0,0022	0,0000	0,0022	1,00		1,00	4.182.500	-	4.182.500
3	Trazado, Replanteo y Marcación.	Metros cuadrados	4001,44	4.250	17.006.120	0,0089	100,00%	0,00%	100,00%	0,0089	0,0000	0,0089	4.001,44		4.001,44	17.006.120	-	17.006.120
4	Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado inferior)	Metros cúbicos	1303,68	36.000	46.932.480	0,0245	100,00%	0,00%	100,00%	0,0245	0,0000	0,0245	1.303,68		1.303,68	46.932.480	-	46.932.480
5	Relleno y compactación del terreno	Metros cúbicos	951,31	54.500	51.846.395	0,0271	100,00%	0,00%	100,00%	0,0271	0,0000	0,0271	951,31		951,31	51.846.395	-	51.846.395
6	Zapatas de hormigón armado, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	352,37	2.295.000	808.689.150	0,4228	100,00%	0,00%	100,00%	0,4228	0,0000	0,4228	352,37		352,37	808.689.150	-	808.689.150
7	Columnas de hormigón armado de cara vista, sin esquinas, fck=250 kg/cm2	Metros cúbicos	151,30	3.730.500	564.424.650	0,2951	60,00%	20,00%	80,00%	0,1770	0,0590	0,2361	90,78	30,26	121,04	338.654.790	112.884.930	451.539.720
8	Viga Encadenado de hormigón armado, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	56,95	2.850.000	162.307.500	0,0849	100,00%	0,00%	100,00%	0,0849	0,0000	0,0849	56,95		56,95	162.307.500	-	162.307.500
9	Viga intermedia de hormigón armado de cara vista, sin esquinas, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	36,11	3.355.500	121.167.105	0,0633	82,28%	12,72%	95,00%	0,0521	0,0081	0,0602	29,71	4,59	34,30	99.691.905	15.416.845	115.108.750
10	Viga superior de hormigón armado de cara vista, sin esquinas, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	34,53	3.050.000	105.316.500	0,0551	60,00%	0,00%	60,00%	0,0330	0,0000	0,0330	20,72		20,72	63.189.900	-	63.189.900
11	Losa de hormigón armado, fck=210 kg/cm2	Metros cúbicos	11,81	2.328.800	27.503.128	0,0144	40,30%	59,70%	100,00%	0,0058	0,0086	0,0144	4,76	7,05	11,81	11.085.088	16.418.040	27.503.128
12	Limpieza de obra	Global	1,00	2.010.000	2.010.000	0,0011	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	0,00		0,00	-	-	-
	PRECIO TOTAL				1.912.793.528	100,00%				83,91%	7,57%	91,47%				1.604.993.828	144.719.815	1.749.713.643

Gregorio Vera Jara
Capacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

CONTRATISTA - REP. LEGAL

CONTRATISTA - RESIDENTE
José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC N° 2.040

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Licitación: 458665 - Construcción del Polideportivo Municipal del Distrito de Coronel Bogado, Segunda Etapa - Plurianual

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PREVISTA - PERIODO DE CONSTRUCCIÓN: 240 DÍAS

CONTRATO N° 16/2025 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	PERIODO oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26
1	Cartel de obra (1,50x2,00m)	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	1.408.000	1.408.000	1.408.000							
2	Obrador según especificaciones técnicas	unidad de medida: Unidad presentación: UNIDAD	1,00	4.182.500	4.182.500	4.182.500							
3	Trazado, Replanteo y Marcación.	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: UNIDAD	4.001,44	4.250	17.006.120	8.503.060	8.503.060						
4	Excavación para cimientos de H°A° (Zapatas y encadenado Inf.	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	1.303,68	36.000	46.932.480	23.466.240	23.466.240						
5	Relleno y compactación del terreno	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	951,31	54.500	51.846.395	17.282.132	17.282.132	17.282.132					
6	Zapatas de hormigón armado, fck=210 kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	352,37	2.295.000	808.689.150	202.172.288	202.172.288	202.172.288	202.172.288				
7	Columnas de hormigón armado de cara vista, sin esquinas, fck=250 kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	151,30	3.730.500	564.424.650				56.442.465	112.884.930	282.212.325	112.884.930	
8	Viga Encadenado de hormigón armado, fck=210 kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	56,95	2.850.000	162.307.500			81.153.750	81.153.750				
9	Viga Intermedia de hormigón armado de cara vista, sin esquinas, fck=210 kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	36,11	3.355.500	121.167.105						60.583.553	60.583.553	
10	Viga superior de hormigón armado de cara vista, sin esquinas, fck=210 kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	34,53	3.050.000	105.316.500							52.658.250	52.658.250
11	Losa de hormigón armado, fck=210 kg/cm2	unidad de medida: Metros cúbicos presentación: UNIDAD	11,81	2.328.800	27.503.128							27.503.128	
12	Limpieza de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00	2.010.000	2.010.000								2.010.000
				TOTAL G.	**1.912.793.528**	**257.014.219**	**251.423.719**	**300.608.169**	**339.768.503**	**112.884.930**	**342.795.878**	**253.629.861**	**54.668.250**

	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26
Monto a ejecutar programado mensual	257.014.219	251.423.719	300.608.169	339.768.503	112.884.930	342.795.878	253.629.861	54.668.250
Monto a ejecutar programado acumulado	257.014.219	508.437.938	809.046.108	1.148.814.610	1.261.699.540	1.604.495.418	1.858.125.278	1.912.793.528
% a ejecutar programado mensual	13,44%	13,14%	15,72%	17,76%	5,90%	17,92%	13,26%	2,86%
% a ejecutar programado acumulado	13,44%	26,58%	42,30%	60,06%	65,96%	83,88%	97,14%	100,00%

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

José Martín Núñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC N° 2.040

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
Fiscalización de Obras

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

OBRA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 02/2025 - Construcción del Polideportivo Municipal del Distrito de Coronel Bogado, Segunda Etapa - Plurianual - ID: 458665

Contrato N°: 16/2025	
Monto del Contrato: 1.912.793.528 Gs	**Term. Prevista: 31/05/2026**
Plazo Contractual: 240 días	**Ampliaciones:**
Inicio de Obra: 3/10/2025	**Periodo: abr' 26**

CUADRO DE AVANCE PREVISTO POR CONTRATO

Contrato N°: 59/2024

PERIODO	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
oct-25	257.014.219	257.014.219	327.325.670	327.325.670	13,44%	13,44%	17,11%	17,11%
nov-25	251.423.719	508.437.938	257.685.705	585.011.375	13,14%	26,58%	13,47%	30,58%
dic-25	300.608.169	809.046.108	39.484.430	624.495.805	15,72%	42,30%	2,06%	32,65%
ene-26	339.768.503	1.148.814.610	474.830.960	1.099.326.765	17,76%	60,06%	24,82%	57,47%
feb-26	112.884.930	1.261.699.540	228.604.415	1.327.931.180	5,90%	65,96%	11,95%	69,42%
mar-26	342.795.878	1.604.495.418	277.062.648	1.604.993.828	17,92%	83,88%	14,48%	83,91%
abr-26	253.629.861	1.858.125.278	144.719.815	1.749.713.643	13,26%	97,14%	7,57%	91,47%
may-26	54.668.250	1.912.793.528			2,86%	100,00%		

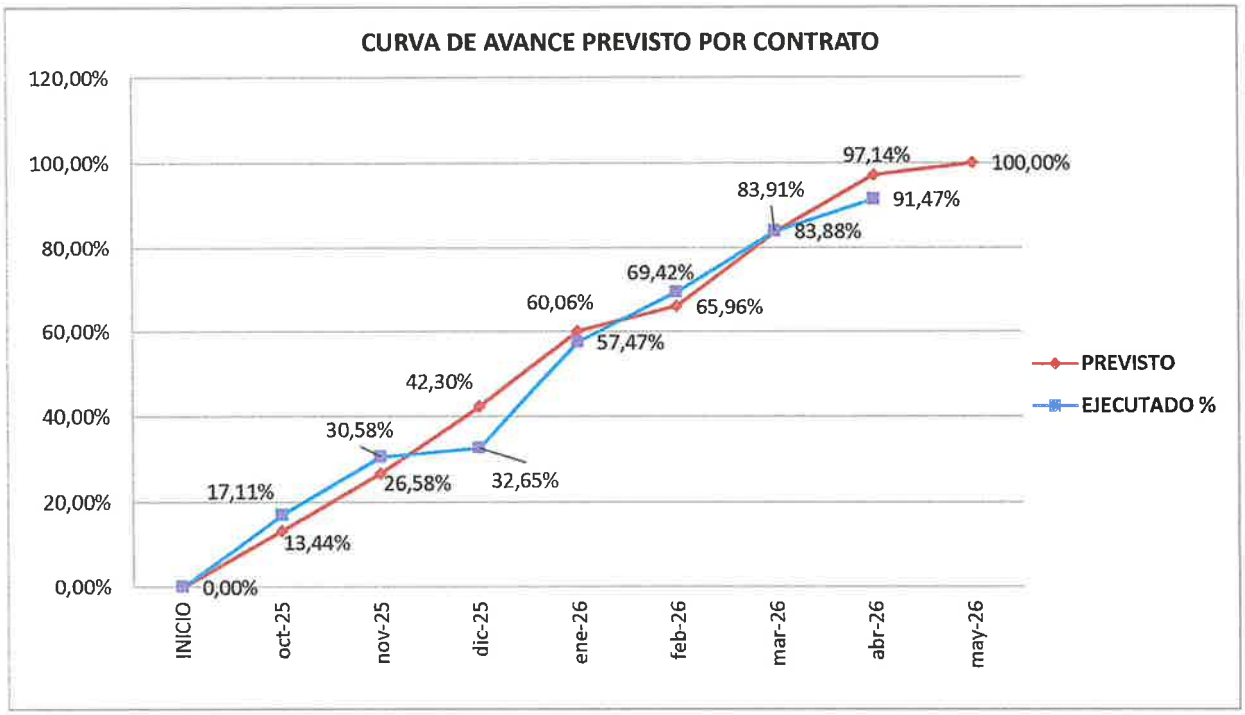

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.-

Contratista -
Representante legal

José Marin Nuñez Giménez
Ingeniero Civil
MOPC N° 2.[illegible]
Residente

Gobernación de Itapúa

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado:	GREGORIO VERA JARA	**RUC:**	1218178-1
Entidad Contratante:	Uoc Itapua	**Descripción del Llamado / Contrato**	458665 - Construcción del Polideportivo Municipal del Distrito de Coronel Bogado, Segunda Etapa - Plurianual
Monto del Contrato:	₲ 1.912.793.528		

Número	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Estado	Fecha desvinculación
1	Rodolfo	Vera Jara	1948030	EXCLUSIVA	LABORAL	Desvinculado	02/01/2026
2	Wilson Dejesus	Vera Jara	5051123	EXCLUSIVA	LABORAL	Activo	
3	Carlos Daniel	Galeano Larramendia	3243105	EXCLUSIVA	LABORAL	Activo	
4	Ramon	Servin Balmaceda	3223375	EXCLUSIVA	LABORAL	Activo	
5	Liz Mariela	Vera Mendez	3619351	EXCLUSIVA	LABORAL	Activo	
6	Esteban	Fretes Ferreira	3433987	EXCLUSIVA	LABORAL	Activo	
7	Sergio Ruben	Yeza Vera	3261756	EXCLUSIVA	LABORAL	Activo	

Usuario Impresión: 1218178 - GREGORIO VERA JARA **Fecha Impresión:** 15/04/2026

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado:	GREGORIO VERA JARA	**RUC:**	1218178-1
Entidad Contratante:	Uoc Itapua	**Descripción del Llamado / Contrato**	458665 - Construcción del Polideportivo Municipal del Distrito de Coronel Bogado, Segunda Etapa - Plurianual
Monto del Contrato:	₲ 1.912.793.528	**Año / Periodo:**	2026 / ABRIL

Número	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Funciones Exclusivas	Remuneración (Guaraníes)	Relación	Estado
1	Ramon	Servin Balmaceda	3223375	Cumple	2.899.048	LABORAL	Activo
2	Wilson Dejesus	Vera Jara	5051123	Cumple	2.899.048	LABORAL	Activo
3	Sergio Ruben	Yeza Vera	3261756	Cumple	2.899.048	LABORAL	Activo
4	Liz Mariela	Vera Mendez	3619351	Cumple	2.899.048	LABORAL	Activo
5	Esteban	Fretes Ferreira	3433987	Cumple	2.899.048	LABORAL	Activo
6	Carlos Daniel	Galeano Larramendia	3243105	Cumple	2.899.048	LABORAL	Activo

Usuario Impresión: 1218178 - GREGORIO VERA JARA

Fecha Impresión: 15/04/2026

Lote 5712771434 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270225126880

FECHA 15/04/2026

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	1218178	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	1	VERA JARA GREGORIO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 15/05/2026

NÚMERO DE CONTROL : 8B4108D8

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427112181788B4108D8

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO CON EL SEGURO SOCIAL

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

USUARIO EMISION: 1218178

NRO. CERTIFICADO: 542218

FECHA EMISION: 16-04-2026

VENCIMIENTO: 14-05-2026

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 1218178-1

Nro. Certificado: 542218

Razon Social: VERA JARA GREGORIO

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Fecha de Inscripcion: 25-09-2009

Cantidad de Asegurados: 6

Nro. Patronal(es): 0355-40-0024 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

LA MISIÓN DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL "Otorgar las prestaciones del seguro social con calidad y calidez mediante la excelencia en la gestión de los talentos y recursos, para el bienestar de sus beneficiarios".

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - **REPSE**

N° RUC:	**12181781**
Razón Social o Contribuyente:	**GREGORIO VERA JARA**
Nombre Comercial:	**LAPACHO CONSTRUCCIONES**
Dirección:	**SGTO. DURE ESQUINA DIONISIO GONZÁLEZ Y DEF. DEL CHACO - CORONEL BOGADO**
Teléfono:	**0741- 252 024**
Correo electrónico:	**gverajara@gmail.com**

Nro. de Registro REPSE **001309**

Conforme al Decreto N° 6866/11 y normativas vigentes concordantes.

Otorgado en Asunción el **26/06/2015**

Fecha de última renovación el **03/07/2025**

Este registro tiene fecha de vencimiento el **03/07/2027**

Constancia generada el **03/07/2025 15:56:39**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - **REPSE**

DETALLES

N° RUC:	**12181781**
Razón Social o Contribuyente:	**GREGORIO VERA JARA**
Nombre Comercial:	**LAPACHO CONSTRUCCIONES**

Nombre Establecimiento:	**VERA JARA GREGORIO**
Dirección:	**SGTO. DURE C/ DIONISIO GONZÁLEZ Y DEF. DEL CHACO - CORONEL BOGADO - ITAPUA**
NSP:	**1.0101.10.00 - Servicios de construcción de edificios residenciales con uno o dos pisos**
Descripción Actividad:	**(SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES CON UNO O DOS PISOS)**
NSP:	**1.0102.90.00 - Otros servicios de construcción de edificios no residenciales**
Descripción Actividad:	**(SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES)**
NSP:	**1.0103.11.00 - Servicios de construcción de autopistas (excepto autopistas elevadas), calles y carreteras**

Constancia generada el **03/07/2025 15:56:39**

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ MBA'E'APOPY HA ÑEMU MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - **REPSE**

DETALLES

N° RUC: **12181781**

Razón Social o Contribuyente: **GREGORIO VERA JARA**

Nombre Comercial: **LAPACHO CONSTRUCCIONES**

Descripción Actividad: **(SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS (EXCEPTO AUTOPISTAS ELEVADAS), CALLES Y CARRETERAS)**

NSP: **1.0103.20 - Servicios de construcción de vías férreas**

Descripción Actividad: **(SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE VÍAS FÉRREAS)**

NSP: **1.0104.10.00 - Servicios de construcción de puentes y autopistas elevadas**

Descripción Actividad: **(SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES Y AUTOPISTAS ELEVADAS)**

NSP: **1.0104.20.00 - Servicios de construcción de túneles**

Descripción Actividad: **(SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TÚNELES)**

NSP: **1.1403.21 - Servicios de ingeniería de proyectos de construcción**

Descripción Actividad: **(SERVICIOS DE INGENIERÍA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN)**

Constancia generada el **03/07/2025 15:56:39**

JAVIER PEREIRA | GOBERNADOR DE ITAPÚA

lugar de: OPORTUNIDADES

ACTA DE INICIO

REFERENCIA:

ID.: 458.665
LPN – Licitación Pública Nacional - Construcción del Polideportivo Municipal del Distrito de Coronel Bogado, Segunda Etapa - Plurianual
CONTRATO: 16/2025
DISTRITO: Coronel Bogado

CONTRATISTA: GREGORIO VERA JARA

En el Distrito de Encarnación, República del Paraguay, a los 03 (Tres) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco; se reúnen el **ING. CUSTI ECKERT** Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte y el **ING. ANDRÉS DÍAZ** Fiscal de obras, ambos en representación de la Gobernación de Itapúa; y el **SR. GREGORIO VERA JARA** de la firma unipersonal contratada para ejecutar y entregar los trabajos correspondientes a la " Construcción del Polideportivo Municipal del Distrito de Coronel Bogado, Segunda Etapa - Plurianual."----------

Los arriba mencionados vienen a suscribir el presente Acta de inicio, a fin de dar seguimiento de los trabajos acordados entre las partes, conforme al contrato suscrito, que establece al plazo de ejecución de los trabajos y entrega de los mismos al Comitente en 240 (doscientos cuarenta) días calendario. -

Así mismo el Contratista se compromete por este instrumento a atender cualquier reclamo, que pudieran surgir durante la ejecución de los trabajos y que sean observados por la fiscalización. -----

En prueba de conformidad de las partes, firman los nombrados, el presente Acta, en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, con destino a cada una de las partes, en el lugar y fecha de su otorgamiento. ----------

Gregorio Vera Jara
Lapacho Construcciones
Tel. (0975) 604 963
Cnel. Bogado - Py.

SR. GREGORIO VERA JARA
Contratista

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Ing. Andrés Díaz
Secretaria de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

ING. ANDRÉS DÍAZ
Fiscal de Obras

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

ING. CUSTI ECKERT
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Custi Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

FISCALIZACIÓN DE OBRAS

INFORME N°07 - CERTIFICADO N°07

LPN – Licitación Pública Nacional Nº02/2025 – "Construcción del Polideportivo Municipal del Distrito de Coronel Bogado, Segunda Etapa – Plurianual" IDNº 458.665

OBRA: Construcción de Polideportivo

BENEFICIARIO: Distrito de Coronel Bogado

FISCAL DE OBRAS: Ing. Andrés Díaz

AVANCE DE OBRA ACUMULADO: 91,47 %

FECHA DE VISITA: 04/05/26

FECHA DE INFORME: 08/05/26

UBICACIÓN	DISTRITO	MONTO DE LA OBRA
Coronel Bogado	Coronel Bogado	1.912.793.528
CONTRATISTA	**N° DE TELEFONO**	**N° DE CONTRATO**
Gregorio Vera Jara	0985916562	16/2025
PLAZO CONTRACTUAL	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL**
240 días	03 – octubre - 2025	31 – Mayo - 2026

OBSERVACIONES GENERALES:

Según las observaciones realizadas el día 04/05/26 la obra se encuentra en proceso de ejecución, con un avance del 91,47%.

Se observó al equipo de trabajo durante este periodo con visitas periódicas en la realización de diferentes rubros contractuales, entre los cuales se incluyen, corte y armado de varillas para la elaboración de columnas y colado de hormigón, ejecución de vigas intermedias y losas.

La obra avanza según lo proyectado, siguiendo las indicaciones, realizando controles de calidad.

Se adjuntan a continuación evidencias fotográficas de los trabajos realizados:

Ing. Andrés Díaz
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa

Se observa el encofrado de columnas, con las dimensiones y varillas utilizadas respetando los planos

Se observa al equipo de trabajo realizando ajustes en las vigas, con sus respectivas armaduras respetando las indicaciones en los planos

Ing. ... Díaz
Secretaria de Obras Públicas

.....

Fiscal de Obra

Gobernación de Itapúa

Teléf: +59571204568
Correos: general@itapua.gov.py
generalitapuapy@gmail.com

Gobernación de Itapúa / RUC: 80009721-1
Dirección: Avda. Cnel. Luis Irrazábal e/ Cap. Pedro Juan Caballero y Sgto. Reverchon
Encarnación - Itapúa - Paraguay
