MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

Licitación: 441598 - LPN 02"Construcción de primera planta Sede Unamis" Proceso Plurianual

Licitación: 441598 - LPN 02"Construcción de primera planta Sede Unamis" Proceso Plurianual

Empresa contratista: Ecoservice Group SA

Planilla de Certificado N° 5

Periodo: Del 17 de enero de 2024 al 17 de febrero de 2025

Fecha de presentación	24/01/2025
Fecha de Inicio	17/09/2024
Plazo Inicial	280
Dias de Lluvia	0
Plazo Inicial + Prorroga	0
Dias trascurridos	150
Dias de retrazo	0

		CONTRACTUAL				CANTIDADES			AVANCE (%)			MONTO BRUTO		
Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Preparacion de obra	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: UNIDAD	1,00											
	Vallado de Obra	Metro lineal	150,00	135.200	20.280.000	150,00	**0,00**	150,00	100,00 %	**0,00 %**	100,00 %	20.280.000	**0**	20.280.000
	Obrador	metros cuadrados	16,00	187.200	2.995.200	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
2	Replanteo y marcación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	776,00	6.240	4.842.240	776,00	**0,00**	776,00	100,00 %	**0,00 %**	100,00 %	4.842.240	**0**	4.842.240
3	Cartel con impresion	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	550.000	550.000	1,00	**0,00**	1,00	100,00 %	**0,00 %**	100,00 %	550.000	**0**	550.000
4	Estructura de H° A°	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00			0,00	**0,00**	0,00						
	Columnas	metros cubicos	19,00	2.832.000	53.808.000	19,00	**0,00**	19,00	100,00 %	**0,00 %**	100,00 %	53.808.000	**0**	53.808.000
	Escalera de H°A°	unidad	1,00	6.500.000	6.500.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Vigas	metros cubicos	63,00	2.832.000	178.416.000	63,00	**0,00**	63,00	100,00 %	**0,00 %**	100,00 %	178.416.000	**0**	178.416.000
	Losa	metros cubicos	94,00	2.832.000	266.208.000	94,00	**0,00**	94,00	100,00 %	**0,00 %**	100,00 %	266.208.000	**0**	266.208.000
5	Mampostería	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		0	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Elevación de 0,15 para revocar	metros cuadrados	135,00	114.000	15.390.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Elevación de 0,20 para revocar	metros cuadrados	655,00	155.000	101.525.000	0,00	**388,00**	388,00	0,00 %	**59,24 %**	59,24 %	0	**60.140.000**	60.140.000
	Envarillado sobre abertura	Metro lineal	222,00	23.000	5.106.000	0,00	**150,00**	150,00	0,00 %	**67,57 %**	67,57 %	0	**3.450.000**	3.450.000
6	Aislación - asfáltica	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	222,00	37.000	8.214.000	0,00	**188,00**	188,00	0,00 %	**84,68 %**	84,68 %	0	**6.956.000**	6.956.000
7	Aislación - losa sanitaria	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	48,00	135.200	6.489.600	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
8	Revoques	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		0	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Revoque de Cielorraso	metros cuadrados	776,00	53.000	41.128.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0

ecoservice GROUP S A
RUC 80058993-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

	Revoque de mocheta	Metro lineal	236,60	40.000	9.464.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	De paredes interior y exterior a una capa	metros cuadrados	1.580,00	39.000	61.620.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
9	Colocación de pisos - Contrapisos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		0	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Piso de 30x30cm	metros cuadrados	776,00	160.000	124.160.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms	metros cuadrados	776,00	36.400	28.246.400	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
10	Colocación de zócalo	unidad de medida: Metro lineal presentación: EVENTO	330,00	40.000	13.200.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
11	Revestimientos	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		0	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Revestimiento de pared - con piedra	metros cuadrados	75,00	200.000	15.000.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Revestimiento de pared - con porcelanato	metros cuadrados	120,00	147.000	17.640.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
12	Instalaciones sanitarias	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		0	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - Cámara de inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1,00	27.000.000	27.000.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Mesada de granito	Metro lineal	6,00	850.000	5.100.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
13	Instalación eléctrica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		0	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Artefactos Fluorescentes	unidad	11,00	114.400	1.258.400	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Tablero TS de 60 AG	unidad	1,00	4.800.000	4.800.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Alimentacion de los Circuitos	unidad	295,00	93.600	27.612.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Panel Led	unidad	168,00	100.000	16.800.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Artefactos Luminosos	unidad	5,00	370.000	1.850.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Tablero General, dispositivos de protección de sobretensión	Unidad Medida Global	1,00	41.600.000	41.600.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Instalación y Provisión de Banco Capacitor de 120Kvar automático de 7 etapas	Unidad Medida Global	1,00	22.880.000	22.880.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Puesta a Tierra	Unidad Medida Global	1,00	8.200.000	8.200.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Reductor de corriente	unidad	1,00	87.000.000	87.000.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
14	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	47,00	650.000	30.550.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
15	Carpinteria metalica	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		0	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Puerta metálica (tipo persiana) con marco y herraje, de 0,50 x1,20 (provisión y colocación) Primer Nivel	unidad	2,00	1.248.000	2.496.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0

ecoservice GROUP S A
RUC 80058998-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

	Baranda Metalica	Metro lineal	86,00	468.000	40.248.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Baranda Metalica Planta baja	Metro lineal	15,00	468.000	7.020.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Puerta metálica (tipo persiana) con marco y herraje, de 0,50 x1,20 (provisión y colocación) Planta baja	unidad	2,00	1.248.000	2.496.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
16	Aberturas	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		0	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Puerta Placa con marco y herrajes de3 0,90x2,10 (provisión y colocación)	unidad	2,00	1.500.000	3.000.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Puerta Placa con marco y herrajes de 1,50x2,10 (provisión y colocación)	unidad	11,00	2.000.000	22.000.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
17	Cartel con impresión - Placa Conmemorativa	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1,00	1.850.000	1.850.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
18	Colocacion de vidrios	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	105,00	750.000	78.750.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
19	Mampara	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		0	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	De Eucatex divisoria	metros cuadrados	35,00	266.000	9.310.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
20	Montaje de cielorraso	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		0	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Cielorraso de Durlok Primer Nivel en Sanitario	metros cuadrados	48,00	160.000	7.680.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Cielorraso de Durlok Planta Baja en Sanitario	metros cuadrados	48,00	160.000	7.680.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
21	Pintura	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		0	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	De paredes exterior Planta Baja	metros cuadrados	490,00	27.500	13.475.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	De cielorraso al látex	metros cuadrados	776,00	36.200	28.091.200	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	De cielorraso al látex con enduido Planta Baja	metros cuadrados	689,00	39.600	27.284.400	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	De revestido de piedra con antimoho incoloro	metros cuadrados	75,00	22.000	1.650.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	De paredes revocadas al látex	metros cuadrados	790,00	27.500	21.725.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
22	Prevención contra incendios	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		0	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Prevención contra incendio tipo ABC	unidad	5,00	624.000	3.120.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Iluminación autónoma de emergencia tipo Led	unidad	8,00	416.000	3.328.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Cartel Luminoso salida de Emegencia	unidad	6,00	416.000	2.496.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Detector de humo - calor	unidad	15,00	312.000	4.680.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Pulsador manual de alarma	unidad	1,00	624.000	624.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0

ecoservice
RUC 80058999-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

	Alarma audiovisual c/luz estroboscopica	unidad	1,00	780.000	780.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Cables caja y accesorios menores	unidad	1,00	8.268.000	8.268.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
23	Limpieza de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	776,00	6.300	4.888.800	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
24	Replanteo y marcación - (Obras Complementarias)	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	305,00	6.240	1.903.200	305,00	**0,00**	305,00	100,00 %	**0,00 %**	100,00 %	1.903.200	**0**	1.903.200
25	Relleno y compactacion de terreno - Obras Complementarias	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		0	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Relleno de Terreno	metros cubicos	150,00	69.000	10.350.000	130,00	**20,00**	150,00	86,67 %	**13,33 %**	100,00 %	8.970.000	**1.380.000**	10.350.000
	Relleno de Contención	metros cubicos	200,00	55.000	11.000.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
26	Mampostería de Nivelación	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	180,00	185.000	33.300.000	160,00	**20,00**	180,00	88,89 %	**11,11 %**	100,00 %	29.600.000	**3.700.000**	33.300.000
27	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	120,00	39.000	4.680.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
28	Colocacion de pisos - Contrapiso	unidad de medida: Unidad Medida Global presentación: EVENTO	1,00		0	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms	metros cuadrados	177,00	36.400	6.442.800	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Piso de granito antideslizante	metros cuadrados	125,00	160.000	20.000.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
	Carpeta	Metro lineal	70,00	34.000	2.380.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
29	Colocacion de pasto	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	600,00	41.600	24.960.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
30	Servicio de pintura - de paredes revocadas al latex	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	120,00	27.500	3.300.000	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
31	Limpieza de obra	unidad de medida: Metros cuadrados presentación: EVENTO	305,00	6.300	1.921.500	0,00	**0,00**	0,00	0,00 %	**0,00 %**	0,00 %	0	**0**	0
				Precio Total	**1.678.610.740**				**33,63 %**	**4,51 %**	**38,14 %**	**564.577.440**	**75.626.000**	**640.203.440**

Sr. Luis Miguel Martinez Villar
Representante Legal
Contratista: Ecoservice Group SA

ecoservice GROUP S.A.
RUC 80058998-0

Arq. Diego Valdez
Fiscal de Obra
Municipalidad de San Ignacio Guazu

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

Licitación: 441598 - LPN 02"Construcción de primera planta Sede Unamis" Proceso Plurianual

CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP SA

Planilla de certificado N° 5

Periodo: Del 17 de enero de 2024 al 17 de febrero de 2025

En el lugar de obra, Distrito de San Ignacio Guazu, Departamento de Misiones, a los 17 días del mes de febrero del año 2025, se reunen la empresa Contratista "Ecoservice Group SA" representada por el Sr. Luis Miguel Martínez Villar, y la Fiscalización representada por el Arq. Diego Valdez, con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes.

Ítem	Descripción	Cantidad	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO
1	Preparacion de obra	1,00			
	Vallado de Obra	150,00	150,00	**0,00**	150,00
	Obrador	16,00	0,00	**0,00**	0,00
2	Replanteo y marcación	776,00	776,00	**0,00**	776,00
3	Cartel con impresion	1,00	1,00	**0,00**	1,00
4	Estructura de H° A°	1,00			
	Columnas	19,00	19,00	**0,00**	19,00
	Escalera de H°A°	1,00	0,00		0,00
	Vigas	63,00	63,00	**0,00**	63,00
	Losa	94,00	94,00	**0,00**	94,00
5	Mamposteria	1,00			
	Elevación de 0,15 para revocar	135,00	0,00		0,00
	Elevación de 0,20 para revocar	655,00	0,00	**388,00**	388,00
	Envarillado sobre abertura	222,00	0,00	**150,00**	150,00

ecoservice GROUP S.A.
RUC 80058998-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

6	Aislación - asfáltica	222,00	0,00	**188,00**	188,00
7	Aislación - losa sanitaria	48,00	0,00		0,00
8	Revoques	1,00	0,00		0,00
	Revoque de Cielorraso	776,00	0,00	**0,00**	0,00
	Revoque de mocheta	236,60	0,00		0,00
	De paredes interior y exterior a una capa	1.580,00	0,00		0,00
9	Colocación de pisos - Contrapisos	1,00	0,00		0,00
	Piso de 30x30cm	776,00	0,00		0,00
	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms	776,00	0,00		0,00
10	Colocación de zócalo	330,00	0,00		0,00
11	Revestimientos	1,00	0,00		0,00
	Revestimiento de pared - con piedra	75,00	0,00		0,00
	Revestimiento de pared - con porcelanato	120,00	0,00		0,00
12	Instalaciones sanitarias	1,00	0,00		0,00
	Agua Corriente - Desagüe Cloacal - Cámara de inspección y artefactos sanitarios	1,00	0,00		0,00
	Mesada de granito	6,00	0,00		0,00
13	Instalación eléctrica	1,00	0,00		0,00
	Artefactos Fluorescentes	11,00	0,00		0,00
	Tablero TS de 60 AG	1,00	0,00		0,00
	Alimentacion de los Circuitos	295,00	0,00		0,00
	Panel Led	168,00	0,00		0,00
	Artefacto de Iluminación	5,00	0,00		0,00

ecoservice GROUP S.A.
RUC 80058996-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

	Tablero General, dispositivos de protección de sobretensión	1,00	0,00		0,00
	Instalación y Provisión de Banco Capacitor de 120Kvar automático de 7 etapas	1,00	0,00		0,00
	Puesta a Tierra	1,00	0,00		0,00
	Reductor de corriente	1,00	0,00		0,00
14	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	47,00	0,00		0,00
15	Carpinteria metalica	1,00	0,00		0,00
	Puerta metálica (tipo persiana) con marco y herraje, de 0,50 x1,20 (provisión y colocación) Primer Nivel	2,00	0,00		0,00
	Baranda Metalica	86,00	0,00		0,00
	Baranda Metalica Planta baja	15,00	0,00		0,00
	Puerta metálica (tipo persiana) con marco y herraje, de 0,50 x1,20 (provisión y colocación) Planta baja	2,00	0,00		0,00
16	Aberturas	1,00	0,00		0,00
	Puerta Placa con marco y herrajes de3 0,90x2,10 (provisión y colocación)	2,00	0,00		0,00
	Puerta Placa con marco y herrajes de 1,50x2,10 (provisión y colocación)	11,00	0,00		0,00
17	Cartel con impresión - Placa Conmemorativa	1,00	0,00		0,00
18	Colocacion de vidrios	105,00	0,00		0,00
19	Mampara	1,00	0,00		0,00
	De Eucatex divisoria	35,00	0,00		0,00
20	Montaje de cielorraso	1,00	0,00		0,00
	Cielorraso de Durlok Primer Nivel en Sanitario	48,00	0,00		0,00
	Cielorraso de Durlok Planta Baja en Sanitario	48,00	0,00		0,00
21	Pintura	1,00	0,00		0,00
	De paredes exterior Planta Baja	490,00	0,00		0,00

ecoservice group S.A.
RUC 80058999-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

	De cielorraso al látex	776,00	0,00		0,00
	De cielorraso al látex con enduido Planta Baja	689,00	0,00		0,00
	De revestido de piedra con antimoho incoloro	75,00	0,00		0,00
	De paredes revocadas al látex	790,00	0,00		0,00
22	Prevención contra incendios	1,00	0,00		0,00
	Prevención contra incendio tipo ABC	5,00	0,00		0,00
	Iluminación autónoma de emergencia tipo Led	8,00	0,00		0,00
	Cartel Luminoso salida de Emegencia	6,00	0,00		0,00
	Detector de humo - calor	15,00	0,00		0,00
	Pulsador manual de alarma	1,00	0,00		0,00
	Alarma audiovisual c/luz estroboscopica	1,00	0,00		0,00
	Cables caja y accesorios menores	1,00	0,00		0,00
23	Limpieza de obra	776,00	0,00		0,00
24	Replanteo y marcación - (Obras Complementarias)	305,00	305,00	**0,00**	305,00
25	Relleno y compactacion de terreno - Obras Complementarias	1,00	0,00		0,00
	Relleno de Terreno	150,00	130,00	**20,00**	150,00
	Relleno de Contención	200,00	0,00		0,00
26	Mampostería de Nivelación	180,00	160,00	**20,00**	180,00
27	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	120,00	0,00		0,00
28	Colocacion de pisos - Contrapiso	1,00	0,00		0,00
	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms	177,00	0,00		0,00
	Piso de granito antideslizante	125,00	0,00		0,00

ecoservice GROUP S.A. RUC 80058958-0

Diego A. Valdez A
Arquitecto

	Carpeta	70,00	0,00		0,00
29	Colocacion de pasto	600,00	0,00		0,00
30	Servicio de pintura - de paredes revocadas al latex	120,00	0,00		0,00
31	Limpieza de obra	305,00	0,00		0,00

.....
Sr. Luis Miguel Martinez Villar
Representante Legal

Contratista: Ecoservice Group SA

ecoservice GROUP S A
RUC 80058998-0

.....
Arq. Diego Valdez
Fiscal de Obra

Municipalidad de San Ignacio Guazu

iego A. Valdez A.
Arquitecto

Licitación: 441598 - LPN 02"Construcción de primera planta Sede Unamis" Proceso Plurianual

Item	Descripción	Precio Total	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Preparacion de obra	23.275.200	23.275.200								
2	Replanteo y marcación	4.842.240	4.842.240								
3	Cartel con impresion	550.000	550.000								
4	Estructura de H° A°	504.932.000		252.466.000	252.466.000						
5	Mamposteria	122.021.000			89.482.067	32.538.933					
6	Aislación - asfáltica	8.214.000			4.107.000	4.107.000					
7	Aislación - losa sanitaria	6.489.600				6.489.600					
8	Revoques	112.212.000					89.769.600	22.442.400			
9	Colocación de pisos - Contrapisos	152.406.400					43.544.686	87.089.371	21.772.343		
10	Colocación de zócalo	13.200.000						6.600.000	6.600.000		
11	Revestimientos	32.640.000							19.584.000	13.056.000	
12	Instalaciones sanitarias	32.100.000						12.840.000	6.420.000	12.840.000	
13	Instalación eléctrica	212.000.400						79.500.150	53.000.100	53.000.100	26.500.050
14	Instalacion / Montaje / Desmontaje de Ventilador de techo	30.550.000								22.912.500	7.637.500
15	Carpinteria metalica	52.260.000						17.420.000	17.420.000	17.420.000	
16	Aberturas	25.000.000						12.500.000	12.500.000		
17	Cartel con impresión - Placa Conmemorativa	1.850.000									1.850.000
18	Colocacion de vidrios	78.750.000						19.687.500	59.062.500		
19	Mampara	9.310.000							4.655.000	4.655.000	
20	Montaje de cielorraso	15.360.000								15.360.000	
21	Pintura	92.225.600								55.335.360	36.890.240
22	Prevención contra incendios	23.296.000									23.296.000
23	Limpieza de obra	4.888.800									4.888.800

ecoservice GROUP S.A.
RUC 80050932-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

24	Replanteo y marcación - (Obras Complementarias)	1.903.200		1.903.200							
25	Relleno y compactacion de terreno - Obras Complementarias	21.350.000			21.350.000						
26	Mampostería de Nivelación	33.300.000		16.650.000	16.650.000						
27	Revoques - de paredes interior y exterior a una capa	4.680.000							4.680.000		
28	Colocacion de pisos - Contrapiso	28.822.800							14.411.400	14.411.400	
29	Colocacion de pasto	24.960.000								12.480.000	12.480.000
30	Servicio de pintura - de paredes revocadas al latex	3.300.000									3.300.000
31	Limpieza de obra	1.921.500									1.921.500
		1.678.610.740	28.667.440	271.019.200	384.055.067	43.135.533	133.314.286	258.079.421	220.105.343	221.470.360	118.764.090
		porcentaje mensual	1,71 %	16,15 %	22,88 %	2,57 %	7,94 %	15,37 %	13,11 %	13,19 %	7,08 %
		monto acumulado	28.667.440	299.686.640	683.741.707	726.877.240	860.191.526	1.118.270.947	1.338.376.290	1.559.846.650	1.678.610.740
		porcentaje acumulado	1,71 %	17,85 %	40,73 %	43,30 %	51,24 %	66,62 %	79,73 %	92,92 %	100,00 %

ecoservice GROUP S A
RUC 80058998-0

.ego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

Licitación: 441598 - LPN 02"Construcción de primera planta Sede Unamis" Proceso Plurianual

CONTRATISTA: ECOSERVICE GROUP SA
FISCALIZACIÓN: ARQ. DIEGO VALDEZ

RESUMEN

	TIEMPO CONTRACTUAL									
CONTRACTUAL	INICIO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Monto bruto mensual	-	**28.667.440**	**217.019.200**	**384.055.067**	**43.135.533**	**133.314.286**	**258.079.421**	**215.425.343**	**221.470.360**	**118.764.090**
Porcentaje Avance Mensual		1,71	16,15	22,88	2,57	7,94	15,37	12,83	7,08	7,08
Monto bruto acumulado mensual		**28.667.440**	**245.686.640**	**629.741.707**	**672.877.240**	**806.191.526**	**1.064.270.947**	**1.279.696.290**	**1.501.166.650**	**1.619.930.740**
Porcentaje Avance acumulado mensual		**1,71**	**17,86**	**40,74**	**43,31**	**51,25**	**66,62**	**79,45**	**86,53**	**100,00**
CERTIFICADO										
Monto bruto mensual	-	**44.096.640**	**128.289.600**	**395.047.600**	**40.473.200**	**75.626.000**				
Porcentaje Avance Mensual	-	2,63	7,69	23,53	2,41	4,51				
Monto bruto acumulado mensual	-	**44.096.640**	**172.386.240**	**567.433.840**	**607.907.040**	**683.533.040**				
Porcentaje Avance acumulado mensual	-	**2,63**	**7,69**	**31,22**	**33,63**	**38,14**				
Porcentaje avance acumulado mensual contractual	-	**1,71**	**17,86**	**40,74**	**43,31**	**51,25**				
Porcentaje Avance Mensual	-	2,63	7,69	31,22	33,63	38,14				

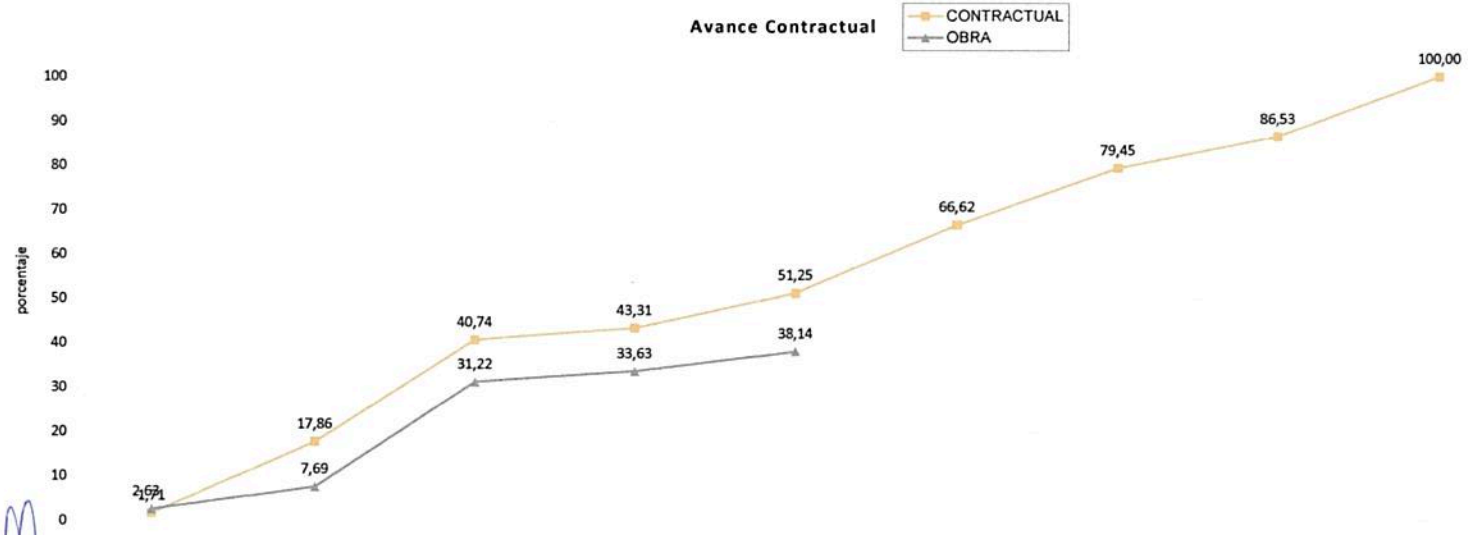

.....
Sr. Luis Miguel Martinez Villar
Representante Legal
Contratista: Ecoservice Group SA
ecoservice GROUP S A
RUC 80058998-0

.....
Arq. Diego Valdez
Fiscal de Obra
Municipalidad de San Ignacio Guazu
Diego A. Valdez A
Arquitecto
