Gobernación de Itapúa

Resumen del Certificado Básico Nº 1

Mes: JUNIO

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio Pradera Alta del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 387469

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones por Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio Pradera Alta del Distrito de Encarnación - Plurianual	100,00%	391.401.161	0,00%	0	33,39%	130.682.470	33,39%	130.682.470
Total Contrato		**100,00%**	**391.401.161**	**0,00%**	**0**	**33,39%**	**130.682.470**	**33,39%**	**130.682.470**

B	Deducciones Totales por Contrato			Deducciones Certificado Anterior	Deducción Presente Certificado	Deducciones Total a la Fecha
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	78.280.232	0	26.136.494	26.136.494
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**78.280.232**	**0**	**26.136.494**	**26.136.494**
C.I	Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				*104.545.976*	
C.II	Multas				*0*	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				***104.545.976***	

Certificado Basico Nº 1

Mes: JUNIO

Contrato Nº : 54/20

Monto Básico: 391.401.161

Contratista: HABITARE S.R.L

Fecha de Inicio:	24-may-21
Plazo de Ejecución (Dias):	180,00
Fecha de Terminación:	20-nov-21

SON GUARANIES: ***Ciento cuatro millones quinientos cuarenta y cinco mil novecientos setenta y seis***

GOBERNACION DE ITAPUA
Secretario Departamental

GOBERNACION DE ITAPUA
Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Fiscal de Obras

HABITARE S.R.L
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 5[illegible]
Contratista
Representante Legal

2 (dos)

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIF. BASICO N°	1
PLANILLA I	
Monto Básico: 391.401.161	Plazo de Ejecución: (Días) 180,00
PLANILLA DE MEDICIÓN PORCENTUAL	Mes: JUNIO
Contrato N° : 54/20	Contratista: HABITARE S.R.L

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio Pradera Alta del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 387469

Ítem	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Incidencia	OBRA EJECUTADA EN PORCENTAJE			OBRA EJECUTADA EN INCIDENCIA		
							Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
1	Preparacion de obra- Trabajos preliminares											
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES: Movilización, cartel de obra, carteles de señalización y servicios complementarios	Unidad Medida Global	1	4.275.700	4.275.700	**0,0109**	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0109	0,0109
1.2	TRABAJOS PRELIMINARES:Relevamiento topográfico	Unidad Medida Global	1	5.549.302	5.549.302	**0,0142**	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0142	0,0142
1.3	MOVIMIENTO DE SUELO: Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen)	Metros cuadrados	5.346,4	5.241	28.018.955	**0,0716**	0,00%	58,92%	58,92%	0,0000	0,0422	0,0422
1.4	MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas	Metros cuadrados	1.304	1.126	1.468.108	**0,0038**	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
1.5	Demolición de baden existente	Metros cuadrados	20	16.301	326.025	**0,0008**	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
1.6	PAVIMENTO: Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	4.564	28.315	129.229.280	**0,3302**	0,00%	44,48%	44,48%	0,0000	0,1469	0,1469
1.7	PAVIMENTO:Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	4.564	1.543	7.043.621	**0,0180**	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
1.8	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA :Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	94,05	1.048.544	98.615.605	**0,2520**	0,00%	47,53%	47,53%	0,0000	0,1197	0,1197
1.9	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Cordón escondido de hormigón prefabricado 30x15cm	Metros cúbicos	3,78	1.048.544	3.963.498	**0,0101**	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
1.10	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén de H°A°, (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	50,4	2.178.204	109.781.456	**0,2805**	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
1.11	Lmipieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	3.129.610	3.129.610	**0,0080**	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL					**391.401.161**					**0,00%**	**33,39%**	**33,39%**

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Contratista
Alejandro Paniagua González
Representante Legal

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

GOBERNACION DE ITAPUA
Fiscal de Obras
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

4 (cuatro)

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIF. BASICO N°	1
PLANILLA I	
Monto Básico: 391.401.161	Plazo de Ejecución: (Días) 180,00
PLANILLA DE CERTIFICADO	Mes: JUNIO
Contrato N° : 54/20	Contratista: HABITARE S.R.L

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio Pradera Alta del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 387469

Ítem	Rubros	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	OBRA EJECUTADA EN CANTIDADES			OBRA EJECUTADA EN MONTO		
						Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
1	Construcción de empedrado										
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES: Movilización, cartel de obra, carteles de señalizalición y servicios complementarios	Unidad Medida Global	1	4.275.700	4.275.700	0,00	1,00	1,00	0	4.275.700	4.275.700
1.2	TRABAJOS PRELIMINARES:Relevamiento topográfico	Unidad Medida Global	1	5.549.302	5.549.302	0,00	1,00	1,00	0	5.549.302	5.549.302
1.3	MOVIMIENTO DE SUELO: Movimiento de suelo: apertura de caja y traslado de materiales sobrantes. Regularización para respetar proyecto (incluye desmonte y terraplen)	Metros cuadrados	5.346,4	5.241	28.018.955	0,00	3.150,00	3.150,00	0	16.508.250	16.508.250
1.4	MOVIMIENTO DE SUELO: Relleno, nivelación y compactación para protección de cordones. Sector banquinas	Metros cuadrados	1.304	1.126	1.468.108	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.5	Demolición de baden existente	Metros cuadrados	20	16.301	326.025	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.6	PAVIMENTO: Empedrado piedra basáltica(incluye colchón de tierra y compactación)	Metros cuadrados	4.564	28.315	129.229.280	0,00	2.030,00	2.030,00	0	57.479.281	57.479.281
1.7	PAVIMENTO:Relleno de piedra triturada de 6ta, sobre pavimento tipo empedrado. Incluye compactación	Metros cuadrados	4.564	1.543	7.043.621	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.8	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA :Cordón cuneta de hormigón (H° elaborado de fck= 180 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	94,05	1.048.544	98.615.605	0,00	44,70	44,70	0	46.869.937	46.869.937
1.9	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Cordón escondido de hormigón prefabricado 30x15cm	Metros cúbicos	3,78	1.048.544	3.963.498	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.10	DRENAJE Y PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén de H°A°. (H° elaborado de fck= 210 kg/cm2). Ver plano de detalles.	Metros cúbicos	50,4	2.178.204	109.781.456	0,00	0,00	0,00	0	0	0
1.11	Lmipieza periódica y final de obra	Unidad Medida Global	1	3.129.610	3.129.610	0,00	0,00	0,00	0	0	0
TOTAL					**391.401.161**				**0**	**130.682.470**	**130.682.470**

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Contratista
Alejandro Paniagua González
Representante Legal

GOBERNACION DE ITAPUA
Fiscal de Obras

Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

5 (cinco)

10 (sus)

Certificado Basico Nº 1

OBRA: Construcción de Pavimento tipo Empedrado, con Cordón Cuneta y Badenes de H°A° en el Barrio Pradera Alta del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 387469

Monto del Contrato Gs.:		391.401.161				**Term. Prevista:**		20-nov-21
Plazo Contractual:		180,00	(Días Calendario)			**Ampliaciones:**		0 días
Inicio de Obra:		24-may-21				**Mes: JUNIO**		

CUADRO DE AVANCE

Contrato Nº : 54/20

MES	PREVISTO Gs		EJECUTADO Gs		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Junio 2021	48.835.921	48.835.921	130.682.470	130.682.470	12,48%	12,48%	33,39%	33,39%
Julio 2021	38.066.382	86.902.304			9,73%	22,20%		
Agosto 2021	71.056.976	157.959.280			18,15%	40,36%		
Septiembre 2021	103.687.501	261.646.781			26,49%	66,85%		
Octubre 2021	91.682.983	353.329.764			23,42%	90,27%		
Noviembre 2021	38.071.396	391.401.161			9,73%	100,00%		

CURVA DE AVANCE

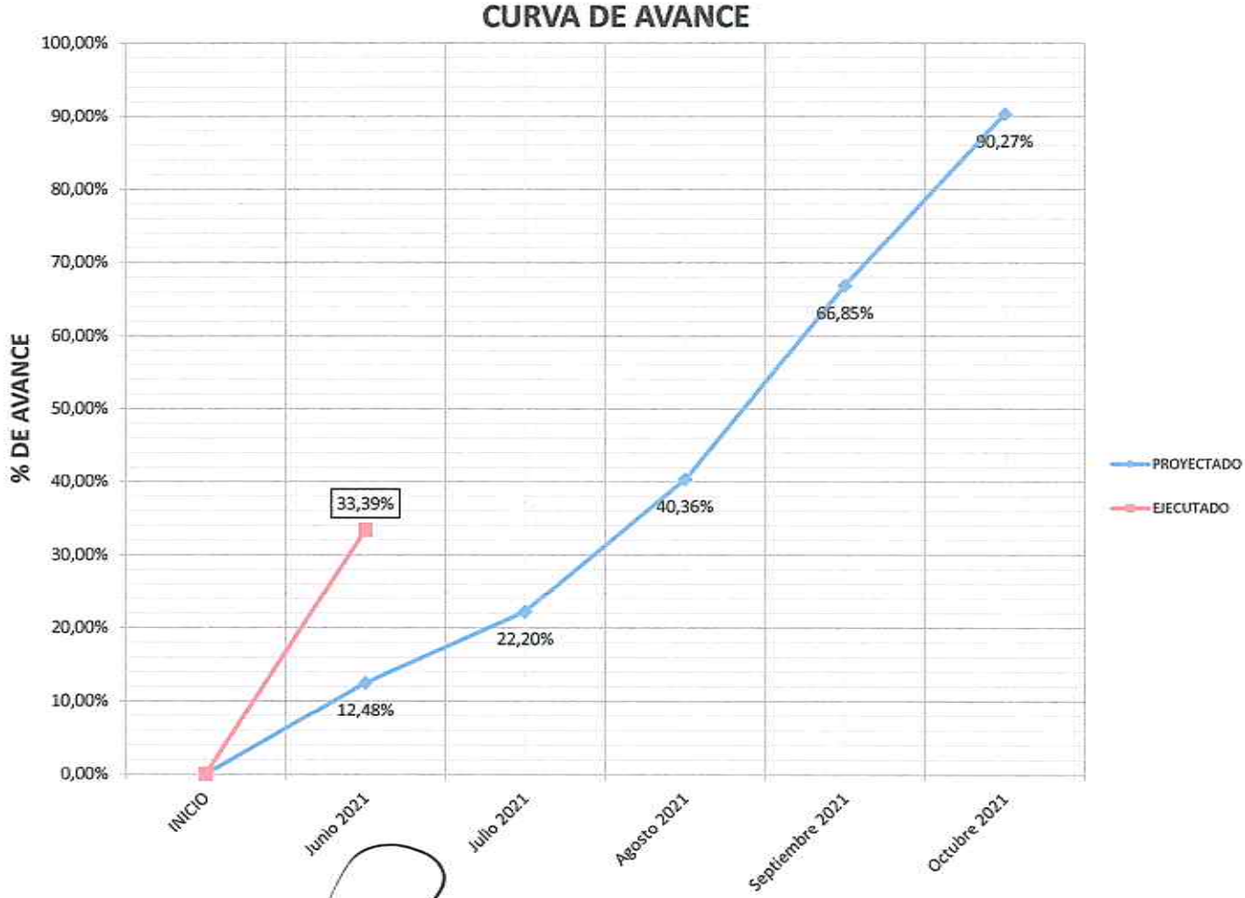

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Contratista
Alejandro Paniagua González
Representante Legal

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA

Gobernacion de Itapua
Fiscal de Obras
Secretaria de Obras Públicas y Transporte
Ing. Carlos Javier Amarilla
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
