GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

RESUMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N°: 8

MES: JULIO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 456.345

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(1+2)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 456.345	100%	488.379.000	96,46%	471.080.000	2,40%	11.699.000	98,85%	482.779.000
A	**Total por Contrato**	**100%**	**488.379.000**	**96,46%**	**471.080.000**	**2,40%**	**11.699.000**	**98,85%**	**482.779.000**

Certificado Básico Nº	8
Mes:	JULIO
Contrato N°:	47/2024
Monto Básico:	488.379.000
Contratista:	JL y Compañía S.A.
Fecha de Inicio:	28/11/2024
Plazo de Ejecución:	150 días
Fecha de terminación prevista:	27/4/2025
Prórroga (Días):	96
Fecha de terminación con prórroga:	1/8/2025
Vigencia Póliza de Contrato:	11/2/2026
Vigencia Póliza de Anticipo:	11/2/2026

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	97.675.800	94.216.000	2.339.800	96.555.800
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**97.675.800**	**94.216.000**	**2.339.800**	**96.555.800**

C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**	9.359.200
C.II	Multas	0
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**	**9.359.200**

SON GUARANÍES:

Nueve millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos.-

J. L. y COMPAÑÍA S.A.
RUC: 80077842-0
Ing. Diego Jara
JL y Compañía S.A.
Contratista-Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa
Reg. Prof. N°
Secretario Departamental
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

8

GOBERNACION DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N°: 8

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: JULIO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 456.345			
CONTRATISTA:	JL y Compañia S.A.	FECHA DE INICIO:	28/11/2024
MONTO DE LA OFERTA:	488.379.000	FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	27/4/2025
CONTRATO N°:	47/2024	PRÓRROGA (Dias):	96
PLAZO DE EJECUCIÓN:	150 dias	FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:	1/8/2025

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 456.345							EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	Cartel de obra (1,50x2,00m)	Unidad	1,00	1.300.000	1.300.000	0,003	100,00%	0,00%	100,00%	0,00	0,00	0,0	1,00	0,00	1,00	1.300.000	0	1.300.000
2	Movilización de obra (Despeje e instalación de campamento, obrador, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras).	Unidad Medida Global	1,00	22.500.000	22.500.000	0,046	100,00%	0,00%	100,00%	0,05	0,00	0,0	1,00	0,00	1,00	22.500.000	0	22.500.000
3	Señalización vertical de seguridad. Según especificaciones técnicas.	Unidad	20,00	400.000	8.000.000	0,016	100,00%	0,00%	100,00%	0,02	0,00	0,0	20,00	0,00	20,00	8.000.000	0	8.000.000
4	Hormigón de regularización (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2).	Metros cúbicos	45,00	1.350.000	60.750.000	0,124	100,00%	0,00%	100,00%	0,12	0,00	0,1	45,00	0,00	45,00	60.750.000	0	60.750.000
5	Provisión y colocación de alcantarillado celular de H° A° de 1,50X1,50m esp. 14cm. No incluye flete y movimiento de suelo.	Metro lineal	49,00	3.000.000	147.000.000	0,301	100,00%	0,00%	100,00%	0,30	0,00	0,3	49,00	0,00	49,00	147.000.000	0	147.000.000
6	Provisión y colocación de alcantarillado celular de H° A° de 2,50X2,50m esp. 18cm. No incluye flete y movimiento de suelo.	Metro lineal	9,00	5.900.000	53.100.000	0,109	100,00%	0,00%	100,00%	0,11	0,00	0,1	9,00	0,00	9,00	53.100.000	0	53.100.000
7	Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=250kg/cm2).	Metros cúbicos	64,00	2.850.000	182.400.000	0,373	93,75%	6,25%	100,00%	0,35	0,02	0,4	60,00	4,00	64,00	171.000.000	11.400.000	182.400.000
8	Baranda de H° A° - prefabricada.	Metro lineal	12,00	550.000	6.600.000	0,014	100,00%	0,00%	100,00%	0,01	0,00	0,0	12,00	0,00	12,00	6.600.000	0	6.600.000
9	Provisión de Ripio	Metros cúbicos	136,02	8.300	1.129.000	0,002	73,52%	26,48%	100,00%	0,00	0,00	0,0	100,00	36,02	136,02	830.000	299.000	1.129.000
10	Señalización vertical de información del alcantarillado. Según especificaciones técnicas.	Unidad	1,00	1.100.000	1.100.000	0,002	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12	Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1,00	4.500.000	4.500.000	0,009	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
				TOTAL	488.379.000	1,00				96,46%	2,40%	98,85%				471.080.000	11.699.000	482.779.000

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0
Ing. Diego Jara
JL y Compañia S.A.
Contratista-Representante Legal

Ing. Silvio Meza
Ing. Silvio Meza
JL y Compañia S.A.
Residente de Obra

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCIERO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 456.345

CONTRATISTA:	JL y Compañia S.A.
MONTO DE LA OFERTA GS:	488.379.000
CONTRATO N°:	47/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	150 días

FECHA DE INICIO:	28/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA:	27/4/2025
PRÓRROGA (Días):	96
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRÓRROGA:	1/8/2025

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS						PLAZO DE EJECUCIÓN					TOTAL
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 456.345											
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**Precio total**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	
1	Cartel de obra (1,50x2,00m)	Unidad	1,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000					0,27%
2	Movilización de obra (Despeje e instalación de campamento, obrador, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras).	Unidad Medida Global	1,00	22.500.000	22.500.000	22.500.000					4,61%
3	Señalización vertical de seguridad. Según especificaciones técnicas.	Unidad	20,00	400.000	8.000.000	4.800.000	3.200.000				1,64%
4	Hormigón de regularización (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2).	Metros cúbicos	25,72	1.350.000	34.722.000		13.888.800	20.833.200			7,11%
5	Provisión y colocación de alcantarillado celular de H° A° de 1,50X1,50m esp. 14cm. No incluye flete y movimiento de suelo.	Metro lineal	51,00	3.000.000	153.000.000		30.600.000	38.250.000	84.150.000		31,33%
6	Provisión y colocación de alcantarillado celular de H° A° de 2,50X2,50m esp. 18cm. No incluye flete y movimiento de suelo.	Metro lineal	9,00	5.900.000	53.100.000		10.620.000	13.275.000	29.205.000		10,87%
7	Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=250kg/cm2).	Metros cúbicos	55,02	2.850.000	156.807.000			47.042.100	78.403.500	31.361.400	32,11%
8	Baranda de H° A° - prefabricada.	Metro lineal	24,00	550.000	13.200.000					13.200.000	2,70%
9	Provisión de Ripio	Metros cúbicos	2.500,00	8.300	20.750.000					20.750.000	4,25%
10	Señalización vertical de información del alcantarillado. Según especificaciones técnicas.	Unidad	10,00	1.100.000	11.000.000					11.000.000	2,25%
11	Reparación de cabecera de piedra bruta colocada existente.	Unidad Medida Global	1,00	9.500.000	9.500.000					9.500.000	1,95%
12	Limpieza final de obra.	Unidad Medida Global	1,00	4.500.000	4.500.000					4.500.000	0,92%
				TOTAL	**488.379.000**					**TOTAL**	**100,00%**
					PREVISTO MENSUAL EN GUARANÍES	28.600.000	58.308.800	119.400.300	191.758.500	90.311.400	**488.379.000**
					PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE	5,86%	11,94%	24,45%	39,26%	18,49%	**100%**
					ACUMULADO PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE	5,86%	17,80%	42,24%	81,51%	100,00%	

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077803-0

Ing. Diego Jara
JL y Compañía S.A.
Contratista-Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

5

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CUADRO Y CURVA DE AVANCE

MES: JULIO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL - ID N° 456.345			
Contrato N°: 47/2024			
Monto del Contrato:	488.379.000	Fecha de terminación prevista:	27/4/2025
Plazo Contractual:	150 días	Prórroga (Días):	96
Inicio de Obra:	28/11/2024	Fecha de terminación con prórroga:	1/8/2025

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
MES 1	28.600.000	28.600.000	122.094.750 ₲	122.094.750 ₲	5,86%	5,86%	25,00%	25,00%
MES 2	58.308.800	86.908.800	65.555.250 ₲	187.650.000 ₲	11,94%	17,80%	13,42%	38,42%
MES 3	119.400.300	206.309.100	91.650.000 ₲	279.300.000 ₲	24,45%	42,24%	18,77%	57,19%
MES 4	191.758.500	398.067.600	67.122.000 ₲	346.422.000 ₲	39,26%	81,51%	13,74%	70,93%
MES 5	90.311.400	488.379.000	43.200.000 ₲	389.622.000 ₲	18,49%	100,00%	8,85%	79,78%
MES 6			38.330.000 ₲	427.952.000 ₲			7,85%	87,63%
MES 7			43.128.000 ₲	471.080.000 ₲			8,83%	96,46%
MES 8			11.699.000 ₲	482.779.000 ₲			2,40%	98,85%

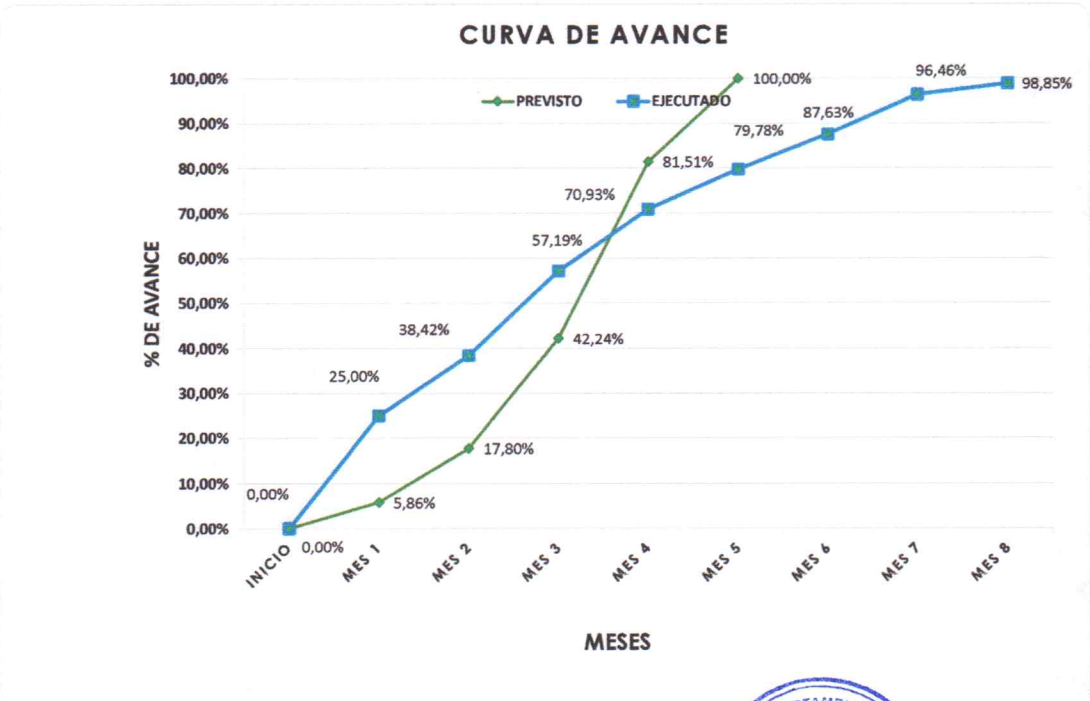

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

Ing. Diego Jara
JL y Compañía S.A.
Contratista-Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Ing. Agustín
Secretaría de Obras Públ
Gobernación de Itapúa

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BÁSICO N° 08

CONTRATO N° 47/2024

REFERENCIA: Menor Cuantía Nacional N° 45/2024 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL- N° ID 456.345.

CONTRATISTA: JL y Compañía S.A.

En la Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 30 días del mes de Julio del año 2025, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, el Ing. Agustín Yd, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, el Sr. Diego Jara, Representante legal de JL y Compañía S.A. y el Ing. Silvio Meza, Residente de Obra de JL y Compañía S.A., para la;

- Construcción de alcantarillados celulares y cabeceras de hormigón armado para mejoramiento de acceso a Kuruzu Tomas y Cerrito del distrito de Encarnación

Quienes suscriben el presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de Julio del presente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. –

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

JL y Compañía. S.A.
Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa
Ing. Agustín Yd
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Ing. Silvio Meza

JL y Compañía. S. A.
Residente de Obra

Fernando de la Mora, 01 de agosto de 2025

Señor.
Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

REFERENCIA: Menor Cuantía Nacional N° 45/2024 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS CELULARES Y CABECERAS DE HORMIGÓN ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE ACCESO A KURUZU TOMAS Y CERRITO DEL DISTRITO DE ENCARNACIÓN - PLURIANUAL- N° ID 456.345.

De mi mayor consideración.
Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de presentar el Certificado de Obras N° 08 del Contrato N° 47/2024 de la obra de referencia, correspondiente al mes de julio del corriente año.
Para el efecto adjunto a la presente nota todos los documentos con las mediciones y resúmenes correspondientes.
El monto neto del presente certificado es de guaraníes, **9.359.200** (Nueve millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos).

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0
Ing. Diego Jara
JL y Compañía S.A.
CONTRATISTA

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 10.413
Fecha: 20 OCT 2025 Hora: 10:18
Firma: Fojas: 16, 1co
Fátima del Puerto
Auxiliar de Mesa de Entrada
Gobernación de Itapúa

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Secretaría de Obras Públicas y Transporte
Mesa de Entrada
