GOBERNACION DE ITAPÚA
RESÚMEN DEL CERTIFICADO BÁSICO N° 4

Mes: MARZO

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 37/2024 -Construcción de alcantarillado celular y cabeceras de Hormigón Armado sobre afluente del arroyo ka´yguangue el distrito de Encarnación-Plurianual – ID: 456.108

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
A	Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 37/2024 - Construcción de alcantarillado celular y cabeceras de Hormigón Armado sobre afluente del arroyo ka´yguangue el distrito de Encarnación-Plurianual – ID: 456.108	100%	239.930.723	88,57%	212.502.063	9,61%	23.067.611	98,18%	235.569.674
A	**Total por Contrato**	**100%**	**239.930.723**	**88,57%**	**212.502.063**	**9,61%**	**23.067.611**	**98,18%**	**235.569.674**

B	**Deducciones a la fecha**			**Hasta Certificado Anterior**	**Presente Certificado**	**Total Certificado a la Fecha**
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	47.986.145	42.500.413	4.613.522	47.113.935
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**47.986.145**	**42.500.413**	**4.613.522**	**47.113.935**
C.I	**Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				18.454.089	
C.II	Multas				0	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				**18.454.089**	

Certificado Básico Nº	**4**
Mes:	**MARZO**
Contrato N°:	**51/2024**
Monto Básico:	**239.930.723**
Contratista:	**ARQ. JAIME BECZKO GARCIA**
Fecha de Inicio:	**28/11/2024**
Plazo de Ejecución:	**210 dias**
Fecha de terminación prevista:	**26-jun-25**
Prórroga:	.
Fecha de terminación con prórroga:	.

SON GUARANIES: Dieciocho millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil ochenta y nueve.-

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Contratista-Representante Legal

Arq. Jaime Beczko Garcia
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.I. 105
Reg. AD.SG. N° 156/20

Fiscal de Obra
Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos Amarilla
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

Secretario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Cristian Eckert
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 4.067
Secretario Departamental de Obras Publicas
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 4

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

MES: MARZO

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 37/2024 -Construcción de alcantarillado celular y cabeceras de Hormigón Armado sobre afluente del arroyo ka'yguangue el distrito de Encarnación-Plurianual – ID: 456.108			
CONTRATISTA:	ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	FECHA DE INICIO:	28/11/2024
MONTO DE LA OFERTA:	239.930.723	FECHA DE TERMIACION PREVISTA:	26-jun-25
CONTRATO N°:	51/2024	PRÓRROGA:	-
PLAZO DE EJECUCIÓN:	210 dias	FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:	-

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS							INCIDENCIA DEL RUBRO SOBRE EL TOTAL	PLANILLA DE MEDICIÓN						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO					
LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 37/2024 -Construcción de alcantarillado celular y cabeceras de Hormigón Armado sobre afluente del arroyo ka'yguangue el distrito de Encarnación Plurianual – ID: 456.108								EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
1	72131601-002	Cartel de Obra (2x1,5m)	Unidad	1,00	1.493.313	1.493.313	0,006	100,00%	0,00%	100,00%	0,006	-	0,006	1,00	0,00	1,00	1.493.313	0	1.493.313
2	72131601-002	Movilización de obra (Despeje e instalación de campamento, obrador, señalización, seguridad y salud, transporte de equipo en zona de obras)	Unidad Medida Global	1,00	13.646.978	13.646.978	0,057	100,00%	0,00%	100,00%	0,057	-	0,057	1,00	0,00	1,00	13.646.978	0	13.646.978
3	72131601-002	Señalización vertical de seguridad. Según especificaciones técnicas.	Unidad	4,00	510.305	2.041.220	0,009	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,009	0,009	0,00	4,00	4,00	0	2.041.220	2.041.220
4	72131601-002	Hormigón de regularización (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2)	Metros cúbicos	10,80	1.657.218	17.897.954	0,075	100,00%	0,00%	100,00%	0,075	-	0,075	10,80	0,00	10,80	17.897.954	0	17.897.954
5	72131601-002	Provisión y colocación de alcantarillado celular de H° A° de 2,50X2,50m esp. 18cm. No incluye flete y movimiento de suelo	Unidad	18,00	6.338.153	114.086.754	0,475	100,00%	0,00%	100,00%	0,475	-	0,475	18,00	0,00	18,00	114.086.754	0	114.086.754
6	72131601-002	Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2).	Metros cúbicos	18,07	3.190.226	57.647.384	0,240	100,00%	0,00%	100,00%	0,240	-	0,240	18,07	0,00	18,07	57.647.384	0	57.647.384
7	72131601-002	Baranda de H° A° - Prefabricada.	Metro lineal	12,00	644.140	7.729.680	0,032	100,00%	0,00%	100,00%	0,032	-	0,032	12,00	0,00	12,00	7.729.680	0	7.729.680
8	72131601-002	Provisión de Ripio	Metros cúbicos	1.957,40	10.742	21.026.391	0,088	0,00%	100,00%	100,00%	-	0,088	0,088	0,00	1.957,40	1.957,40	0	21.026.391	21.026.391
9	72131601-002	Señalización vertical de información del alcantarillado. Según especificaciones técnicas.	Unidad	2,00	1.374.912	2.749.824	0,011	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10	72131601-013	Limpieza inicial y final de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.611.225	1.611.225	0,007	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Total						239.930.723	100%				88,57%	9,61%	98,18%				212.502.063	23.067.611	235.569.674

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Contratista-Representante Legal

Arq. Jaime Beczko Garcia
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.I. 1315
Reg. AB.SG. N° 164/0

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

FISCAL DE OBRA
Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos Amarilla
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 4

CRONOGRAMA FISICO - FINANCIERO

Mes: MARZO

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 37/2024 -Construcción de alcantarillado celular y cabeceras de Hormigón Armado sobre afluente del arroyo ka´yguangue el distrito de Encarnación-Plurianual – ID: 456.108

CONTRATISTA:	ARQ. JAIME BECZKO GARCIA	**FECHA DE INICIO:**	28/11/2024
MONTO DE LA OFERTA GS:	239.930.723	**FECHA DE TERMIACION PREVISTA:**	26-jun-25
CONTRATO N°:	51/2024	**PRÓRROGA:**	.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	210 dias	**FECHA DE TERMIACION CON PRÓRROGA:**	.

CAUDRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 37/2024 -Construcción de alcantarillado celular y cabeceras de Hormigón Armado sobre afluente del arroyo ka´yguangue el distrito de Encarnación-Plurianual – ID: 456.108

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
1	Cartel de Obra (2x1,5m)	Unidad	1,00	1.493.313	1.493.313	1.493.313							0,62%
1	Movilización de obra (Despeje e instalación de campamento, obrador, señalización, seguridad y salud,	Unidad Medida Global	1,00	13.646.978	13.646.978	13.646.978							5,69%
1	Señalización vertical de seguridad. Según especificaciones técnicas.	Unidad	4,00	510.305	2.041.220							2.041.220	0,85%
1	Hormigón de regularización (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2)	Metros cúbicos	10,80	1.657.218	17.897.954		17.897.954						7,46%
1	Provisión y colocación de alcantarillado celular de H° A° de 2,50X2,50m esp. 18cm. No incluye flete y movimiento de	Unidad	18,00	6.338.153	114.086.754			57.043.377	57.043.377				47,55%
1	Cabezal de H° A° (Hormigón elaborado fck=210kg/cm2).	Metros cúbicos	18,07	3.190.226	57.647.384					28.823.692	28.823.692		24,03%
1	Baranda de H° A° - Prefabricada.	Metro lineal	12,00	644.140	7.729.680							7.729.680	3,22%
1	Provisión de Ripio	Metros cúbicos	1.957,40	10.742	21.026.391							21.026.391	8,76%
1	Señalización vertical de información del alcantarillado. Según especificaciones técnicas.	Unidad	2,00	1.374.912	2.749.824							2.749.824	1,15%
1	Limpieza inicial y final de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.611.225	1.611.225							1.611.225	0,67%
	Total				**239.930.723**								100,00%
PREVISTO MENSUAL EN GUARANIES						15.140.291	17.897.954	57.043.377	57.043.377	28.823.692	28.823.692	35.158.340	**239.930.723**
PREVISTO MENSUAL EN PORCENTAJE						6,31%	7,46%	23,77%	23,77%	12,01%	12,01%	14,65%	**100%**

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Contratista-Representante Legal

Arq. Jaime Beczko Garcia
Reg. MOPC: 336 - Reg. CSI
Reg. AO.SG. N° 19

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

FISCAL DE OBRA
Gobernación de Itapúa
Ing. Carlos Amarilla
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 4
CUADRO Y CURVA DE AVANCE
MES: MARZO

LICITACIÓN MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 37/2024 -Construcción de alcantarillado celular y cabeceras de Hormigón Armado sobre afluente del arroyo ka´yguangue el distrito de Encarnación-Plurianual – ID: 456.108

Contrato N°: 51/2024			
Monto del Contrato:	239.930.723	**Fecha de terminación prevista:**	26-jun-25
Plazo Contractual:	210 dias	**Prórroga:**	.
Inicio de Obra:	28/11/2024	**Fecha de terminación con prórroga:**	.

CUADRO DE AVANCE

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
DICIEMBRE	15.140.291	15.140.291	59.982.680	59.982.680	6,31%	6,31%	25,00%	25,00%
ENERO	17.897.954	33.038.245	87.142.319	147.124.999	7,46%	13,77%	36,32%	61,32%
FEBRERO	57.043.377	90.081.622	65.377.064	212.502.063	23,77%	37,54%	27,25%	88,57%
MARZO	57.043.377	147.124.999	23.067.611	235.569.674	23,77%	61,32%	9,61%	98,18%
ABRIL	28.823.692	175.948.691			12,01%	73,33%		
MAYO	28.823.692	204.772.383			12,01%	85,35%		
JUNIO	35.158.340	239.930.723			14,65%	100,00%		

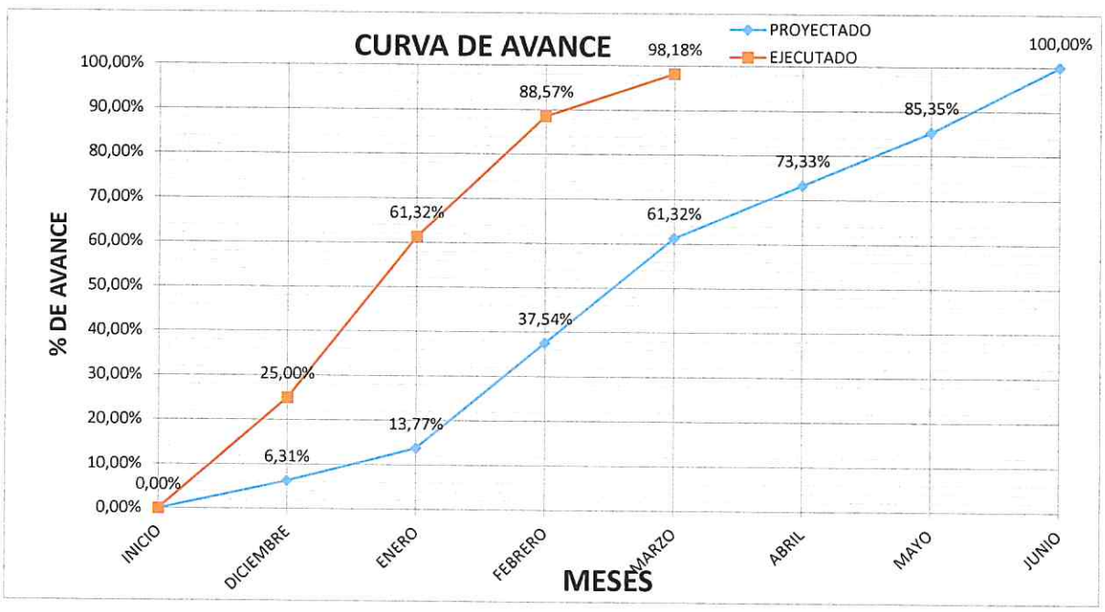

ARQ. JAIME BECZKO GARCIA
Contratista-Representante Legal

Arq. Jaime Beczko García
Reg. MOPC: 336 - Reg. C.S.J. 1058
Reg. AG.SG. N° 164/00

FISCAL DE OBRA
Gobernación de Itapúa

Ing. Carlos Amarilla
Secretaría de Obras Públicas
Gobernación de Itapúa

5
