CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE SALON MULTIUSO Y PISO EXTERIOR

FECHA : MARZO 2012.-

Nº	ACTIVIDADES	TIEMPO EN SEMANAS							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	EXTERIORES								
1	Marcación y replanteo								
2	Desmonte y desbroce de terreno								
3	Cordón de mampostería de 0,15								
4	Contrapiso de Hº de ripio								
5	Piso de baldosones de cemento a junta llena								
6	Canal de desagüe pluvial 30x15 (mampost.)								
7	Ilumin. exterior con columnas y farolas (h=3m)								
	INTERIORES								
8	Demolición de pared escenario								
9	Demolición de cielo raso de machimbres								
10	Levantamiento piso de escenario								
11	Recolocación de cruz en pared; sobrerelieve								
12	Piso de baldosas calcáreas sobre contr. Exist.								
13	Zócalo calcáreo								
14	Cielo raso de machimbres								
15	Limpieza periódica y final								

OBSERVACION: Tiempo estimado p/ terminación de la Obra es de cuarenta y cinco (45) días calendarios.

Universidad Nacional de Concepción
Asesoría Técnica

Ing. César Ruiz Díaz
Dpto. Técnico

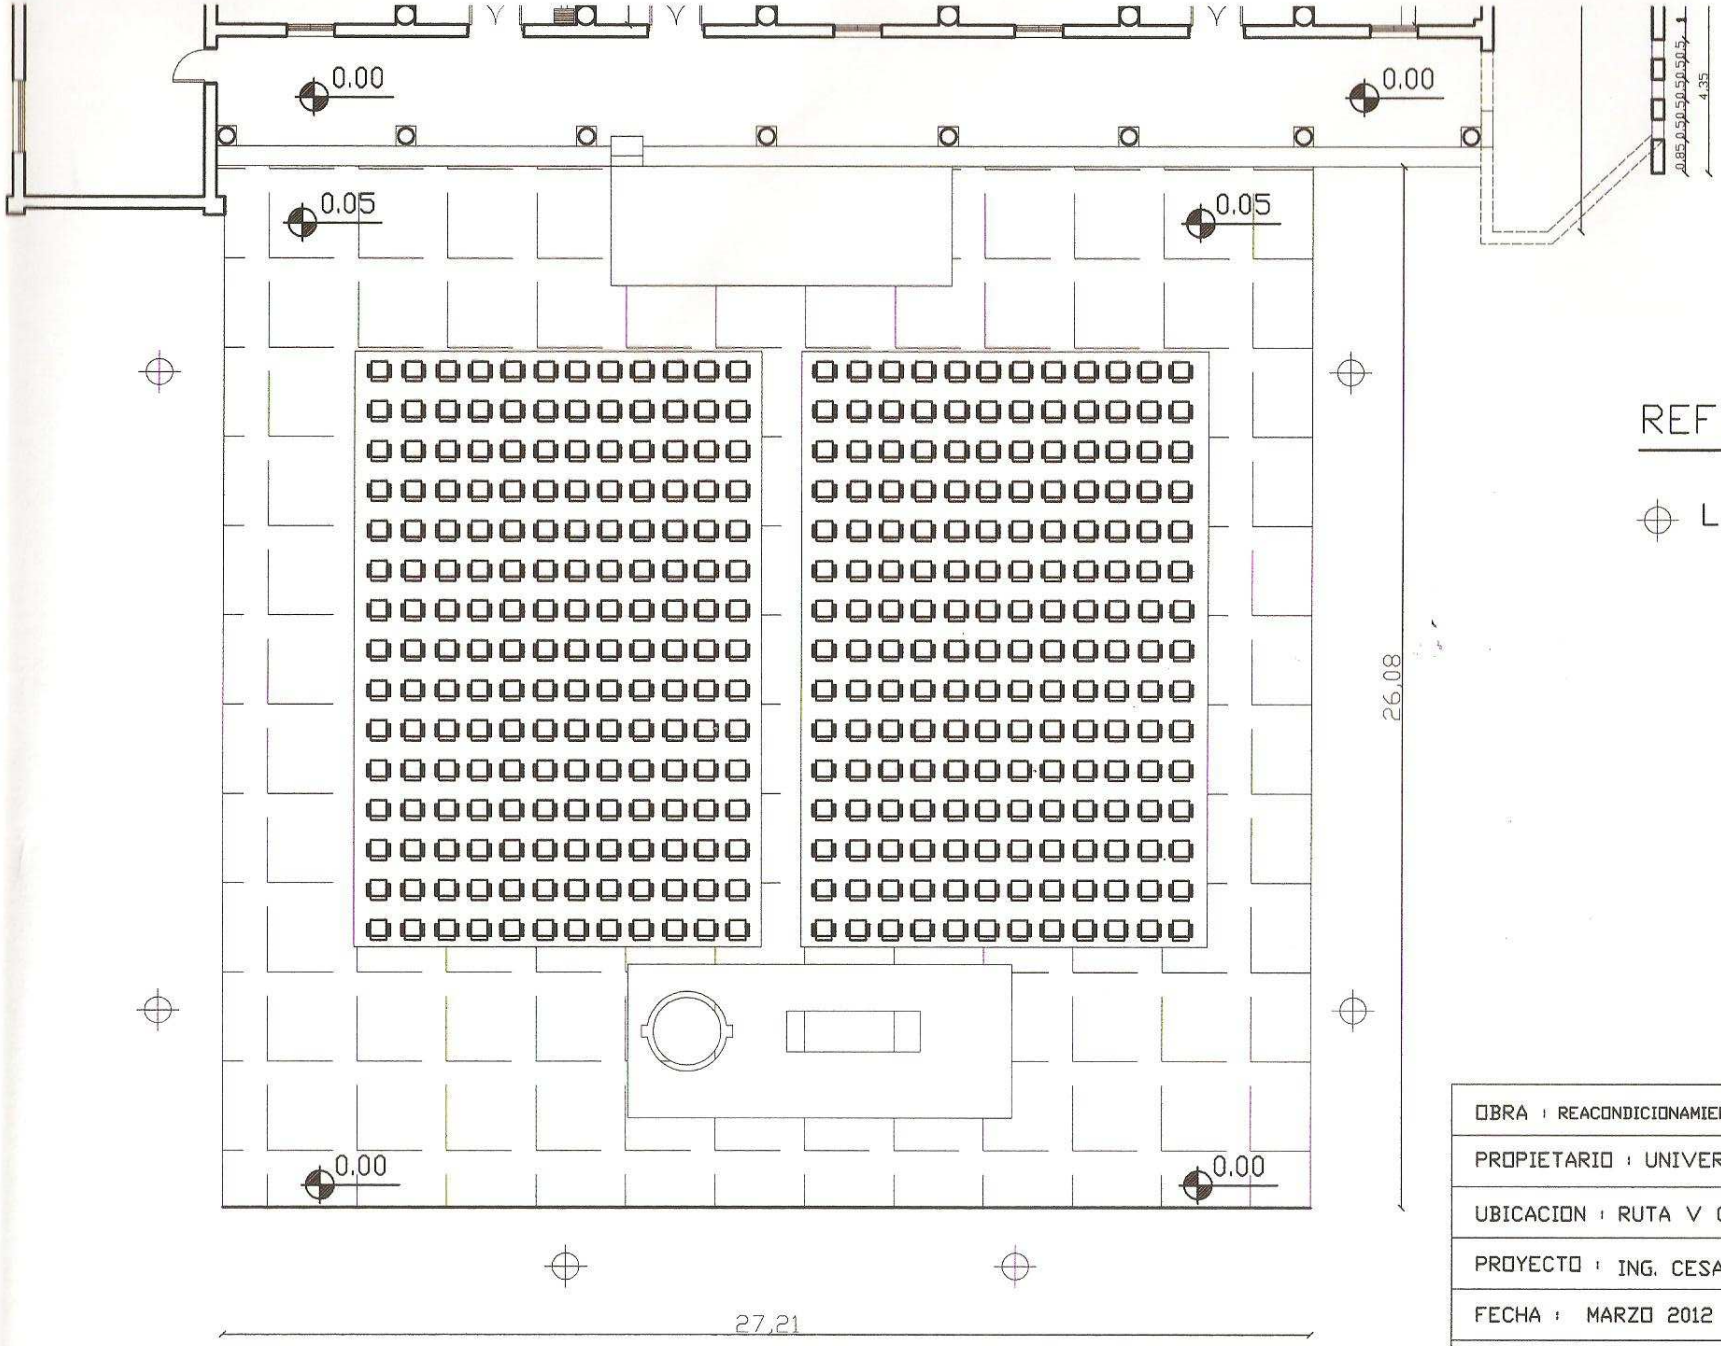

REFERENCIA

⊕ LUMINARIA EXTERIOR

PLANTA ARQUITECTONICA

OBRA : REACONDICIONAMIENTO DE SALON MULTIUSO (EX CAPILLA) Y PISO EXT	
PROPIETARIO : UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCION	
UBICACION : RUTA V GRAL. B. CABALLERO KM. 2	
PROYECTO : ING. CESAR RUIZ DIAZ - DIRECTOR DPTO. TECNICO	
FECHA : MARZO 2012	
DIRECTOR DPTO. TECNICO	RECTOR UNC
