ADDENDA 2

- ✓ Las Ofertas serán recibidas hasta las **10:00 hs.** del día **14/11/16** en las oficinas de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Aduanas, sito en las calles El Paraguayo Independiente Nº 938 casi Montevideo, Planta Baja.
- ✓ El Acto Público de Apertura de las Ofertas se realizará a las **10:10 hs.** del día **14/11/16**, en el mismo lugar señalado precedentemente, ante la presencia de las autoridades de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Dirección Nacional de Aduanas.

Se modifican los siguientes puntos del Pliego de Bases y Condiciones

Especificaciones Técnicas

ESTRUCTURA DE SOPORTE DEL TECHO

La estructura de soporte para el techo de Chapas de zinc trapezoidal, deben ser de reticulado metálico de perfiles C (correas, pórticos, etc.) imprescindibles para la buena y correcta terminación del techo. El techo será de chapa de zinc trapezoidal galvanizada Nº: 26, debiendo asentarse sobre correas de reticulado metálico cada 1,80 m. esta estructura a la vez se asentaran en columnas de hormigón armado de sección circular.

TRASLADO DE CASETAS EXISTENTES

Las casetas existentes son prefabricadas modulares y desmontables por lo cual el traslado de las mismas se pueden realizar con facilidad, con montacargas manuales o incluso de manera manual.

LIC. ROBERTO CAÑIZA MELGAREJO
COORDINADOR GRAL. DE LA U.O.C

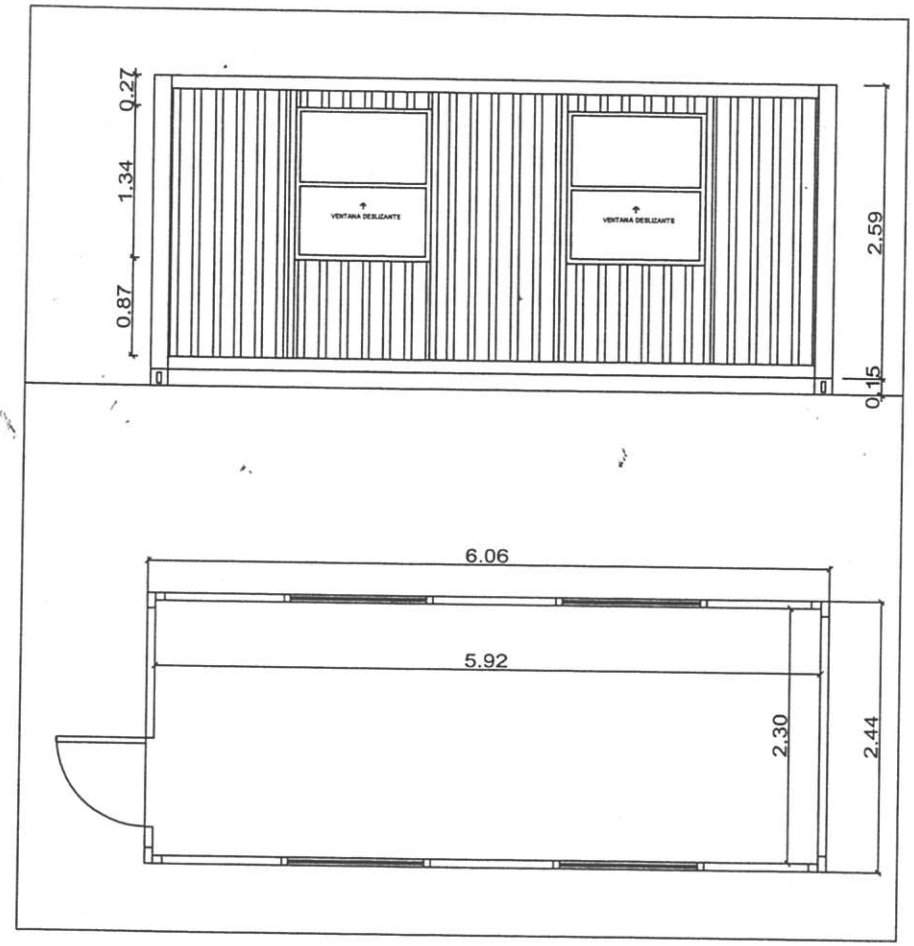

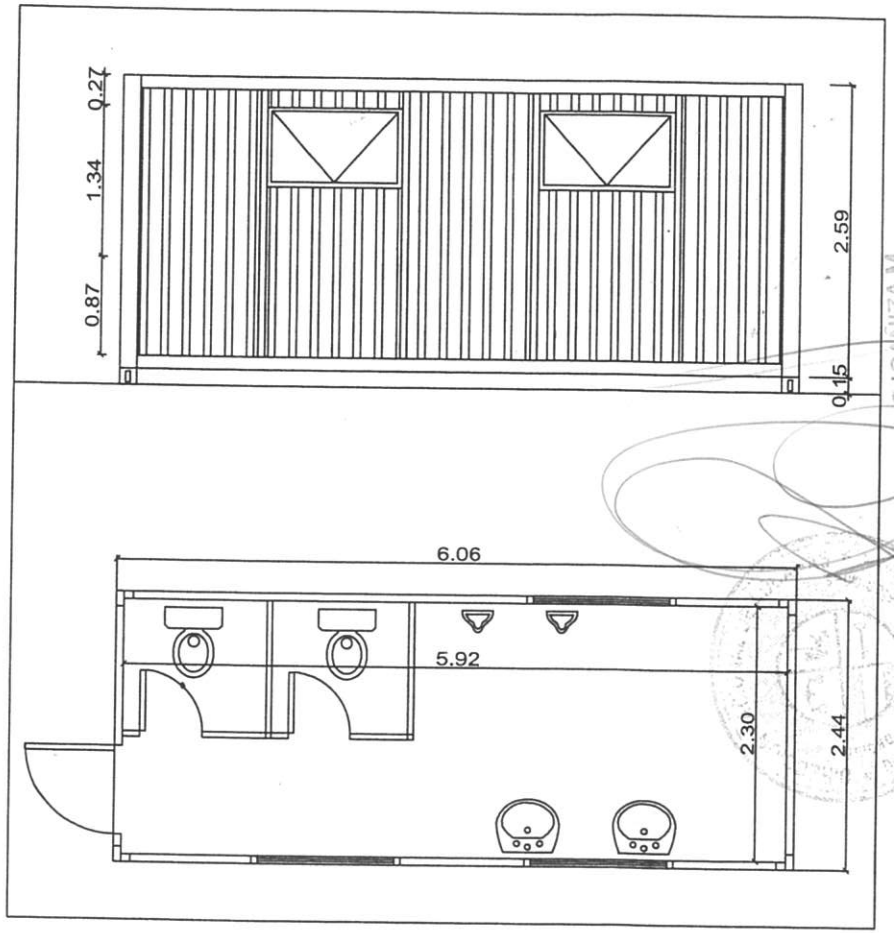

Aduana Fronteriza — DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PROYECTO: MEJORAMIENTO EN EL ACCESO INTERNACIONAL PUERTO FALCÓN	Fiscalización de Obras Dto. Servicios Generales	CASETAS PREFABRICADAS	GOBIERNO NACIONAL Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo	Lamina 12

ROBERTO ALCANIZA M.
Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Aduanas
