PLANILLA DE OBRAS

PROPIETARIO: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
UBICACIÓN : San Lorenzo , Km 10 ½, Ruta Mcal. Estigarribia
OBRA : Proyecto Sala de Lactancia

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEM	RUBRO	UNID	CANT.
1	***CONTENEDOR***		
1,1	Contenedor 20"	UND	1,00
2	***TRABAJOS DE HERRERIA***		
2,1	Estructura metalica paredes	ML	17,00
2,2	Estructura metalica techo	ML	6,00
2,3	Estructura metalica divisorias	ML	3,40
3	***ABERTURAS***		
3,1	Puerta metalica exterior con marco	UND	1,00
3,2	Ventana corrediza bindex con marco 1.40 m x 1.10m	UND	1,00
4	***REVESTIMIENTO CON AISLACION ISOPOR***		
4,1	Revestimiento PVC estandar paredes	M2	44,20
4,2	Revestimiento PVC estandar techo	M2	15,00
4,3	Revestimiento PVC estandar paredes internas	M2	8,84
5	***INSTALACION ELECTRICA***		
5,1	Boca de luz	UND	6,00
5,2	Boca de tomas comunes	UND	6,00
5,3	Boca de tomas computadoras	UND	1,00
5,4	Boca de tomas schuko	UND	1,00
5,5	Boca de AA	UND	2,00
5,6	Tablero trifasico	UND	1,00
5,7	Artefacto led redondo	UND	6,00
5,8	Toma industrial trifasico exterior	UND	1,00
6	***PISO***		
6,1	Piso vinilico de alto trafico, incluye zócalo, esp. 3mm	M2	15,00
7	***PINTURA***		
7,1	Pintura antioxido interior y exterior	M2	59,80
7,2	Pintura sintetico mate interior y exterior	M2	59,80
8	***AIRE ACONDICIONADO***		
8,1	AA de 18.000 BTU con 3 m cañeria	UND	2,00
9	***INSTALACION SANITARIA***		
9,1	Instalacion de agua frio/caliente	GL	1,00
9,2	Kichinet con bacha y canilla flotante 1.20 x 0.60	UND	1,00
9,3	Dessague cloacal de kichinet con registro de 40cm x 40cm	UND	1,00
9,4	Termocalefon termotanque de 50 litros	UND	1,00
9,5	Instalación de agua corriente y desague cloacal para lavamanos-MODO COVID, en acceso (no incluye lavatorios y llaves)	UND	1,00
10	***PROVISION Y COLOCACION***		
10,1	Frigobar color blanco	UND	2,00
10,2	Juego de sillones acolchonados color blanco cuerina patas de madera 20cm con posa pie	UND	2,00
10,3	Mesa star torneada	UND	1,00
10,4	Dispensador de jabon liquido color blanco mediano	UND	1,00
10,5	Dispensador para toallas de papel color blanco mediano	UND	1,00
10,6	Dispensador para agua potable para consumo/bebedero electrico pedestal	UND	1,00
10,7	Extintor PQS - ABC de 10 kg	UND	1,00
11	***EXTERIORES***		
11,1	Dado de H°Ciclopeo de 0,70x0,70 x 0,70 de alto	UND	4,00

11,2	Construcción de camineros de canto rodado de 1.50m de ancho, con contrapiso de cascote esp. 0.10m	M2	30,00
11,3	Acometida aerea desde la columna existente con cable multifilar de 2x6 mm tipo taller	ML	4,00
11,4	Instalación de línea subterránea desde el registro en la columna hasta el tablero en el contenedor	ML	15,00
11,5	Registro electrico de 25x25x30 con doble tapa	UND	1,00
11,6	Plantas ornamentales- jardineria	GL	1,00
12	***LIMPIEZA GENERAL***		
12,1	Limpieza y retiro de escombros	UND	1,00

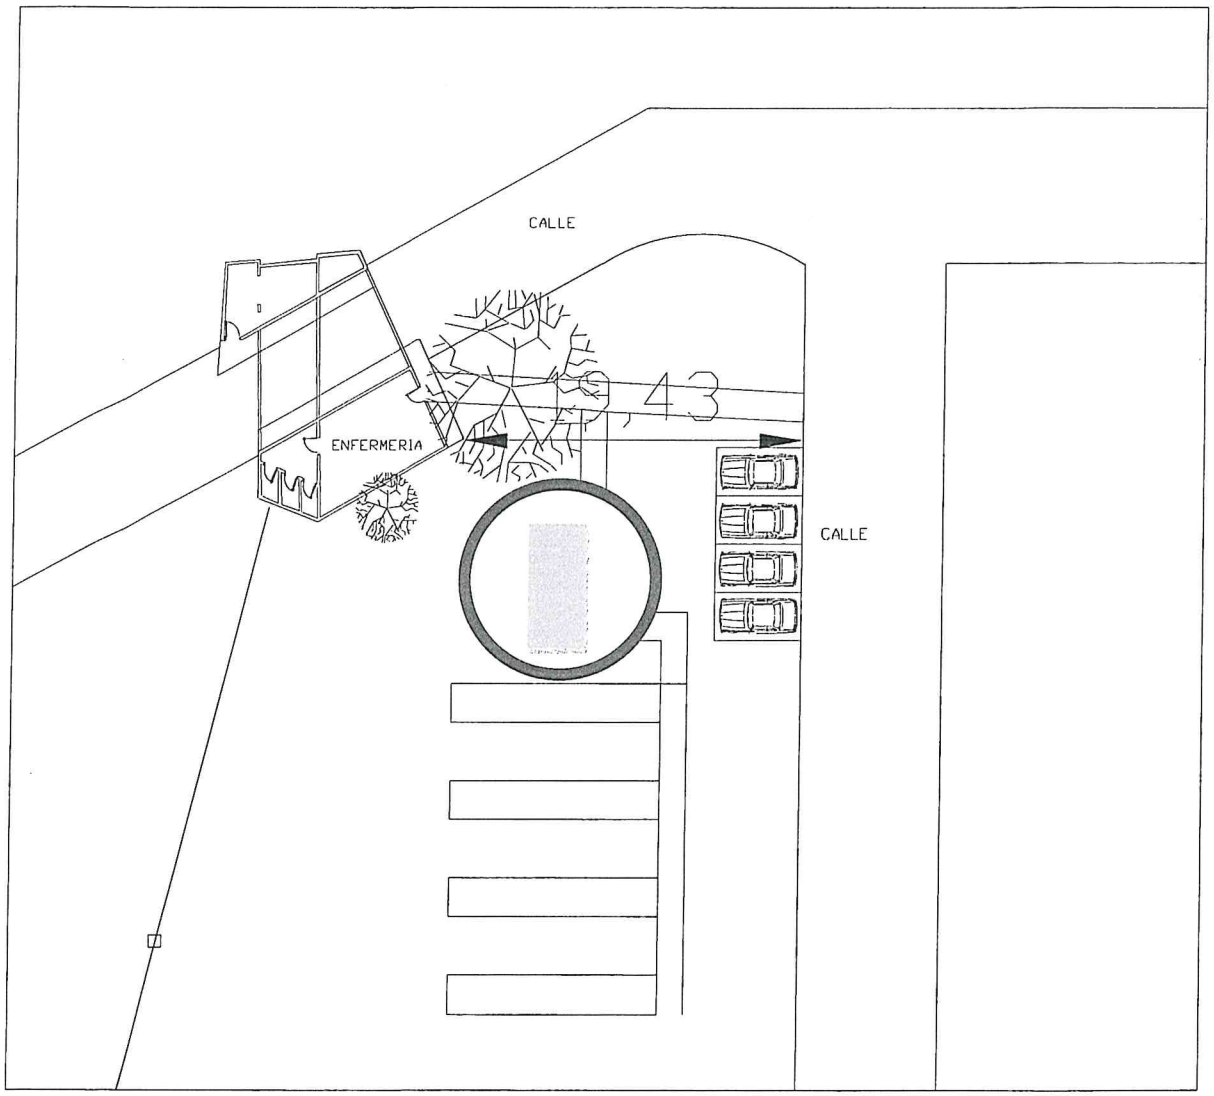

PLANTA DE UBICACIÓN



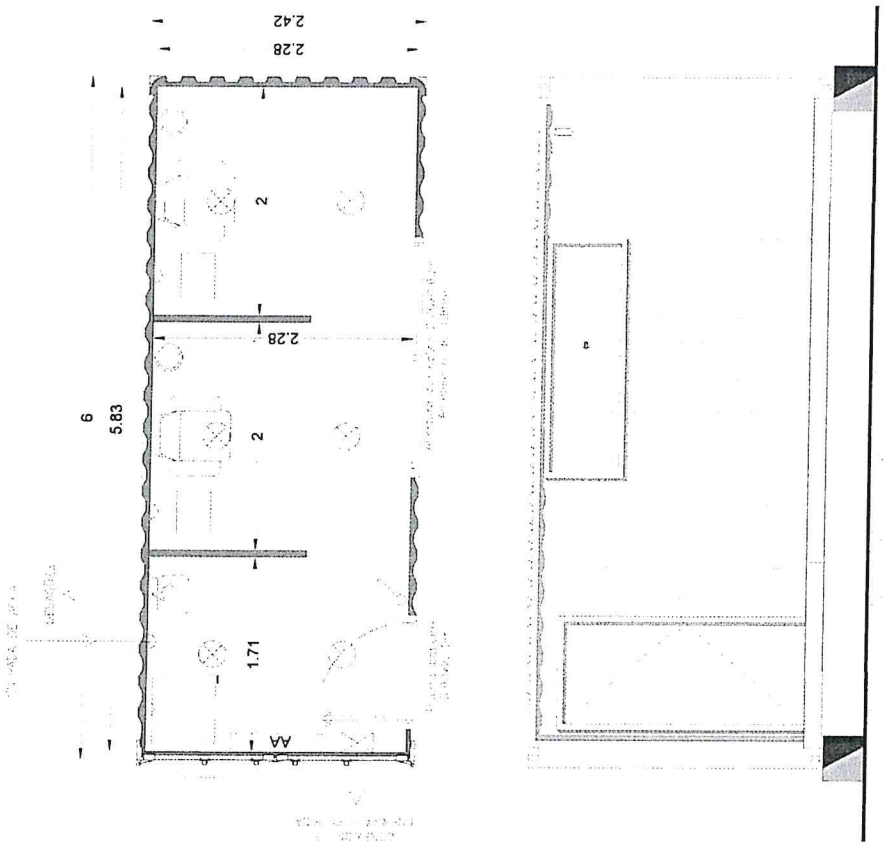

IMAGEN REFERENCIAL

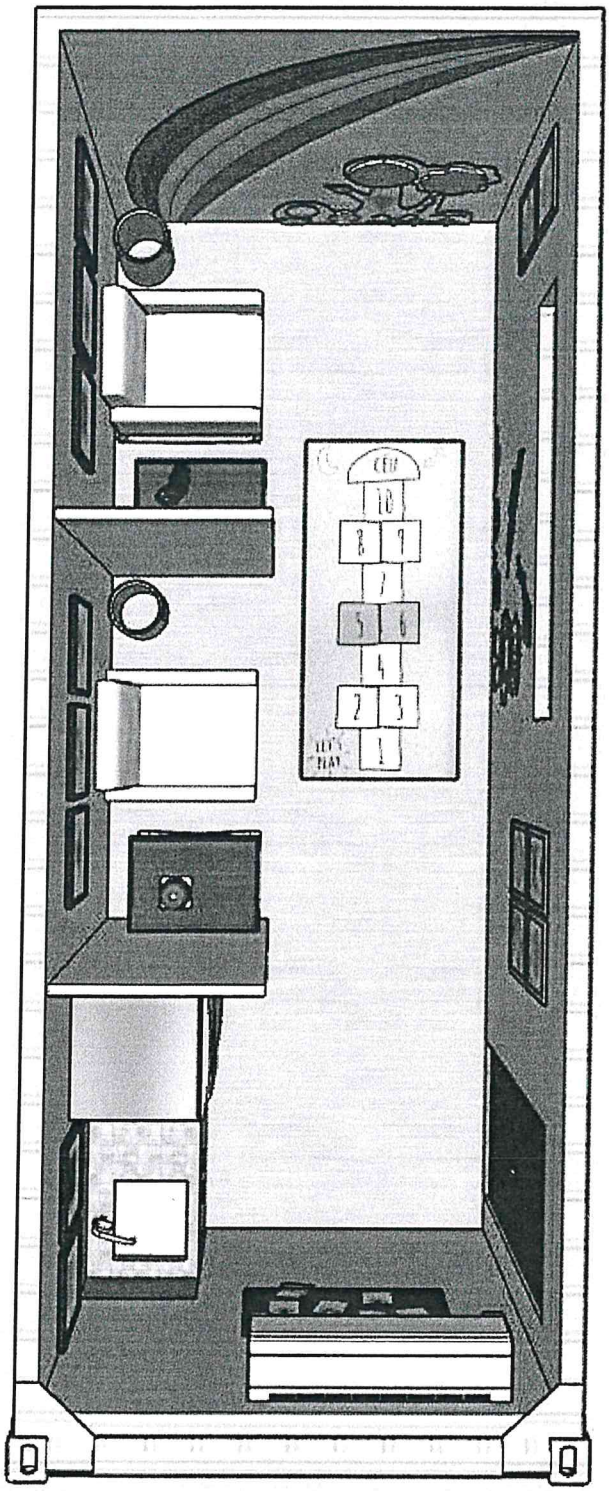

IMAGEN REFERENCIAL

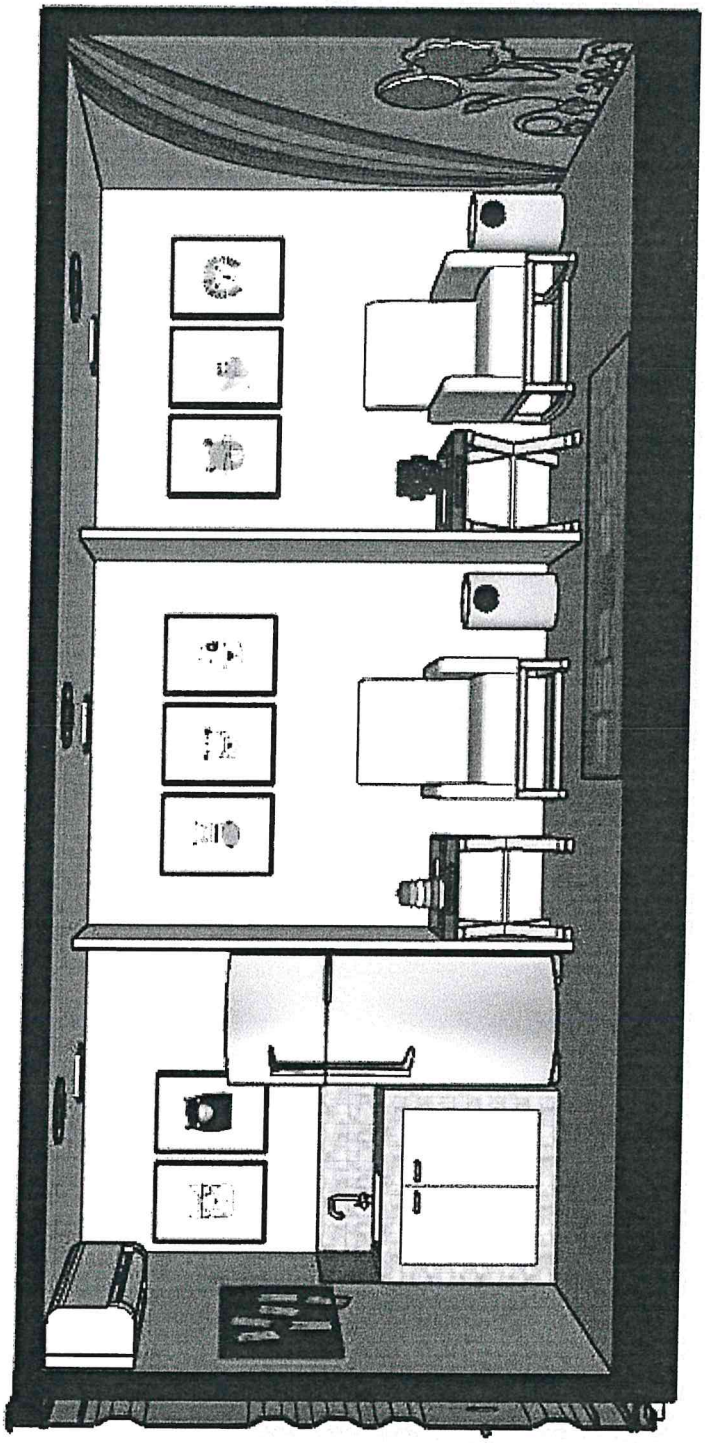

IMAGEN REFERENCIAL

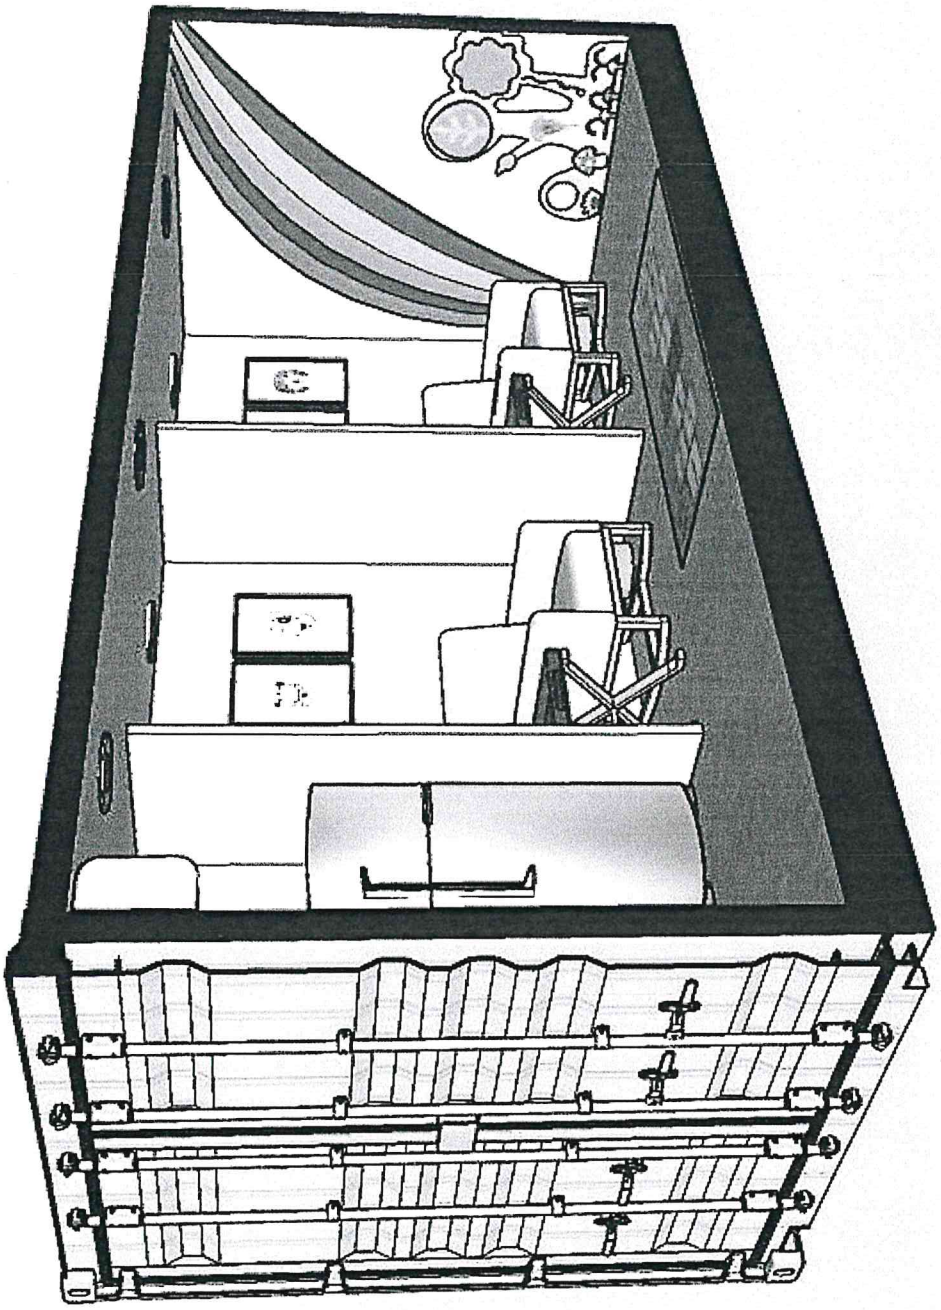

IMAGEN REFERENCIAL

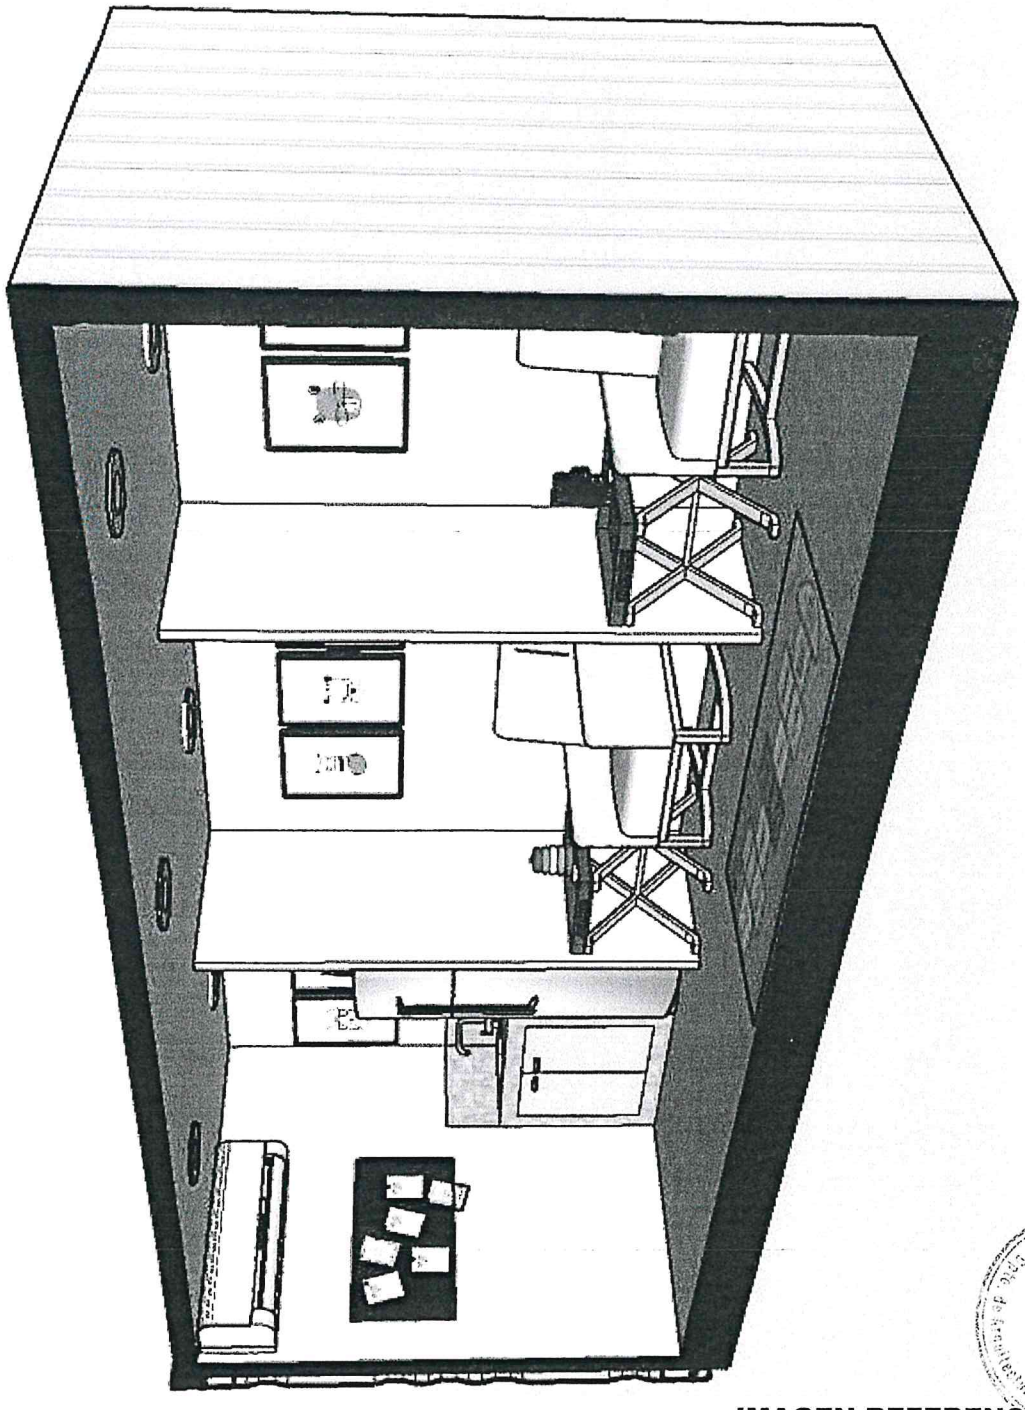

IMAGEN REFERENCIAL
