Sección III. Suministros Requeridos

Especificaciones Técnicas, MODULO RODANTE

Localidad: PUERTO TRIUNFO – TRES FRONTERAS

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD
1	72131601-9997	**DIMENSIONES:** Largo: 9.00 mts. Ancho: 2.70 mts. Altura: 3.70 mts **CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS** La estructura principal fabricada en perfil estructural de Acero al Carbono, Calidad ASTM A36.- Soldadura proceso MIG MAG. ✓ Las paredes y techos externos en chapa plegada de acero al carbono. ✓ Internamente paredes y cielo raso de PVC (incluye voladizo y techo de plataforma). ✓ Piso de madera multilaminado fenólico, parte superior revestida con alfombra de goma antideslizante tipo moneda. ✓ Piso del sanitario con chapa antideslizante. ✓ Aislación termo-acústica en paredes y techo con Isopor ESP F de 50 mm de espesor. ✓ Fabricación y montaje de plataforma y escalera de acceso con baranda movil (02). ✓ Bastidor para soporte de piso metálico. **MOVILIDAD:** ✓ Provisión y colocación de 2(dos) ejes y 5(cinco) ruedas para ser transportada con llanta aro 16" y cubiertas. ✓ (04) Patas hidráulicas para estabilización de modulo ✓ Tira tráiler. **DEPENDENCIAS-EQUIPAMIENTOS:** ✓ (01) Puerta Blindex de acceso 0,80 x 2,10. ✓ (01) Puerta metálica 0,80 x 2,10. ✓ (01) Puerta metálica 0,70 x 2,10. ✓ Ventanas de blindex corredizas de: (09) ventanas de 1,00 x 1,00 (incluye colocación y herraje) (01) ventanas de 0,60 x 0,40 (incluye colocación y herraje) (01) ventana para atención al público con cortes adecuados 1.00x1.00m ✓ (01)Sanitario equipado e instalado (inodoro, lavatorio, ducha, espejo, extractor griferias, bomba de 1/2HP). (01)Tanque de 300 litros para agua potable. ✓ (01)Tanque de 300 litros para agua servida. ✓ Logotipo frontal 0.80x2.10m (luminoso). ✓ (02) Logotipos laterales 0.80x1m. ✓ (01) Bacha de acero inoxidable 0.55x0.80 ✓ Mesada tipo L 0.55x2m con mueble con puertas/estante para Kitchenette. ✓ Provisión y colocación de manguera de 6 metros para desagüe de tanque de residuo c/ caja protectora. ✓ Extintor de 6kg. ***-Instalaciones eléctricas** ✓ (13) Fluorescente 1x40 ✓ (02) Tomas para computadora ✓ (08) Tomas corrientes de 220 Volts ✓ (02) Toma para COPACO ✓ (01) Tablero General ANDE ✓ (01) Tablero para teléfono. ✓ Conexión a Internet **Obs:** Toda conexión exterior a ANDE, COPACO, INTERNET y ESSAP queda a cargo de la institución. La caseta deberá contener 2 (dos) sistema de refrigeración (Oficina-Sala de Espera). **Revestimiento:** Toda la estructura metálica será sometida a una adecuada limpieza superficial mecánica y será revestida con pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc y pintura sintética de terminación en color a elección del cliente.	**Unidad**	**02**

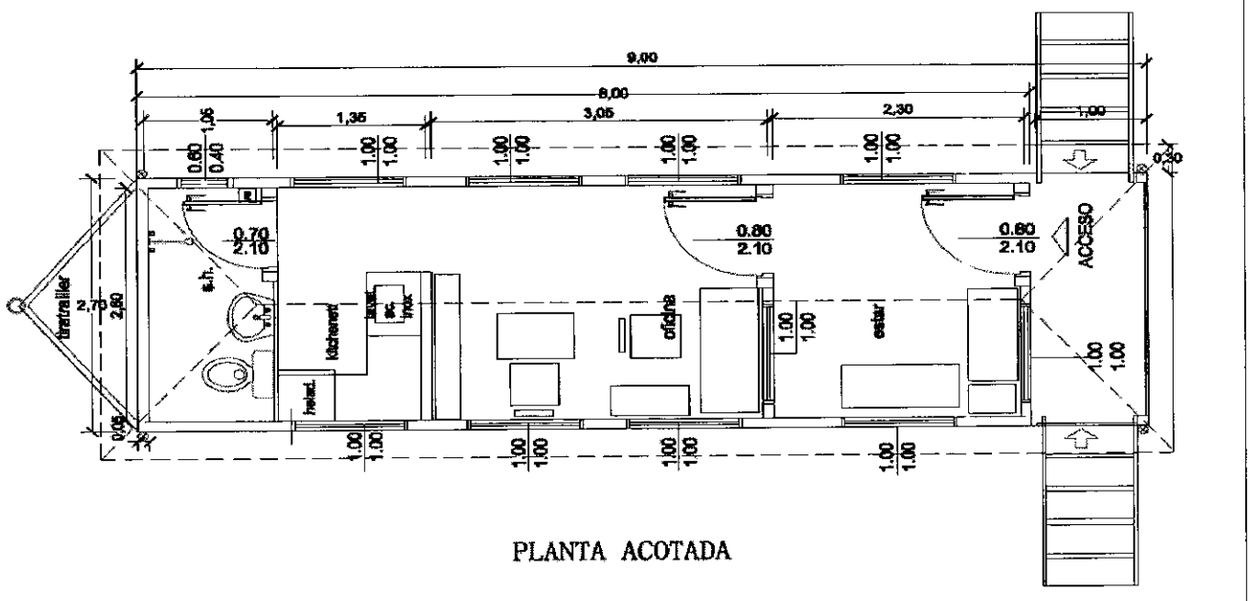

PLANTA ACOTADA

MODULO RODANTE

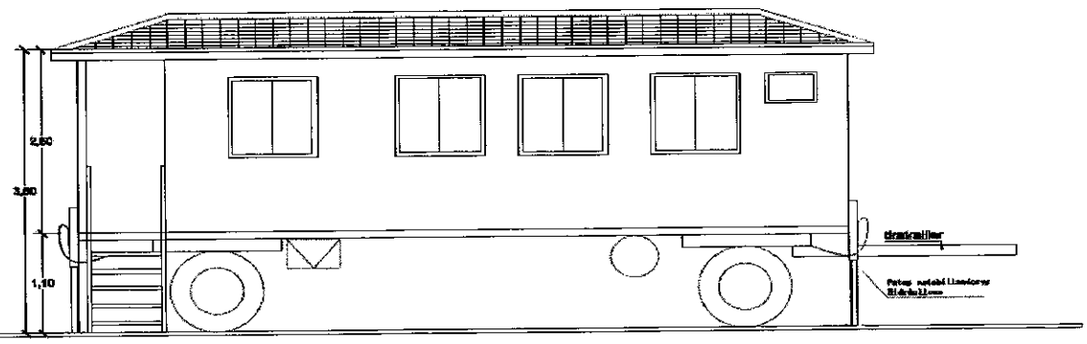

VISTA LATERAL

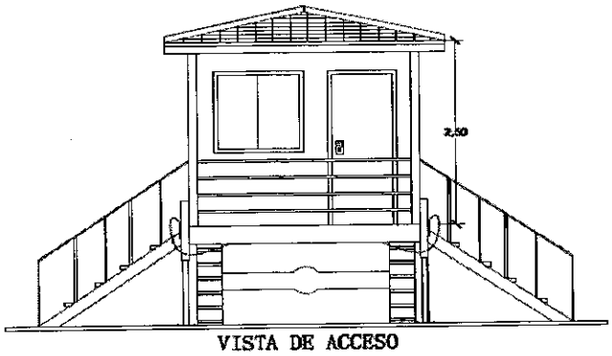

VISTA DE ACCESO

MODULO RODANTE

Especificacions Técnicas. MODULO ESTATICO – PLAN DE CONTINGENCIA

ITEM	CODI	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD
02	72131601-9997	**DIMENSIONES:** Largo: 9.00 mts. Ancho: 2.70 mts. Altura: 2.80 mts **CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS** ✓ La estructura principal fabricada en perfil estructural de Acero al Carbono, Calidad ASTM A36.- ✓ Soldadura proceso MIG MAG. ✓ Las paredes y techos externos en chapa plegada de acero al carbono. ✓ Internamente paredes y cielo raso de PVC PVC (incluye voladizo y techo de plataforma). ✓ Piso de madera multilaminado fenólico, parte superior revestida con alfombra de goma antideslizante tipo moneda. ✓ Piso del sanitario con chapa antideslizante. ✓ Aislación termo-acústica en paredes y techo con Isopor ESP F de 50 mm de espesor. ✓ Fabricación y montaje de plataforma y escalera de acceso con baranda móvil (02). ✓ Bastidor para soporte de piso metálico. ✓ Base de modulo. Profundidad: H: 60cm; 20cm sobre nivel de suelo. Ancho: 2.80m Largo: 9.10m **DEPENDENCIAS-EQUIPAMIENTOS:** ✓ (01) Puerta Blindex de acceso 0,80 x 2,10. ✓ (01) Puerta metálica 0,80 x 2,10. ✓ (01) Puerta metálica 0,70 x 2,10. ✓ Ventanas de blindex corredizas de: (09) ventanas de 1,00 x 1,00 (incluye colocación y herraje) (01) ventanas de 0,60 x 0,40 (incluye colocación y herraje) (01) ventana para atención al público con cortes adecuados 1.00x1.00m ✓ (01)Sanitario equipado e instalado(inodoro, lavatorio, ducha, espejo, extractor, griferías, bomba de 1/2HP) . (01)Tanque de 300 litros para agua potable. ✓ (01)Tanque de 300 litros para agua servida. ✓ Logotipo frontal 0.80x2.10m (luminoso). ✓ (02) Logotipos laterales 0.80x1m. ✓ Mesada de acero inoxidable con conexión agua corriente y grifería. ✓ Mesada tipo L 0.55x2m con mueble con puertas/estante para Kitchenette. ✓ Provisión y colocación de manguera de 6 metros para desagüe de tanque de residuo c/ caja. ✓ Extintor de 6kg. **INSTALACIONES ELÉCTRICAS** ✓ (13) Fluorescente 1x40 ✓ (02) Tomas para computadora ✓ (08) Tomas corrientes de 220 Volts ✓ (02) Toma para COPACO ✓ (01) Tablero General ANDE ✓ (01) Tablero para teléfono. ✓ Conexión a Internet **Obs:** Toda conexión exterior a ANDE, COPACO, INTERNET y ESSAP queda a cargo de la institución. La caseta deberá contener 2 (dos) sistema de refrigeración (Oficina-Sala de Espera). **Revestimiento:** Toda la estructura metálica será sometida a una adecuada limpieza superficial mecánica y será revestida con pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc y pintura sintética de terminación en color a elección del cliente.	Unidad	02

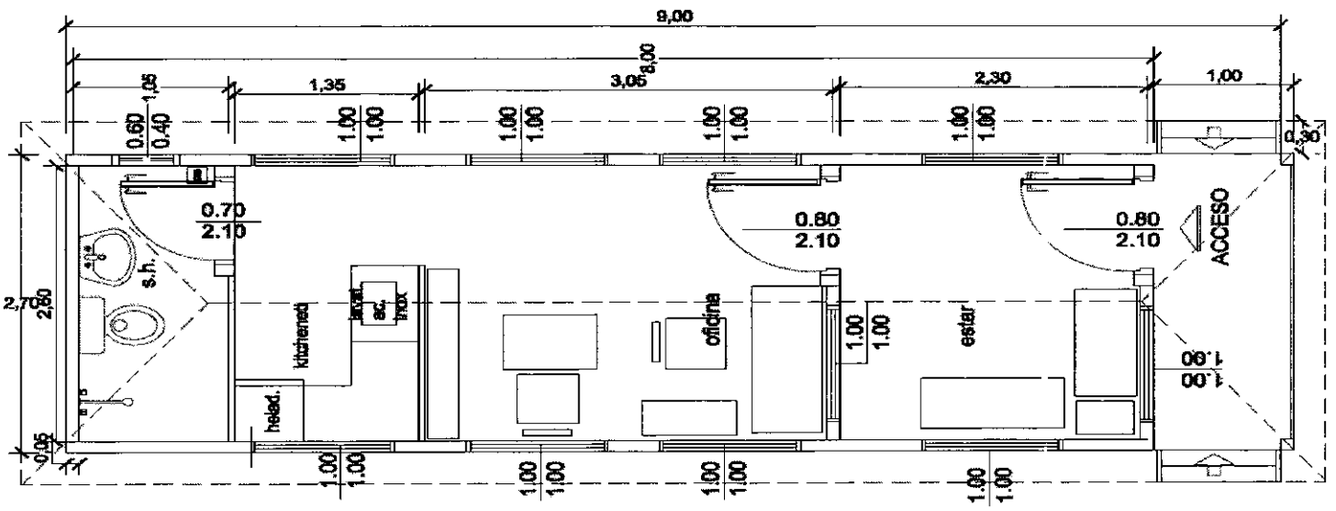

PLANTA ACOTADA

MODULO ESTATICO

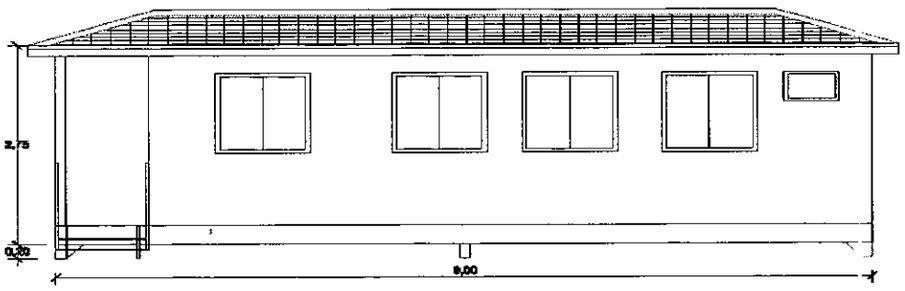

VISTA LATERAL

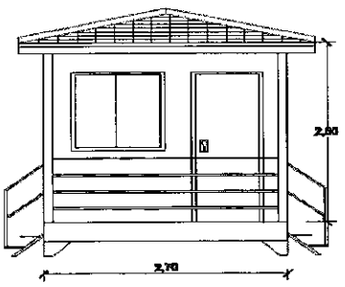

VISTA DE ACCESO

MODULO ESTATICO
