DE: **COMITÉ DE EVALUACION**

PARA: **SR. LUCAS CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA: **27/10/2.021.-**

HORA: **09:00 Hs.**
OBJETO: **ELEVAR INFORME SOBRE LA RESCICIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS Nº 14/2.021 DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2.021 – "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM. 13, 14, 20, 21, 30, 31, 32. CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO KM. 15 MONDAY. CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO Y CERCADO EN EL KM 27" ID Nº 396.163.- ----------**

A fin de elevar informe y dictamen de la Unidad Operativa de Contrataciones, resultante del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 05/2.021 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 13, 14, 20, 21, 30, 31, 32. Construcción de Tinglado Km. 15 Monday. Construcción de Caminero y Cercado en el Km 27" ID Nº 396.163.----------**

Con relación a la Res. I.M. Nº 2.417/2.021.- de fecha 05 de julio de 2.021.-, por la cual se adjudica a la firma **Elián Construcciones** del **Sr. Juan Carlos Bernal** con **RUC 880202-5** con relación al presente procedimiento.----------

La empresa de **Elián Construcciones** del **Sr. Juan Carlos Bernal** con **RUC 880202-5** ha presentado una nota en fecha 27/10/2.021.- en el cual solicitan la **Rescisión del Contrato Nº 14/2.021.-** En la nota mencionan que fue ejecutado el **48%** de la obra. A continuación se encuentran anexados los **Certificados Nº 1 y Nº 2** presentados por la empresa:

Benita Perla Garay Velazqu...
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guc

José Mar... Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristóbal C... Espinola
Director de Adm. y Fina...
Municipalidad de Minga Guazú

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 01

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, KM 13, 14, 20, 21, 30, 31, 32, CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO KM. 15 MONDAY, CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO Y CERCADO EN EL KM 27 – CONTRATO Nº 14/2021 – ID Nº 396.163

FECHA: 06 DE OCTUBRE DEL 2021

						CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1					
						CERTIFICADO ANTERIORES			CERTIFICADO ACTUAL		
Nº	RUBRO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	CANTIDAD A CERTIFICAR	% EN CANTIDADES	ACUMULADO
1	Construcción de Empedrado en el Km 13 Monday - Barrio Santa Teresa - Tramo 2										
1.1	Trabajos Preliminares										
1.2	Cartel de Obra 1,00 x 2,00	Un	2,00	500.000	1.000.000		0%		2,00	100%	1.000.000
1.3	Replanteo, Levantamiento plani altimétrico y Mensura	Km	855,80	1.400	1.716.113		0%		855,80	100%	1.716.113
	Preparacion de Suelo con Motoniveladora	m2	855,80	2.400	2.116.113		0%		855,80	100%	2.716.113
1.4	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada Colchón Tierra Colorada	m3	177,16	3.400	602.363		0%		177,16	100%	602.363
1.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	856,80	29.995	25.699.566		0%		856,80	100%	25.699.566
1.6	Empedrado Terminado Tipo VI (0,07 m/m²)	m2	856,80	3.400	3.390.373		0%			0%	
1.7	Cordón de Ho									0%	
	Cordon Prefabricado de Ho. 30x50x30 cm c/ protección lateral	ml	294,70	27.995	8.222.197		0%		294,70	100%	8.222.197
1.8	Compactación Compactación preliminar	m2	856,80	400	2.716.113		0%		856,80	100%	2.716.113
1.9	Compactación Final	m2	856,80	3.400	2.716.113		0%			0%	
1.10	Limpieza Limpieza final de obra	m2	856,80	3.999	3.777.733		0%			0%	
2	Construcción de Empedrado Detrás del Parque Industrial Taiwán										
2.1	Trabajos Preliminares Cartel de Obra 1,00 x 2,00	m2	2,00	500.000	1.000.000		0%			0%	
2.2	Replanteo, Levantamiento plani altimétrico y Mensura	m2	1.000,40	2.400	2.500.000		0%			0%	
2.3	Preparacion de Suelo con Motoniveladora	m2	1.000,40	2.400	2.500.000		0%			0%	
2.4	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada Colchón Tierra Colorada	m3	200,08	3.400	680.260		0%			0%	
2.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	1.000,40	29.995	30.006.998		0%			0%	
2.6	Empedrado Terminado Tipo VI (0,07 m/m²)	m2	1.000,40	3.400	3.400.400		0%			0%	
2.7	Cordón de Ho Cordon Prefabricado de Ho. 30x50x30 cm c/ protección lateral	ml	350,00	27.995	9.798.250		0%			0%	
2.8	Compactación Compactación preliminar	m2	1.000,40	400	1.400.000		0%			0%	
2.9	Compactación Final	m2	1.000,40	3.400	3.400.400		0%			0%	
2.10	Limpieza Limpieza final de obra	m2	1.000,40	1.999	1.999.200		0%			0%	
3	Construcción de Empedrado en el Km 14 Acaray - Barrio Marcelia										
3.1	Trabajos Preliminares Cartel de Obra 1,00 x 2,00	m2	2,00	500.000	1.000.000		0%		2,00	100%	1.000.000
3.2	Replanteo, Levantamiento plani altimétrico y Mensura	m2	912,00	2.400	2.179.968		0%		912,00	100%	2.179.968
3.3	Preparacion de Suelo con Motoniveladora	m2	912,00	2.400	2.179.968		0%		912,00	100%	2.179.968
3.4	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada Colchón Tierra Colorada	m3	182,40	3.400	608.256		0%		182,40	100%	608.256
3.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	912,00	29.995	27.355.440		0%		912,00	100%	27.355.440
3.6	Empedrado Terminado Tipo VI (0,07 m/m²)	m2	912,00	3.400	3.100.480		0%			0%	
3.7	Cordón de Ho Cordon Prefabricado de Ho. 30x50x30 cm c/ protección lateral	ml	216,00	27.995	6.046.920		0%		216,00	100%	6.046.920
3.8	Compactación Compactación preliminar	m2	912,00	400	2.179.968		0%			0%	
3.9	Compactación Final	m2	912,00	2.400	2.179.968		0%		912,00	100%	2.179.968
3.10	Limpieza Limpieza final de obra	m2	912,00	1.999	1.824.088		0%			0%	
4	Construcción de Empedrado en el Km 14 Monday - Barrio San Miguel - Tramo 1										
4.1	Trabajos Preliminares Cartel de Obra 1,00 x 2,00	m2	2,00	500.000	1.000.000		0%		2,00	100%	1.000.000
4.2	Replanteo, Levantamiento plani altimétrico y Mensura	m2	723,40	2.400	1.807.777		0%		723,40	100%	1.807.777
4.3	Preparacion de Suelo con Motoniveladora	m2	723,40	2.400	1.807.777		0%		723,40	100%	1.807.777
4.4	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada Colchón Tierra Colorada	m3	144,68	3.400	491.775		0%		144,68	100%	491.775
4.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	723,40	29.995	21.698.583		0%		723,40	100%	21.698.583
4.6	Empedrado Terminado Tipo VI (0,07 m/m²)	m2	723,40	3.400	2.503.177		0%		723,40	100%	2.503.177
4.7	Cordón de Ho Cordon Prefabricado de Ho. 30x50x30 cm c/ protección lateral	ml	184,00	27.995	5.151.080		0%		184,00	100%	5.151.080
4.8	Compactación Compactación preliminar	m2	723,40	400	1.807.777		0%		723,40	100%	1.807.777
4.9	Compactación Final	m2	723,40	2.400	1.807.777		0%		723,40	100%	1.807.777
4.10	Limpieza Limpieza final de obra	m2	723,40	1.999	1.446.017		0%			0%	

Benita Perla Goray Velazqu
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guz

José M[illegible] Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazu

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

5	Construcción de Empedrado en el Km 14 Monday - Barrio San Miguel - Tramo 2 - Al Costado de la Plaza										
	Trabajos Preliminares										
5.1	Cartel de Obra: 1,00 x 2,00	m2	2,00	500.000	1.000.000	0%			2,00	100%	1.000.000
5.2	Replanteo, Levantamiento plani altimetrico y Marcación	m2	721,40	2.499	1.803.277	0%			721,40	100%	1.803.277
5.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	721,40	2.499	1.803.277	0%			721,40	100%	1.803.277
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
5.4	Colchon Tierra Colorada	m3	144,68	3.499	506.345	0%			144,68	100%	506.345
5.5	Piedra Bruta Basaltica (0,20 m3/m2)	m2	721,40	29.995	21.635.384	0%			721,40	100%	21.635.384
5.6	Empedrado Trabajado Tipo VI (0,02 tn/m2)	m2	721,40	3.499	2.523.177	0%				0%	
	Cordón de Ho										
5.7	Cordón Prefabricado de Ho. 10x50x40 (cm)c/ protección lateral	ml	184,00	27.995	5.151.080	0%			184,00	100%	5.151.080
	Compactación										
5.8	Compactación preliminar	m2	721,40	2.499	1.803.277	0%			721,40	100%	1.803.277
5.9	Compactación Final	m2	721,40	2.499	1.803.277	0%				0%	
	Limpieza										
5.10	Limpieza final de obra	m2	721,40	1.999	1.442.077	0%				0%	
6	Construcción de Empedrado en el Km 14 Monday - Fracción Dos Miguel										
	Trabajos Preliminares										
6.1	Cartel de Obra: 1,00 x 2,00	m2	2,00	500.000	1.000.000	0%			2,00	100%	1.000.000
6.2	Replanteo, Levantamiento plani altimetrico y Marcación	m2	577,70	2.499	1.443.672	0%			577,70	100%	1.443.672
6.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	577,70	2.499	1.443.672	0%			577,70	100%	1.443.672
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
6.4	Colchon Tierra Colorada	m3	115,54	3.499	404.274	0%			115,54	100%	404.274
6.5	Piedra Bruta Basaltica (0,20 m3/m2)	m2	577,70	29.995	17.328.112	0%			577,70	100%	17.328.112
6.6	Empedrado Trabajado Tipo VI (0,02 tn/m2)	m2	577,70	3.499	2.021.572	0%				0%	
	Cordón de Ho										
6.7	Cordón Prefabricado de Ho. 10x50x40 (cm)c/ protección lateral	ml	146,00	27.995	4.087.270	0%			146,00	100%	4.087.270
	Compactación										
6.8	Compactación preliminar	m2	577,70	2.499	1.443.672	0%			577,70	100%	1.443.672
6.9	Compactación Final	m2	577,70	2.499	1.443.672	0%				0%	
	Limpieza										
6.10	Limpieza final de obra	m2	577,70	1.999	1.154.823	0%				0%	
7	Construcción de Empedrado en el Km 14 Monday - Fracción Placid										
	Trabajos Preliminares										
7.1	Cartel de Obra: 1,00 x 2,00	m2	2,00	500.000	1.000.000	0%			2,00	100%	1.000.000
7.2	Replanteo, Levantamiento plani altimetrico y Marcación	m2	1.280,00	2.499	3.198.720	0%			1.280,00	100%	3.198.720
7.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	1.280,00	2.499	3.198.720	0%			1.280,00	100%	3.198.720
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
7.4	Colchon Tierra Colorada	m3	256,00	3.499	895.744	0%			256,00	100%	895.744
7.5	Piedra Bruta Basaltica (0,20 m3/m2)	m2	1.280,00	29.995	38.393.600	0%			1.280,00	100%	38.393.600
7.6	Empedrado Trabajado Tipo VI (0,02 tn/m2)	m2	1.280,00	3.499	4.478.720	0%			1.280,00	100%	4.478.720
	Cordón de Ho										
7.7	Cordón Prefabricado de Ho. 10x50x40 (cm)c/ protección lateral	ml	304,00	27.995	8.510.480	0%			304,00	100%	8.510.480
	Compactación										
7.8	Compactación preliminar	m2	1.280,00	2.499	3.198.720	0%			1.280,00	100%	3.198.720
7.9	Compactación Final	m2	1.280,00	2.499	3.198.720	0%			1.280,00	100%	3.198.720
	Limpieza										
7.10	Limpieza final de obra	m2	1.280,00	1.999	2.558.720	0%				0%	
8	Construcción de Empedrado en el Km 20 Acaray - Barrio San Felipe III										
	Trabajos Preliminares										
8.1	Cartel de Obra: 1,00 x 2,00	m2	2,00	500.000	1.000.000	0%				0%	
8.2	Replanteo, Levantamiento plani altimetrico y Marcación	m2	278,00	2.499	694.722	0%				0%	
8.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	278,00	2.499	694.722	0%				0%	
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
8.4	Colchon Tierra Colorada	m3	55,60	2.499	194.944	0%				0%	
8.5	Piedra Bruta Basaltica (0,20 m3/m2)	m2	278,00	29.995	8.338.610	0%				0%	
8.6	Empedrado Trabajado Tipo VI (0,02 tn/m2)	m2	278,00	3.499	972.722	0%				0%	
	Cordón de Ho										
8.7	Cordón Prefabricado de Ho. 10x50x40 (cm)c/ protección lateral	ml	70,00	27.995	1.959.650	0%				0%	
	Compactación										
8.8	Compactación preliminar	m2	278,00	2.499	694.722	0%				0%	
8.9	Compactación Final	m2	278,00	2.499	694.722	0%				0%	
	Limpieza										
8.10	Limpieza final de obra	m2	278,00	1.999	555.722	0%				0%	
9	Construcción de Empedrado en el Km 21 Acaray - Fracción San Bernardo										
	Trabajos Preliminares										
9.1	Cartel de Obra: 1,00 x 2,00	m2	2,00	500.000	1.000.000	0%				0%	
9.2	Replanteo, Levantamiento plani altimetrico y Marcación	m2	600,00	2.499	1.499.400	0%				0%	
9.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	600,00	2.499	1.499.400	0%				0%	
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
9.4	Colchon Tierra Colorada	m3	120,00	3.499	419.880	0%				0%	
9.5	Piedra Bruta Basaltica (0,20 m3/m2)	m2	600,00	29.995	17.997.000	0%				0%	
9.6	Empedrado Trabajado Tipo VI (0,02 tn/m2)	m2	600,00	3.499	2.099.400	0%				0%	
	Cordón de Ho										
9.7	Cordón Prefabricado de Ho. 10x50x40 (cm)c/ protección lateral	ml	200,00	27.995	5.599.000	0%				0%	
	Compactación										
9.8	Compactación preliminar	m2	600,00	2.499	1.499.400	0%				0%	
9.9	Compactación Final	m2	600,00	2.499	1.499.400	0%				0%	
	Limpieza										
9.10	Limpieza final de obra	m2	600,00	1.999	1.199.400	0%				0%	

Benita Perla Garay Velazquez
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Gua

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

10	Construcción de Empedrado en el Km 30 Monday Asentamiento Los Constantes										
	Trabajos Preliminares										
10.1	Cartel de Obra 1.00 x 2.00										
10.2	Replanteo, Levantamiento plani altimetrico y Marcacion	m2	2,00	500.000	1.000.000						
10.3	Preparacion de Suelo con Motoniveladora	m2	1.809,20	3.499	6.331.341						
		m2	1.809,20	3.499	6.331.341						
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
10.4	Colchón Tierra Colorada	m3	271,38	3.499	949.548						
10.5	Piedra Bruta Bonificada (0,20 m²/pc)	m2	1.809,20	29.995	54.265.954						
10.6	Empedrado Trabado Tipo VI (0,02 bolsa)	m2	1.809,20	3.499	6.331.341						
	Cordón de Ho										
10.7	Cordón Prefabricado de Ho. 10x50x30 cm c/ protección lateral	ml	130,50	27.995	3.653.498						
	Compactación										
10.8	Compactación preliminar	m2	1.809,20	1.499	2.711.940						
10.9	Compactación Final	m2	1.809,20	2.499	4.521.540						
10.10	Limpieza	m2	1.809,20	2.499	4.521.540						
	Limpieza final de obra	m2	1.809,20	1.999	3.616.908						
11	Construcción de Empedrado en el Km 30 Monday Barrio Pinoty										
	Trabajos Preliminares										
11.1	Cartel de Obra 1.00 x 2.00										
11.2	Replanteo, Levantamiento plani altimetrico y Marcacion	m2	2,00	500.000	1.000.000						
11.3	Preparacion de Suelo con Motoniveladora	m2	496,85	3.499	1.738.408						
		m2	496,85	3.499	1.738.408						
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
11.4	Colchón Tierra Colorada	m3	99,47	3.499	347.996						
11.5	Piedra Bruta Bonificada (0,20 m²/pc)	m2	496,85	29.995	14.900.016						
11.6	Empedrado Trabado Tipo VI (0,02 bolsa)	m2	496,85	3.499	1.738.408						
	Cordón de Ho										
11.7	Cordón Prefabricado de Ho. 10x50x30 cm c/ protección lateral	ml	109,40	27.995	3.061.753						
	Compactación										
11.8	Compactación preliminar	m2	496,85	1.499	744.626						
11.9	Compactación Final	m2	496,85	2.499	1.241.628						
11.10	Limpieza	m2	496,85	2.499	1.241.628						
	Limpieza final de obra	m2	496,85	1.999	993.008						
12	Construcción de Empedrado en el Km 30 Acaray Barrio Las Delicias										
	Trabajos Preliminares										
12.1	Cartel de Obra 1.00 x 2.00										
12.2	Replanteo, Levantamiento plani altimetrico y Marcacion	m2	2,00	500.000	1.000.000						
12.3	Preparacion de Suelo con Motoniveladora	m2	907,40	3.499	3.175.593						
		m2	907,40	3.499	3.175.593						
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
12.4	Colchón Tierra Colorada	m3	181,48	3.499	634.998						
12.5	Piedra Bruta Bonificada (0,20 m²/pc)	m2	907,40	29.995	27.217.453						
12.6	Empedrado Trabado Tipo VI (0,02 bolsa)	m2	907,40	3.499	3.175.593						
	Cordón de Ho										
12.7	Cordón Prefabricado de Ho. 10x50x30 cm c/ protección lateral	ml	230,50	27.995	6.452.548						
	Compactación										
12.8	Compactación preliminar	m2	907,40	1.499	1.360.193						
12.9	Compactación Final	m2	907,40	2.499	2.267.293						
12.10	Limpieza	m2	907,40	2.499	2.267.293						
	Limpieza final de obra	m2	907,40	1.999	1.813.859						
13	Construcción de Empedrado en el Km 33 Acaray Barrio Triangulo Centro										
	Trabajos Preliminares										
13.1	Cartel de Obra 1.00 x 2.00										
13.2	Replanteo, Levantamiento plani altimetrico y Marcacion	m2	2,00	500.000	1.000.000						
13.3	Preparacion de Suelo con Motoniveladora	m2	578,70	3.499	2.025.513						
		m2	578,70	3.499	2.025.513						
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
13.4	Colchón Tierra Colorada	m3	115,74	3.499	404.978						
13.5	Piedra Bruta Bonificada (0,20 m²/pc)	m2	578,70	29.995	17.358.203						
13.6	Empedrado Trabado Tipo VI (0,02 bolsa)	m2	578,70	3.499	2.025.513						
	Cordón de Ho										
13.7	Cordón Prefabricado de Ho. 10x50x30 cm c/ protección lateral	ml	200,70	27.995	5.618.597						
	Compactación										
13.8	Compactación preliminar	m2	578,70	1.499	867.543						
13.9	Compactación Final	m2	578,70	2.499	1.446.171						
13.10	Limpieza	m2	578,70	2.499	1.446.171						
	Limpieza final de obra	m2	578,70	1.999	1.156.893						
14	Construcción de Empedrado en el Km 14 Monday Barrio Rehasti										
	Trabajos Preliminares										
14.1	Cartel de Obra 1.00 x 2.00										
14.2	Replanteo, Levantamiento plani altimetrico y Marcacion	m2	2,00	500.000	1.000.000						
14.3	Preparacion de Suelo con Motoniveladora	m2	794,60	3.499	2.780.708						
		m2	794,60	3.499	2.780.708						
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
14.4	Colchón Tierra Colorada	m3	158,92	3.499	556.063						
14.5	Piedra Bruta Bonificada (0,20 m²/pc)	m2	794,60	29.995	23.834.027						
14.6	Empedrado Trabado Tipo VI (0,02 bolsa)	m2	794,60	3.499	2.780.708						
	Cordón de Ho										
14.7	Cordón Prefabricado de Ho. 10x50x30 cm c/ protección lateral	ml	189,40	27.995	5.302.253						
	Compactación										
14.8	Compactación preliminar	m2	794,60	1.499	1.191.406						
14.9	Compactación Final	m2	794,60	2.499	1.985.708						
14.10	Limpieza	m2	794,60	2.499	1.985.708						
	Limpieza final de obra	m2	794,60	1.999	1.588.405						

Benita Perla Garay Velázquez
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Gua

José Mariano Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristobal [illegible] Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

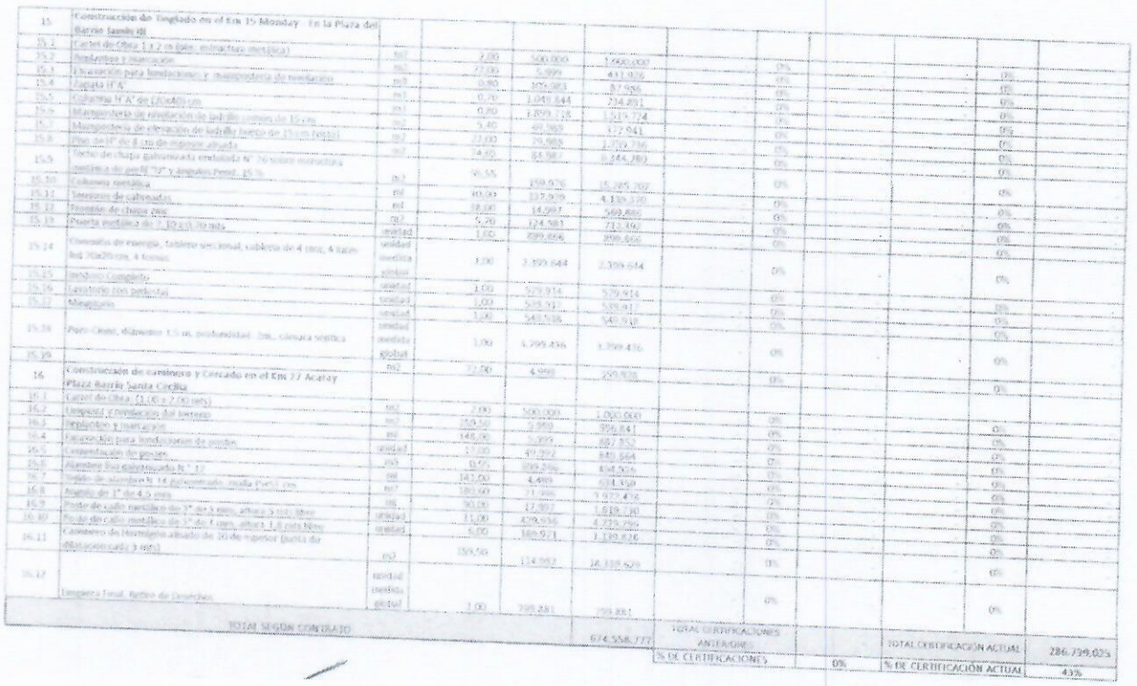

15	Construcción de Tinglado en el Km 15 Monday - En la Plaza del Barrio Santa Fe										
15.1	Cartel de Obra 1,2 x 2,40 (obr. estructura metálica)										
15.2	Limpieza y nivelación										
15.3	Excavación para fundaciones y mejoramiento de fundación										
15.4	Zapata H°A°										
15.5	Columna H°A° en (20x40) cm										
15.6	Mampostería de elevación de ladrillo común de 15 cm										
15.7	Mampostería de elevación de ladrillo común de 15 cm (vigas)										
15.8	Viga H°A° de 8 cm de espesor alisada										
15.9	Techo de chapa galvanizada ondulada N° 26 sobre estructura metálica de perfil "G" y tirantes Perfil "C"										
15.10	Cubierta vertical										
15.11	Terminación de cabreadas										
15.12	Frontón de chapa cinc										
15.13	Puerta metálica de 1,20x2,10 mts.										
15.14	Instalación de energía, tablero seccional, cableado de 4 tom, 4 tom, 4x6 mm, con 4 tomas										
15.15	Artefacto completo										
15.16	Luminaria con pantalla										
15.17	Ventilador										
15.18	Plan Obras, diagrama 1,5 mt, profundidad 1mt., cámara séptica										
15.19											
16	Construcción de caminocito y Cercado en el Km 17 Acaray Plaza Barrio Santa Cecilia										
16.1	Cartel de Obra 1,2 (0,6 x 2,40 mts)										
16.2	Limpieza y nivelación del terreno										
16.3	Replanteo y marcación										
16.4	Excavación para fundaciones de postes										
16.5	Preparación de postes										
16.6	Hormigón H°A° Mezclado N° 17										
16.7	Postes de madera N° 14 perpendicular media (1x6) cm										
16.8	Postes de 1° de 4,5 mts										
16.9	Poste de cabo tensión de 3° de 3 mts, altura 2,10 libre										
16.10	Poste de cabo tensión de 1° de 4 mts, altura 1,8 libre										
16.11	Cemento de hormigón alisado de 20 de espesor (junta de dilatación cada 3 mts)										
16.12											
	TOTAL SEGÚN CONTRATO				674.558.777	TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES			TOTAL CERTIFICACION ACTUAL		286.739.035
						% DE CERTIFICACIONES	0%		% DE CERTIFICACIÓN ACTUAL		43%

Benita Perla Gonay Velazq.
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Mir a Gu

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

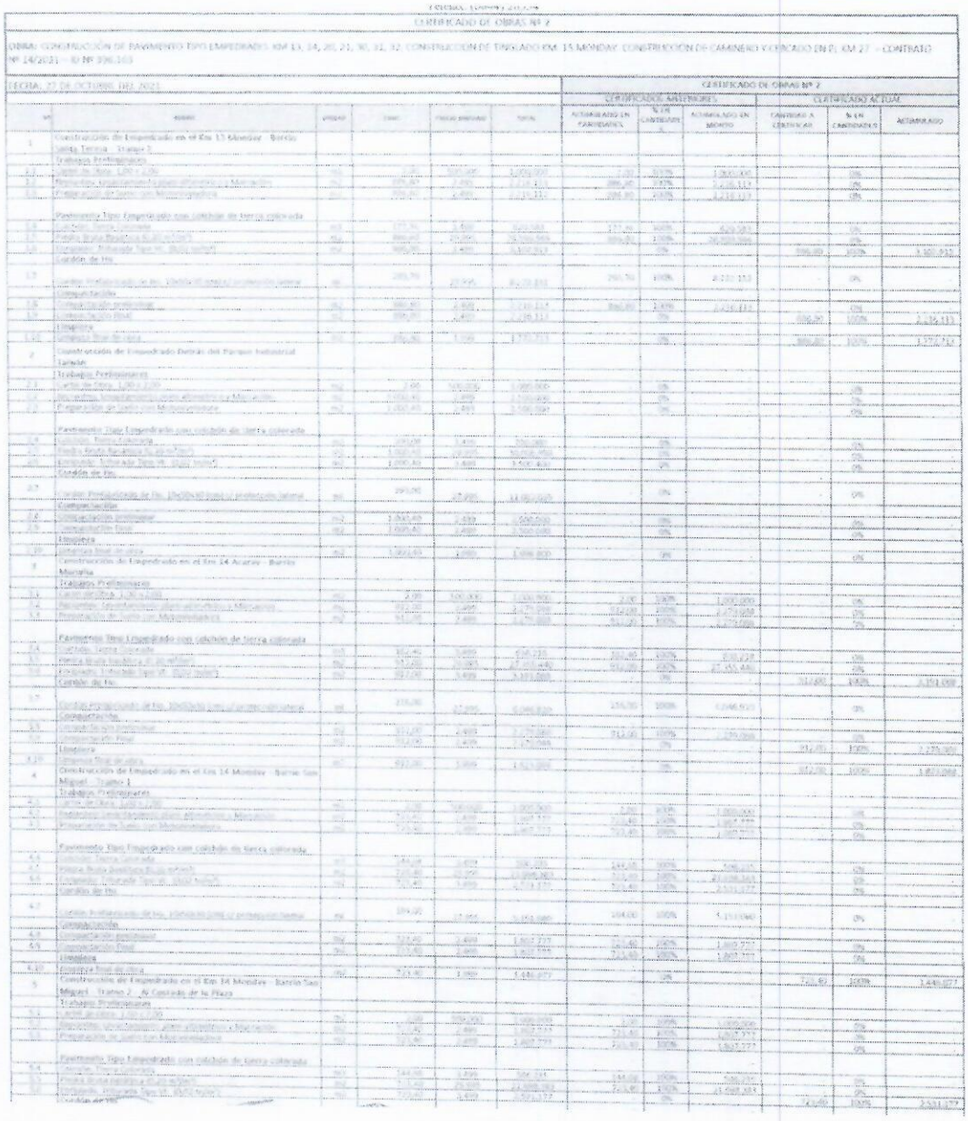

Benita Perla Garay Velazqu
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guc

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazu

Lic. Cristóbal Cabrilla Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

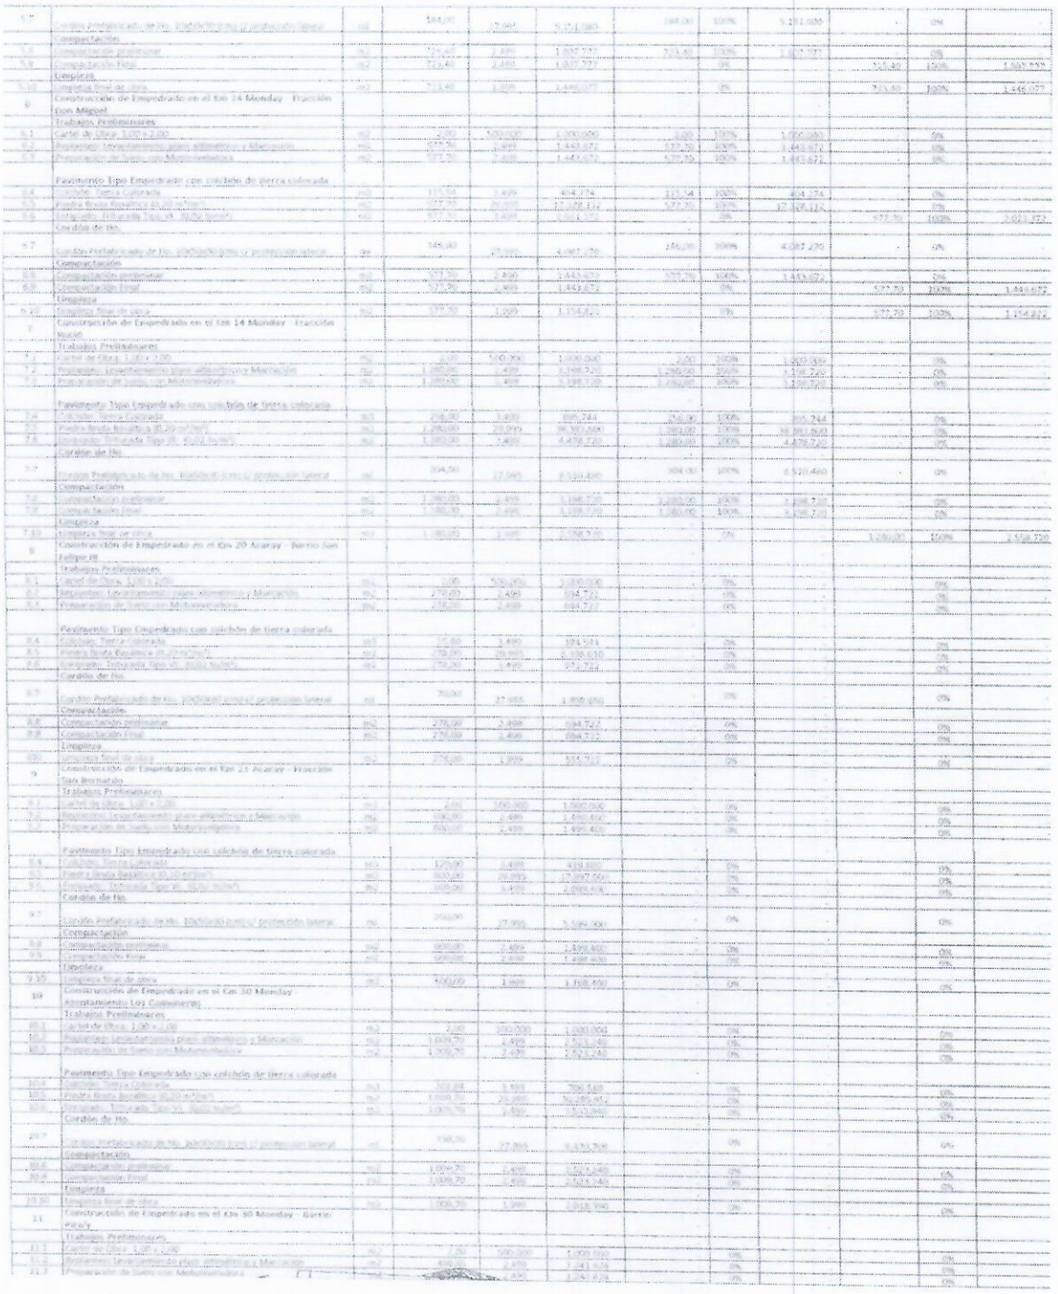

Benita Perla Giray Velázqu
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guc

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cabrera Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

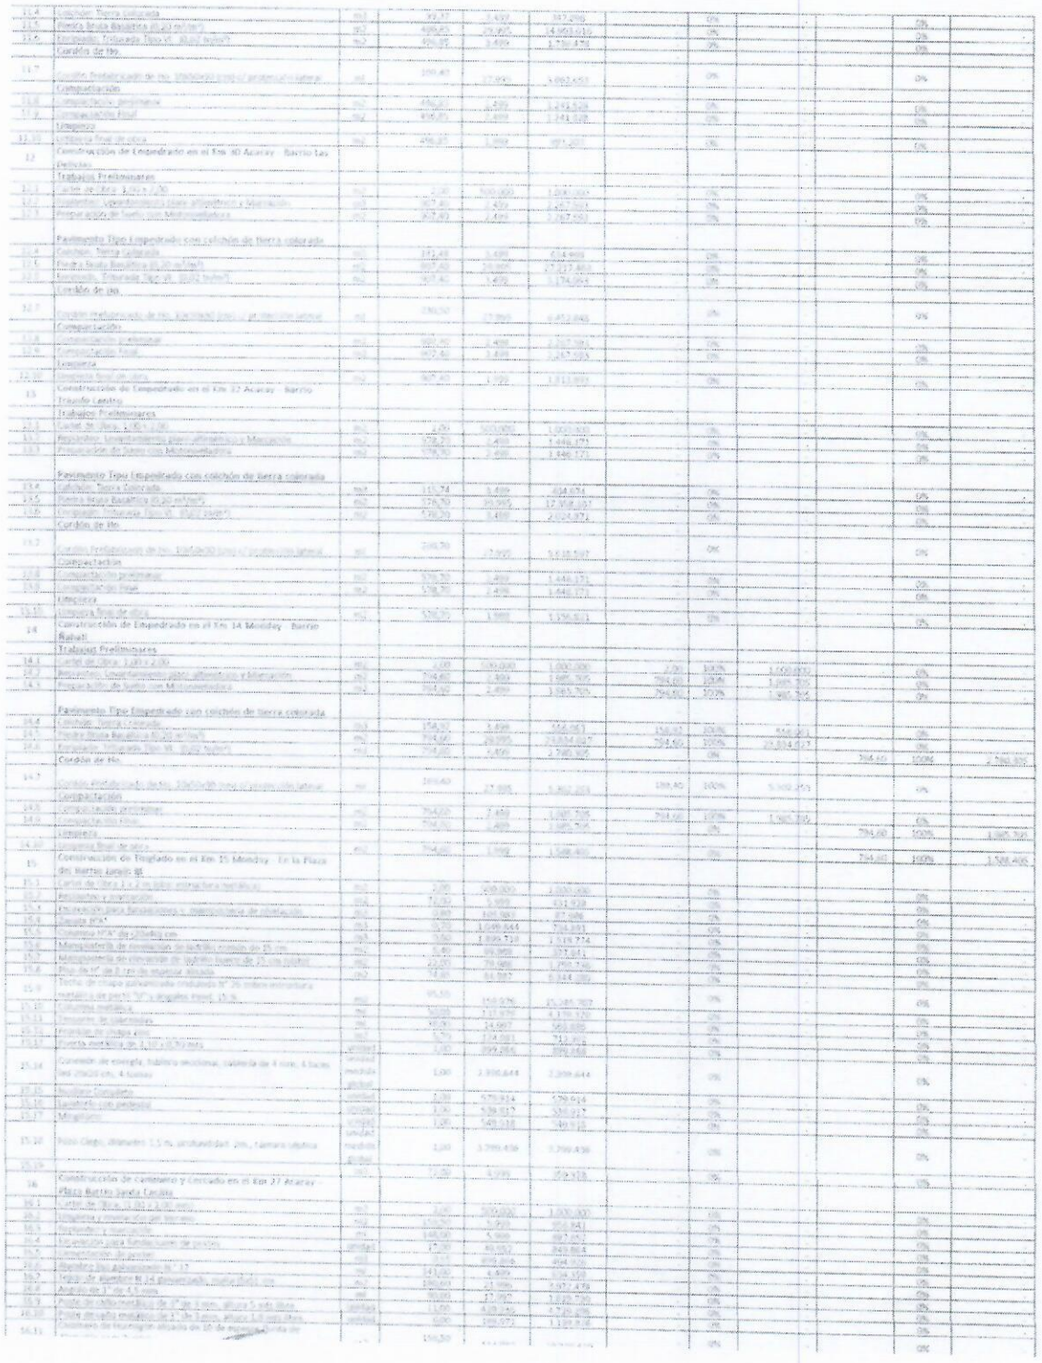

11.4	Colchón Tierra Colorada	m2	39,37	3.499	347.298		0%			0%	
11.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	496,85	29.995	14.903.016		0%			0%	
11.6	Enripiado Triturada Tipo VI (0,02 m³/m²)	m2	496,85	3.499	1.738.478		0%			0%	
	Cordón de Ho.										
11.7	Cordón Prefabricado de Ho. 10x50x30 cms c/ protección lateral	m2	100,40	27.995	5.062.653		0%			0%	
	Compactación										
11.8	Compactación preliminar	m2	496,85	3.499	1.241.528		0%			0%	
11.9	Compactación Final	m2	496,85	3.499	1.241.528		0%			0%	
	Limpieza										
11.10	Limpieza final de obra	m2	496,85	1.999	993.201		0%			0%	
12	Construcción de Empedrado en el Km 30 Acaray - Barrio Las Delicias										
	Trabajos Preliminares										
12.1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00	m2	2,00	500.000	1.000.000		0%			0%	
12.2	Replanteo, Levantamiento plano altimétrico y Marcación	m2	907,40	3.499	3.167.593		0%			0%	
12.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	907,40	3.499	3.167.593		0%			0%	
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
12.4	Colchón Tierra Colorada	m2	141,48	3.499	634.969		0%			0%	
12.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	907,40	29.995	27.217.463		0%			0%	
12.6	Enripiado Triturada Tipo VI (0,02 m³/m²)	m2	907,40	3.499	3.174.064		0%			0%	
	Cordón de Ho.										
12.7	Cordón Prefabricado de Ho. 10x50x30 cms c/ protección lateral	m2	230,50	27.995	6.452.048		0%			0%	
	Compactación										
12.8	Compactación preliminar	m2	907,40	3.499	3.167.593		0%			0%	
12.9	Compactación Final	m2	907,40	3.499	3.167.593		0%			0%	
	Limpieza										
12.10	Limpieza final de obra	m2	907,40	1.999	1.813.893		0%			0%	
13	Construcción de Empedrado en el Km 32 Acaray - Barrio Trajuño Centro										
	Trabajos Preliminares										
13.1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00	m2	2,00	500.000	1.000.000		0%			0%	
13.2	Replanteo, Levantamiento plano altimétrico y Marcación	m2	578,70	3.499	1.446.171		0%			0%	
13.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	578,70	3.499	1.446.171		0%			0%	
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
13.4	Colchón Tierra Colorada	m2	115,74	3.499	404.674		0%			0%	
13.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	578,70	29.995	17.358.167		0%			0%	
13.6	Enripiado Triturada Tipo VI (0,02 m³/m²)	m2	578,70	3.499	2.024.871		0%			0%	
	Cordón de Ho.										
13.7	Cordón Prefabricado de Ho. 10x50x30 cms c/ protección lateral	m2	230,70	27.995	5.638.597		0%			0%	
	Compactación										
13.8	Compactación preliminar	m2	578,70	3.499	1.446.171		0%			0%	
13.9	Compactación Final	m2	578,70	3.499	1.446.171		0%			0%	
	Limpieza										
13.10	Limpieza final de obra	m2	578,70	1.999	1.156.821		0%			0%	
14	Construcción de Empedrado en el Km 14 Monday - Barrio Rahati										
	Trabajos Preliminares										
14.1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00	m2	2,00	500.000	1.000.000	2,00	100%	1.000.000		0%	
14.2	Replanteo, Levantamiento plano altimétrico y Marcación	m2	794,60	3.499	1.985.705	794,60	100%	1.985.705		0%	
14.3	Preparación de Suelo con Motoniveladora	m2	794,60	3.499	1.985.705	794,60	100%	1.985.705		0%	
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada										
14.4	Colchón Tierra Colorada	m2	158,92	3.499	556.063	158,92	100%	556.063		0%	
14.5	Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	m2	794,60	29.995	23.834.027	794,60	100%	23.834.027		0%	
14.6	Enripiado Triturada Tipo VI (0,02 m³/m²)	m2	794,60	3.499	2.780.305		0%		794,60	100%	2.780.305
	Cordón de Ho.										
14.7	Cordón Prefabricado de Ho. 10x50x30 cms c/ protección lateral	m2	189,40	27.995	5.302.253	189,40	100%	5.302.253		0%	
	Compactación										
14.8	Compactación preliminar	m2	794,60	3.499	1.985.705	794,60	100%	1.985.705		0%	
14.9	Compactación Final	m2	794,60	3.499	1.985.705		0%		794,60	100%	1.985.705
	Limpieza										
14.10	Limpieza final de obra	m2	794,60	1.999	1.588.405		0%		794,60	100%	1.588.405
15	Construcción de Tinglado en el Km 15 Monday - En la Plaza del Barrio Jardín 88										
15.1	Cartel de Obra 1 x 2 m (obra estructura metálica)	m2	2,00	500.000	1.000.000		0%			0%	
15.2	Replanteo y marcación	m2	72,00	5.999	431.928		0%			0%	
15.3	Excavación para fundaciones y mampostería de nivelación	m2	0,80	105.983	87.986		0%			0%	
15.4	Zapata N°4	m3	0,70	1.049.644	734.891		0%			0%	
15.5	Columna N°4 de 20x40 cm	m3	0,60	1.899.718	1.519.774		0%			0%	
15.6	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 15 cm	m2	0,40	89.988	377.941		0%			0%	
15.7	Mampostería de elevación de ladrillo huevo de 15 cm (obra)	m2	22,00	79.988	1.759.736		0%			0%	
15.8	Piso de 10 de 8 cm de espesor alisado	m2	74,80	84.987	6.344.080		0%			0%	
15.9	Techo de chapa galvanizada ondulada N° 26 sobre estructura metálica de perfil "U" y ángulos Pesol 15 %	m2	95,55	159.976	15.245.707		0%			0%	
15.10	Columna metálica	m2	50,00	117.979	4.179.170		0%			0%	
15.11	Tensores de cabriadas	m2	38,00	14.997	560.885		0%			0%	
15.12	Fraccion de chapa cinc	m2	5,70	124.981	713.916		0%			0%	
15.13	Puerta metálica de 1,10 x 0,70 mts	unidad	1,00	899.864	899.864		0%			0%	
15.14	Conexión de energía, tablero eléctrico, cableado de 4 mm, 4 luces led 20x20 cm, 4 luces	unidad medida global	1,00	2.300.644	2.300.644		0%			0%	
15.15	Nicolaro Completo	unidad	1,00	579.914	579.914		0%			0%	
15.16	Lavatorio con pedestal	unidad	1,00	539.917	539.917		0%			0%	
15.17	Mingitorio	unidad	1,00	549.918	549.918		0%			0%	
15.18	Pozo Ciego, diámetro 1,5 m, profundidad 2m, cámara séptica	unidad medida global	1,00	3.799.436	3.799.436		0%			0%	
15.19		m2	72,00	4.999	359.928		0%			0%	
16	Construcción de caminero y Cercado en el Km 27 Acaray - Plaza Barrio Santa Cecilia										
16.1	Cartel de Obra 1,00 x 2,00 mts	m2	2,00	500.000	1.000.000		0%			0%	
16.2	Limpieza y marcación del terreno	m2	150,50	5.999	902.841		0%			0%	
16.3	Replanteo y marcación	m2	148,00	5.999	887.852		0%			0%	
16.4	Excavación para fundaciones de postes	unidad	17,00	49.992	849.864		0%			0%	
16.5	Mampostería de postes	m2	0,54	899.866	494.926		0%			0%	
16.6	Alambre liso galvanizado N° 17	m2	141,00	4.499	634.359		0%			0%	
16.7	Tejido de alambre N 14 galvanizado, malla flexible	m2	180,00	21.996	3.677.478		0%			0%	
16.8	Angulo de 1" de 4,5 mm	m2	90,00	17.997	1.619.730		0%			0%	
16.9	Poste de chilo metálico de 1" de 3 mm, altura 5 mts libre	unidad	11,00	439.246	4.720.206		0%			0%	
16.10	Poste de caño metálico de 1" de 3 mm, altura 1,5 mts libre	unidad	0,00	189.972	1.189.836		0%			0%	
16.11	Caminero de Hormigón alisado de 10 de espesor Punta de		150,50				0%			0%	

16.12	Limpieza final, Retiro de Desechos	unidad medida global	1,00	799.881	799.881		0%			0%	
TOTAL SEGÚN CONTRATO					574.558.777	TOTAL CERTIFICACIONES ANTERIORES		246.739.025	TOTAL CERTIFICACIÓN ACTUAL		35.149.113
						% DE CERTIFICACIONES		43%	% DE CERTIFICACIÓN		5%

Benita Perla Garay Velázquez
Jefa de Presupuesto
Municipalidad de Minga Guazú

José Martínez Mercado
Auditor Interno
Municipalidad de Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanzas
Municipalidad de Minga Guazú

El 52% del Contrato de Obras N° 14/2.021.- se encuentra pendiente de ejecución el cual ya no podrá ser ejecutado debido a los argumentos expuestos en la Nota presentada por la empresa de **Elián Construcciones** del **Sr. Juan Carlos Bernal** con **RUC 880202-5.**----------

Que, teniendo en cuenta lo solicitado y lo que se establece en el **Pliego de Bases y Condiciones: Punto 19 Terminación del Contrato** según el **Art. 59 Ley N° 2.051/2.003** la Contratante podrá rescindir unilateralmente los contratos a los que se refiere esta ley en el caso de los siguientes incisos: **b)** por quiebra o insolvencia del proveedor, **g)** la Falta de Disponibilidad Financiera de la CONTRATANTE para hacer frente a los compromisos contractuales y **h)** en los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza. En éste último punto cabe destacar que el procedimiento de Licitación no es Plurianual; el cual tiene como plazo de ejecución 90 días para la realización de la Obra según el Pliego de Bases y Condiciones, y siendo postergado el inicio de la obra a consecuencia de las intensas lluvias por la zona donde se ejecutará la obra imposibilitando el cumplimiento con el plazo de ejecución establecido en el **Contrato de Obras N° 14/2.021**.----------

Es opinión del éste Comité de Evaluación, que corresponde, la **Rescisión del Contrato de Obras N° 14/2.021** con la firma **Elián Construcciones** del **Sr. Juan Carlos Bernal** con **RUC 880202-5** y se procede a anular el procedimiento de la Licitación por **Concurso de Ofertas N° 05/2.021 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 13, 14, 20, 21, 30, 31, 32. Construcción de Tinglado Km. 15 Monday. Construcción de Caminero y Cercado en el Km 27" ID N° 396.163.-**, y en consecuencia iniciar de nuevo el trámite para dicho efecto, conforme a las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional que habla de la autonomía Municipal y la Ley Orgánica Municipal.----------

Por tal motivo procedemos a solicitar a la Máxima Autoridad la Rescisión del **Contrato de Obras N° 14/2.021** según la **Res. I.M. N° 2.417/2.021.- de fecha 05 de julio de 2.021.-** de la **Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2.021 – "Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 13, 14, 20, 21, 30, 31, 32. Construcción de Tinglado Km. 15 Monday. Construcción de Caminero y Cercado en el Km 27" ID N° 396.163.-** como establece en las disposiciones legales en las materias establecidas en el **Art. 59 Ley N° 2.051/2.003** de Contrataciones Públicas y su reglamentación y la realización de un nuevo procedimiento de licitación.----------

Atentamente

Benita Perla Garay V.
Jefa de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristóbal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

José Francisco Martínez Mercado
Auditor Interno
