14 (catorce)

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

Asunción, 30 de mayo de 2024

Nota O156-20240530-146

Atención:

Ing. Claudia Centurión, Ministra
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ing. Julio Ríos
Dirección de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Oliva entre Alberdi y 14 de Mayo, Edificio Ex – LAP
Asunción, Paraguay.

Referencia: CONTRATO S.G. MINISTRO N° 21/2022 "LLAMADO MOPC N° 69/2021 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL – 2DA TANDA. ID 400.854"

Asunto: Comunicación de Avance y Estado Actual de Zona de Obra

De nuestra consideración;

En representación del CONSORCIO PUENTE PARAGUAY, nos dirigimos a usted, y por su intermedio a quien corresponda con relación al contrato indicado en el tema de referencia a fin de manifestar cuanto sigue:

A finales de Febrero del corriente año, se retomaron las actividades realizando reparaciones de los accesos y limpiezas en zonas de obras debido a la crecida, el Rio Monday ha dejado zonas inundadas. Se realizaron terraplén de avance para ejecutar la viga pórtico de la Pila 2.

En el mes de marzo se ejecutaron armado, encofrado y carga de viga pórtico. También se ejecutaron los altares en las vigas de asiento y las reparaciones de los accesos tanto de lado de Mallorquín y lado San Cristóbal.

A continuación, se deja constancia de las precipitaciones registradas en el mes de Marzo/2024 y las imágenes que respaldan los trabajos mencionados:

MOP y C * DIRECCION DE CAMINOS VECINALES *

RECIBIDO
DCV - MOPC
Fecha: 30 MAY 2024 Hora: 15:03
Firma: Estilla Chamorro

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) Marzo 2024

Días	Cantidad (mm)
1	5,00
2	0,00
3	0,00
4	0,00
5	50,00
6	0,00
7	0,00
8	0,00
9	0,00
10	0,00
11	0,00
12	0,00
13	0,00
14	0,00
15	0,00
16	0,00
17	28,00
18	5,00
19	0,00
20	0,00
21	0,00
22	40,00
23	0,00
24	0,00
25	0,00
26	0,00
27	0,00
28	0,00
29	0,00
30	0,00
31	0,00
Total	128,00

Ing. Civil Luis Fernando Rotela
Asistente de Residente

Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com

13 (trece)

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

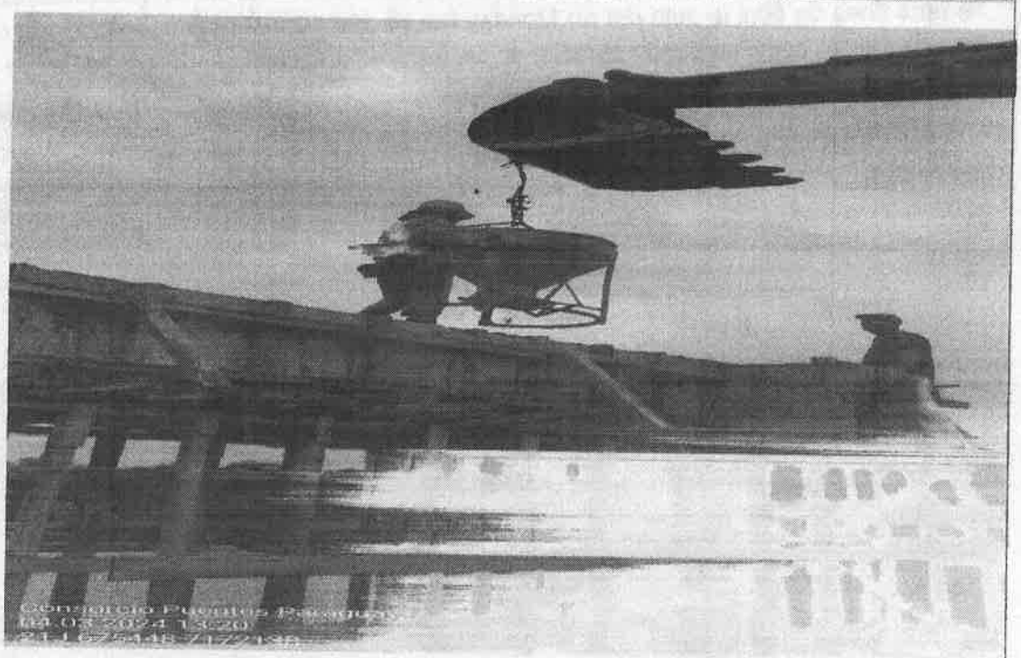

En el mes de abril se realizaron trabajos de acopio de Piedra Bruta en el acceso del lado Mallorquín con proyecciones a ejecutar las protecciones con enrocado en las pilas.

Dichas actividades se interrumpieron debido a las grandes lluvias registradas desde el 8 de abril y a partir de esta fecha ya no se tuvieron actividades en zona de obra, se adjuntan las precipitaciones registradas en el mes de abril.

REGISTRO DE PRECIPITACIÓN DIARIA (mm) Abril 2024

Días	Cantidad (mm)
1	0,00
2	0,00
3	0,00
4	0,00
5	0,00
6	0,00
7	0,00
8	30,00
9	0,00
10	0,00
11	80,00
12	0,00
13	20,00
14	0,00
15	30,00
16	60,00
17	0,00
18	0,00
19	0,00
20	0,00
21	0,00
22	0,00
23	0,00
24	35,00
25	0,00
26	0,00
27	0,00
28	0,00
29	0,00
30	0,00
31	0,00
Total	255,00

Ing. Civil Luis Fernando Rotela
Asistente de Residente

Ing. Adrian Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

Ya para fines de abril la cota del río Monday fue de 196,10 metros inundando toda el área de trabajo como se puede apreciar en las fotos adjuntadas.

El acceso por lado Mallorquín solo se puede realizar con vehículos livianos debido a que la alcantarilla de la progresiva 10+000 ha sido debilitada en su totalidad.

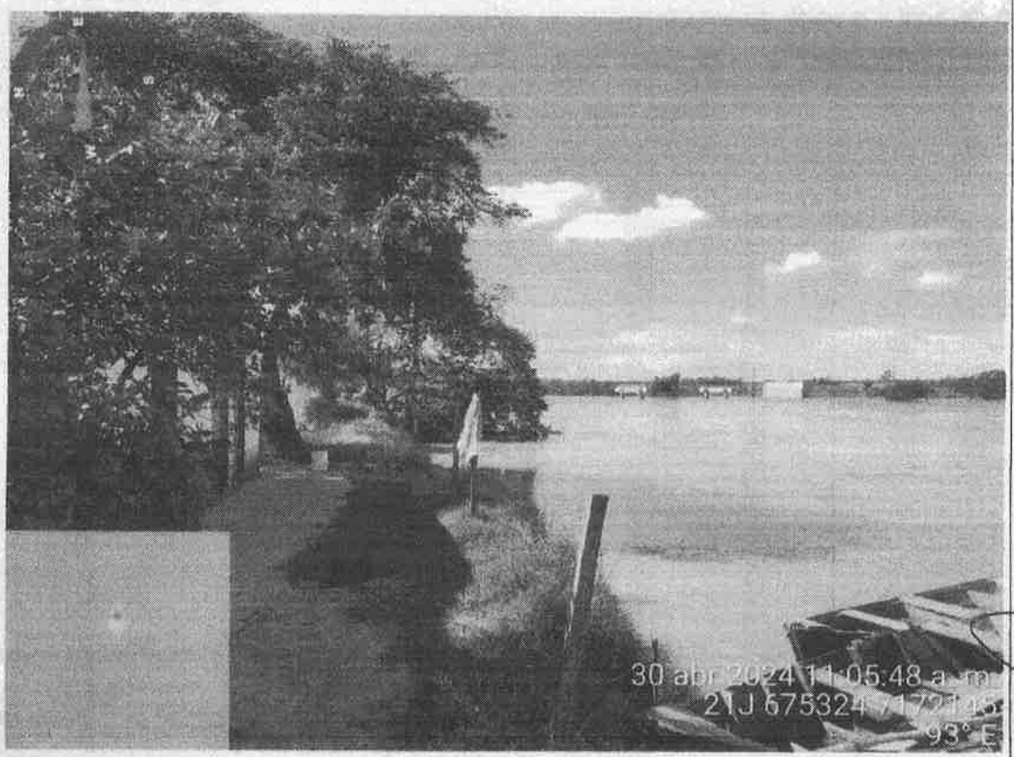

Ing. Adrián Sclav
Consorcio
Puentes Py.

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

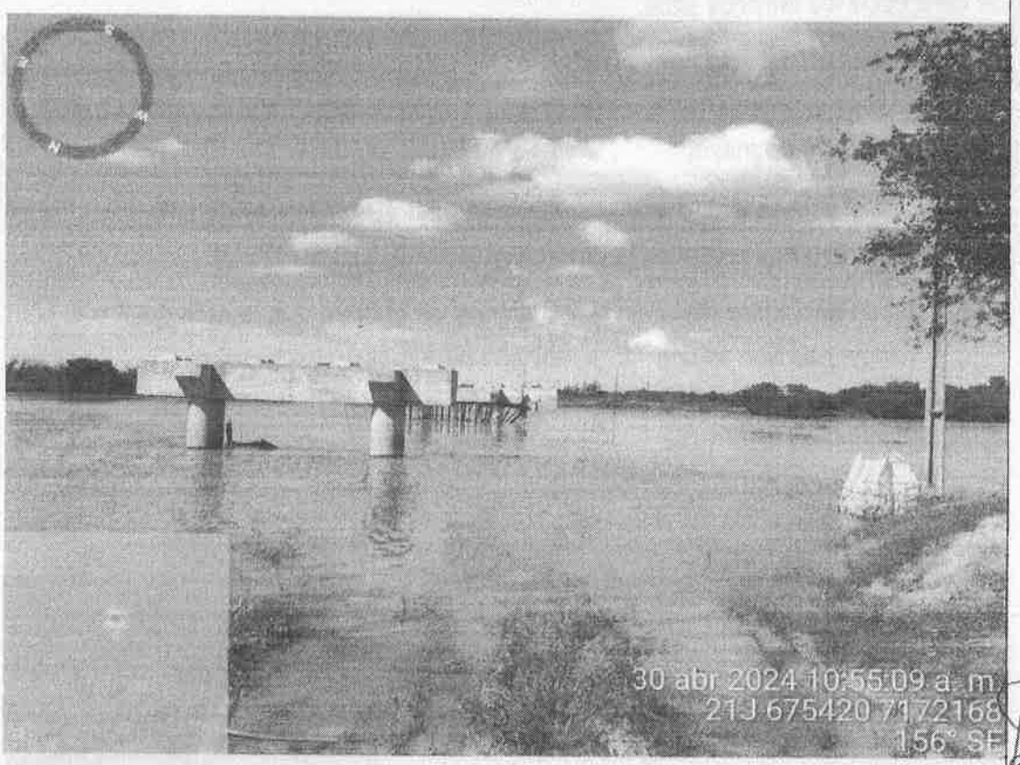

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

En el mes de Mayo siguieron las lluvias y la cota del Rio Monday fue aumentando obligando a los encargados de obras evacuar las maquinarias y herramientas de zona de obra hacia los terrenos altos.

La cota alcanzada en esta nueva crecida es de 196,90 metros. Ya no se puede acceder con vehículos hasta zona de obra sino solo en canoa o lancha. La evacuación se produjo en la fecha del 10 de mayo.

También en el acceso desde lado Mallorquín se destruyeron dos alcantarillados. Una en la progresiva 8+000 y la otra en la progresiva 10+000.

A la fecha se encuentra sin actividades la zona de obra ya que la cota del Rio si bien está disminuyendo aún se considera muy alta para realizar los trabajos.

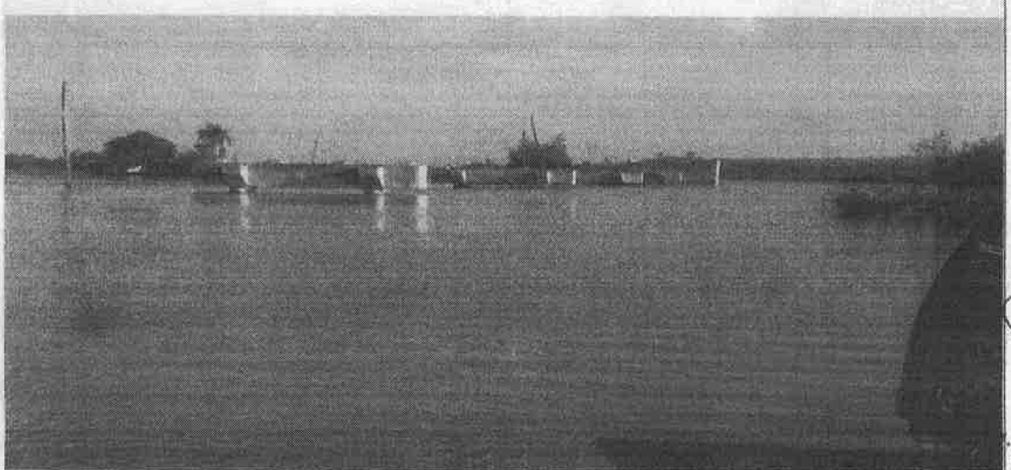

Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

J. Martín Selavi
Consorcio
Puentes Py.

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

A la fecha estas son las fotos actualizadas al día 26 de mayo. Las fotos son tomadas por el encargado de la seguridad del puente que se encuentra siempre en la zona.

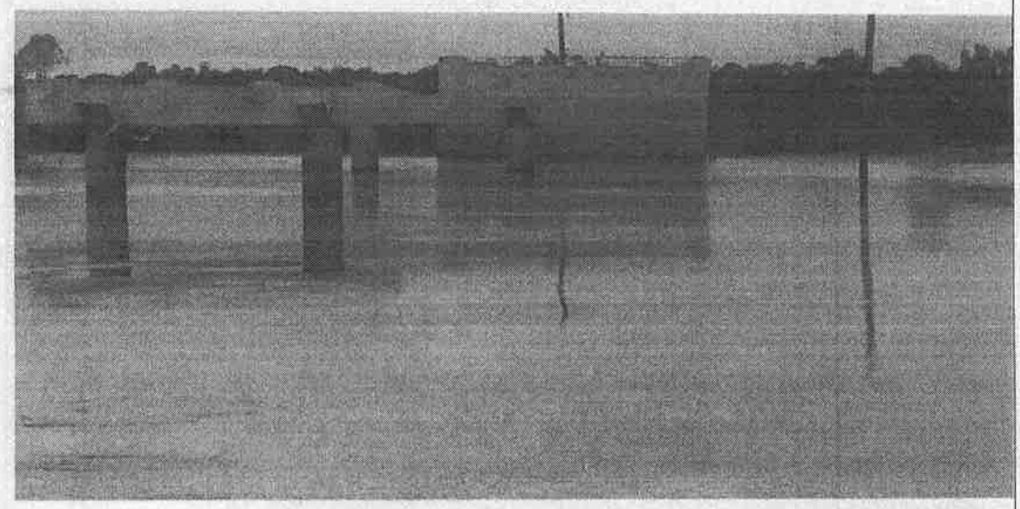

Ing. Adrián Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com

CONSORCIO PUENTES PARAGUAY
Avda. Aviadores del Chaco 2050
Edificio World Trade Center, Torre 3, Piso 10
Asunción, Paraguay - Teléfono: +595 21 604 798

Sin otro particular, le expreso mi cordial saludo.

Ing. Adrián Sclavi
Representante Legal
CONSORCIO PUENTES
PARAGUAY

+ Se Adjunta Imágenes del Libro de Obras Páginas 101 al 109

Ing. Adrian Sclavi
Consorcio
Puentes Py.

Contacto:
Lic. Clara Turo Cel. 0981 587 005 Correo: cturo@saceem.com
