113 (ciento trece)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

Viceministerio de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social

Asunción, 14 de marzo de 2024

VAISBS N° 191/2024

Señora
MSC. ARQ. LETICIA M. HERREROS CATALDI, COORDINADORA
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en el marco del contrato S.G. Ministro N° 350/2021, suscrito entre el MOPC y el Consorcio Hospitalario del Sur para la ejecución del **"LLAMADO MOPC N° 55/2021 "LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR"** – ID 399.277.

Al respecto, a fin de responder la Nota UEP IP N° 71/2024 de fecha 26 de febrero de 2024, **SIMESE N° 44.661/2024**, en la cual solicita el parecer de esta cartera sanitaria en relación a las observaciones y planteamientos a modo de propuestas con mínimas intervenciones, con el objetivo de lograr la mayor optimización funcional de las áreas de UTI y Quirófanos.

En respuesta a lo solicitado se adjunta los siguientes documentos:

- ✓ Nota D.R.F./DGAF N° 0384/2024 de fecha 14 de marzo de 2024.
- ✓ Memorándum del Departamento de Diseños y Proyectos – D.R.F. de fecha 08 de marzo de 2024 con expediente N° 357/2024 ingresado a la Coordinación Técnica – D.R.F.

Hago propicia la ocasión para saludarle ~~muy atentamente~~.

Dr. Miguel Olmedo Leites, Viceministro
Viceministerio de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Simese 44661/24

Remitir al Consorcio para
C.C. Fiscalización
Supervisión

14.03.24
Msc. Arq. Leticia M. Herreros Cataldi
COORDINADORA
Unidad Ejecutora de Proyectos - IP
VMOP - MOPC

112.-(ciento doce)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

PARAGUAI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

Secretaria General - Mesa de Entradas

Simese Nro: 44661 - / 2024

Fecha de Doc.: 14/03/2024 - Hora: 09:00

Remitente: MSC. ARQ. LETICIA M. HERREROS CATALDI, COORDINADORA UEP IP-VMOPC-MOPC

Dependencia: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

P/VAISBS - NOTA UEP IP 71/2024 - RE. LLAMADO MOPC 55/21: LPN P/ EL DISENO Y CONSTRUCC. DEL GRAN HOSP. DEL SUR - ID 399277 - PROPUESTAS DE READECUACIONES FUNCIONALES DE AREAS DE UTI Y QUIROFANOS GHS Y CONSTRUCC. DE CASETAS DE RESIDUOS - ADJ. RESPALDOS.

Recibio: RODOLFO JAVIER ROJAS

-1 P/ VAIS. DRF NOTA 384/2024 ECON. VICTOR BERNAL. RTE. DOCUMENTACIONES A LOS EFECTOS CORRESPONDIENTES.

Recibio: VICTOR CABALLERO Fecha: 2024-03-14 Hora: 15:31

Recibido por: **Fecha:** **Hora:**

Remitido a:

☐ SECRETARIA GENERAL	☐ VICEMINISTERIO RECTORIA Y VIGILANCIA DE LA SALUD	☐ D.G. GABINETE
☐ SECRETARIA PRIVADA	☐ DGVS	☐ ASESORIA TECNICA
☐ DG ANTICORRUPCION	☐ DGC PROFESIONES	☐ ASESORIA TECNICA / ENLACE PARLAMENTARIO
☐ DG AUDITORIA	☐ INAN	☐ ASESORIA JURIDICA
☐ DG COMUNICACION	☐ SENASA	☐ D PROTOCOLO
☐ DG RR II	☐ DIGESA	☐ SEC EJECUTIVA
☐ DNERHS	☐ INAT	☐ GESTION ADMINISTRATIVA
☐ DGPE	☐ SENEPA	☐ DIRECCION CALIDAD
☐ INS	☐ DG PROMOCION SALUD	☐ DPTO.SEGURIDAD
☐ INE/ENF Y OBSTETRICIA	☐ DINASAPI(INDIGENAS)	☐ DPTO.TRANSPORTE
☐ DGAJ	☐ LCSP	☐ UEP/BM
☐ DGRRHH	☐ DG DESCENTRALIZACION	☐ COORD. GRAL. DE PROYECTOS
☐ DIGIES	☐ VICEMINISTERIO ATENCION INTEGRAL A LA SALUD	☐ UNIDAD DE ASUNTOS LINGUISTICOS
☐ DGAF	☐ DGDRS	☐ OTROS
☐ DGTIC	☐ DIRECCION DE TERAPIAS INTENSIVAS	
☐ DINAVISA	☐ DGGIES	☐ DIRECCION DE R. LABORALES
☐	☐ IBS	☐
☐	☐ DG PROGRAMAS SALUD	☐
☐	☐	☐

RECIBIDO
14 MAR. 2024
Viceministerio de la Atencion Integral de la Salud y Bienestar Social

16:10

OBS: _____

111 (ciento once)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

NOTA D.R.F./DGAF Nº 0384/2.024

Asunción, 14 de MARZO de 2.024

SEÑOR
DR. MIGUEL OLMEDO, Viceministro
Vice Ministerio de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Tenemos el honor de dirigirnos a Usted, en el marco del ***Llamado MOPC N° 55/2021 "Diseño y Construcción del Gran Hospital del Sur – Encarnación"*** y en atención a la **NOTA UEP IP N° 71/2024** a través de la cual la UEP IP -VMOPC – MOPC, remite Planos con propuestas de readecuación en las áreas de UTI y Quirófanos realizadas previo análisis funcional.

Al respecto, se remite adjunto **MEMORÁNDUM** elaborado por el Departamento de Diseños y Proyectos/DRF, a través del cual se informa que una vez verificadas las documentaciones presentadas y luego de reunión mantenida con representantes de la Dirección de Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, se han realizado nuevos ajustes a la propuesta remitida.

Se adjuntan para los efectos correspondientes:

1) Copia de Acta de Reunión
2) Plano impreso ajustado en reunión, se menciona que solo va un plano porque los demás ya han sido entregados a la Arq. Fátima Núñez.
3) Copia de la Nota D.T.I. N° 93/2024 por medio de la cual se otorgan visto bueno a las modificaciones propuestas, con la salvedad de que se realizaran visitas continuas a la obra y que podrían surgir otros requerimientos funcionales con el correr del tiempo.
4) Copia de Informe de Evaluación de la DESAyTS.

Sin otro particular, le saludamos atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCION DE RECURSOS FISICOS D.G.A.F.

ING. FERNANDO SANABRIA
Director
Dirección de Recursos Físicos

ECON. VICTOR BERNAL
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
SIMESE Nº 44661 FECHA: 14/03/2024
HORA: 15:31 FUNC. RESP.

Víctor Caballero
Dpto. Mesa de Entrada
Secretaría General

SIMESE Nº 44.661/2024
ME CT N° 357/2024

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUAI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY PARAGUÁI REKUÁI

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

MEMORANDUM

A	:	ARQ. CYNTHIA SUGASTTI – COORDINACIÓN TÉCNICA. DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.
DE	:	ARQ. KAREN BANKS – JEFA DEPARTAMENTO DE DISEÑOS Y PROYECTOS –D.R.F
REF	:	LLAMADO MOPC Nº 55/2021 "DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR - ENCARNACIÓN"-ID Nº 399277.
FECHA	:	08 DE MARZO DE 2024.

EXPEDIENTE: SIMESE Nº44661/2024.
SOLICITANTE: MSC. ARQ. LETICIA HERREROS CATALDI. COORDINADORA. UEP IP-VMOPC-MOPC.
SOLICITUD: PROPUESTAS DE READECUACIONES FUNCIONALES DE ÁREAS DE UTI Y QUIRÓFANOS GHS.

Me dirijo a Ud. y por su intermedio a quien corresponda en atención al llamado de referencia y en consideración a Nota UEP IP Nº71/2024 a través de la cual se remiten Planos con propuesta de readecuaciones en las áreas de UTI y Quirófanos realizadas previo análisis funcional.

Una vez verificada la documentación remitida y luego de reunión mantenida el día de la fecha con representantes de la DESATS y del MOPC, se han realizado nuevos ajustes a la propuesta remitida; para efectos se adjunta:

- Copia de Acta de Reunión.
- Plano impreso ajustado en reunión, se menciona que solo va un plano porque los demás ya han sido entregados a la Arq. Fátima Nuñez el día de la fecha para efectos.
- Copia de NOTA D.T.I. Nº93/2024 por medio de la cual otorgan visto bueno a las modificaciones propuestas con la salvedad de que se realizarán visitas continuas a la obra y que podrían surgir otros requerimientos funcionales con el correr del tiempo.
- Copia de Informe de Evaluación de DESATS.

Sin otro particular nos despedimos.

Atentamente

C.c. al Dpto. de Fiscalización.

08-03-2024

COORDINACIÓN TÉCNICA
16:00 357/24
08 - III - 24

A Secretaría p/ remitir a DGAF y p/ su intermedio al Vice Ministerio

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.
08/03/24

SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS D.G.A.F.

44661/2024

RECIBIDO
08 MAR. 2024
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

DRF

Brasil esq Pettirossi
Teléfono 021 237 4307
drfisicos@gmail.com

109 (ciento nueve)

ACTA DE REUNION

TEMA: PROPUESTA DE READECUACIONES DE LAS AREAS DE UTI, QUIROFANOS Y ESTERILIZACION

REFERENCIA-NOTA: M. E. N°: 0410/2024 Ref. Nota DRF/DGAF N° 0345/2024
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: GRAN HOSPITAL DEL SUR
LOCALIDAD: ENCARNACION - ITAPUA

LUGAR DE LA REUNION: DIRECCION DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, AFINES Y TECNOLOGIA SANITARIO - MSPBS

FECHA: 08 DE MARZO DE 2024.-

HORA: 8:30 A 12:00

PARTICIPANTES:

ARQ. OLGA LOPEZ	DESATS - MSPBS
ARQ. NORMA OSORIO	DESATS - MSPBS
ARQ. KAREN BANKS	DRF/DGAF - MSPBS
ARQ. FATIMA NUÑEZ	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

ACUERDOS ESTABLECIDOS:

UTI NEO

1- Descripción de cuarto séptico: Contará con dos áreas: La de acceso con área de lavado (bacha profunda de acero inoxidable). Un área cerrada con válvula de descarga o inodoro alto. Terminaciones acordes a la función (lisas, impermeables y ventilación apropiada. Pudiendo utilizarse medios mecánicos) La puerta del área de descarga debe abrir hacia adentro de esa área. Así también la que da al exterior; manteniendo el criterio de "limpio a sucio" en las aperturas.
2- Eliminar inodoros en áreas que no corresponden: ejemplo: cuarto de limpieza, depósito de ropa sucia, depósito de residuos sólidos, pre lavado de instrumentos y material usado.
3- Lavado de instrumentales debe tener doble bacha profunda y mesada
4- Cuartos de limpieza/ aseo: Opción 1: Canilla pico manguera + desagüe sifonado + pileta tipo fregadero de inox. Opción 2: Pileta de inoxidable o material impermeable baja con doble rejilla (una que sirva de barrera) y canilla pico manguera.
5- En los cuartos de lavado de instrumentales y todas las bachas dobles, se debe considerar grifería independiente en cada compartimiento de la bacha.
6- Depósito de residuos, cuarto séptico, cuarto de aseo, deben tener RPS.
7- Lactario pasa a ser Sala de lactancia. Se elimina bacha de inox. Se mantienen lavamanos y mesada.

UTI PED Y ADULTOS

1- Eliminar inodoros, bachas y mesadas de las áreas siguientes: Depósito de ropa limpia, depósito de materiales e insumos y Depósito de equipos e instrumental.
2- Sectorizar ropa sucia de adultos y pediátricos
3- Cuarto de limpieza: Considerar lo mismo que se describe en NEO

F.R. MORENO Y BRASIL
estasaludmspbs@gmail.com

ASUNCIÓN-PARAGUAY
TELEFONO: (0961) 930438

Arq. Olga López F.
D.E.S.A.T.S. M.S.P.B.S.

ARQ. KAREN BANKS
JEFA DEL DPTO. DE DISEÑOS Y PROYECTOS
DIRECCION DE RECURSOS FÍSICOS
MSP Y BS

Arq. Norma Osorio Benítez
Dirección de Establec... Salud, Afines
y Tecnología ... MSP

108 (ciento ocho)

4- Lavado de instrumentales. Mismo criterio de NEO
5- Cuarto séptico: Mismo criterio de NEO
6- Generar depósito de residuos. Teniendo en cuenta la RPS necesaria, se puede plantear subir el nivel en dicho sector.
7- Respetar los criterios establecido para cada área de apoyo

QUIEROFANOS GENERALES

1- Se genera la comunicación del pasillo contaminado con los servicios contaminados
2- Los servicios de apoyo contaminados, deben respetar los criterios ya mencionados anteriormente
3- Se elimina una sala de estar de médicos y se genera una sala de lavado de instrumentales con 2 conjuntos de dobles bachas (por el volumen de instrumentales que se manejan)
4- Se utiliza parte de la esclusa del quirófano oftalmológico para generar depósito de residuos sólidos.
5- SE UNIFICAN entrada de pacientes y sala de informes.
6- Se replantean como depósitos limpios las salas indicadas en el plano
7- Se cambia nombre: Lavados de equipos a depósitos de equipos

ESTERILIZACION

1- Agregar ducha lavaojos en sala de máquina de óxido de etileno
2- Generar ventana de paso entre sala de venteo de óxido de etileno al área de almacenamiento.
3- Generar ventana de paso en sala de esterilización por plasma al área de almacenamiento
4- Generar ventana de paso en sala de esterilización por vapor al área de almacenamiento, o verificar equipo autoclave de doble puerta.
5- Generar espacio cerrado para el área de esterilización a vapor. Ajustar área de preparación y empaque

QUIROFANOS GINECO OBSTETRICOS

1- Se retoma al proyecto original de los quirófanos del área gineco-obstetrica. Ampliar
2- Se sectoriza circulación contaminada
3- Se desplaza el transfer de pacientes
4- Para las áreas de apoyo que se encuentran en el sector, considerar las mismas observaciones que se mencionan más arriba.
5- Cuarto séptico del área de quirófanos, elimina una puerta, se ajusta.
6- Sala técnica: Se modifica puerta

General: Farmacias internas de UTI Y QUIROFANOS, deben cambiar de nombre a DEPOSITOS de insumos y medicamentos.

ARQ. KAREN BANKS
JEFA DEL DPTO. DE DISEÑOS Y PROYECTOS
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
MSP Y BS

Arq. Fatima Nuñez.

Arq. Norma Osorio Barrios
Dirección de Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria - MSP y BS

Arq. Olga López F.
D.E.S.A.T.S. M.S.P.B.S.

107 (ciento siete)

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY

PARAGUAI TESÁI HA TEKO PORÁVE MOTENONDEHA

DIRECCION TERAPIAS INTENSIVAS

NOTA D.T.I. Nº 93 /2024

Asunción, 06 de marzo de 2024

RECIBIDO 06 MAR. 2024 DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

Señor
ING. FERNANDO SANABRIA, DIRECTOR
Dirección de Recursos Físicos / DGAF
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Presente.

Me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda, a fin otorgar el visto bueno a las modificaciones propuestas en la Nota MC/10/2024 con SIMESE Nº44661/2024, con la salvedad de que se realizarán visitas continuas a dicha obra y que podrían surgir otros requerimientos funcionales con el correr del tiempo.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.

DR. ANGEL NUÑEZ
DIRECTOR
DIRECCION DE TERAPIAS INTENSIVAS

44661/2024

RECIBIDO 06 MAR 2024 DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

A Diseños y Pro a sus efectos

06-03-24
Ing. Fernando Sanabria
Director
Dirección de Recursos Físicos-DGAF
M.S.P. y B.S.

COORDINACIÓN TÉCNICA
D.R.F.
ENTRADA Nº 357/24
07-III-24
FOR:

106 (ciento seis)

Asunción, 08 de marzo de 2024.-

INFORME DE EVALUACIÓN

M. E. Nº 0410/2024 Ref. Nota DRF/DGAF Nº 0345/2024
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: GRAN HOSPITAL DEL SUR
LOCALIDAD: ENCARNACION - ITAPUA

INFORME TÉCNICO PRELIMINAR

La propuesta de re-funcionalización presentada cumple requisitos funcionales.

- ***Este análisis corresponde exclusivamente al aspecto funcional de los planos presentados.***
- ***En inspección se verificarán si los planos corresponden a lo presentado y si los aspectos físicos son adecuados.***
- ***Los aspectos jurídicos, médicos, químicos, biológicos y tecnológicos no se analizan en este informe.***
- ***Este informe no implica aprobación de planos ni habilitación del establecimiento.***

Arq. Olga López F.
D.E.S.A.T.S. M.S.P.B.S.

RESPONSABLES DEL INFORME

Arq. Luis Velázquez Seiferheld
Director General
Dirección de Establecimientos y Establecimientos

DIRECCIÓN

PLAZO DE ADECUACIÓN	No Aplica.-
FECHA ENTREGA DE INFORME	08 – 03 -2024
FIRMA PROPIETARIO	

105 (ciento cinco)

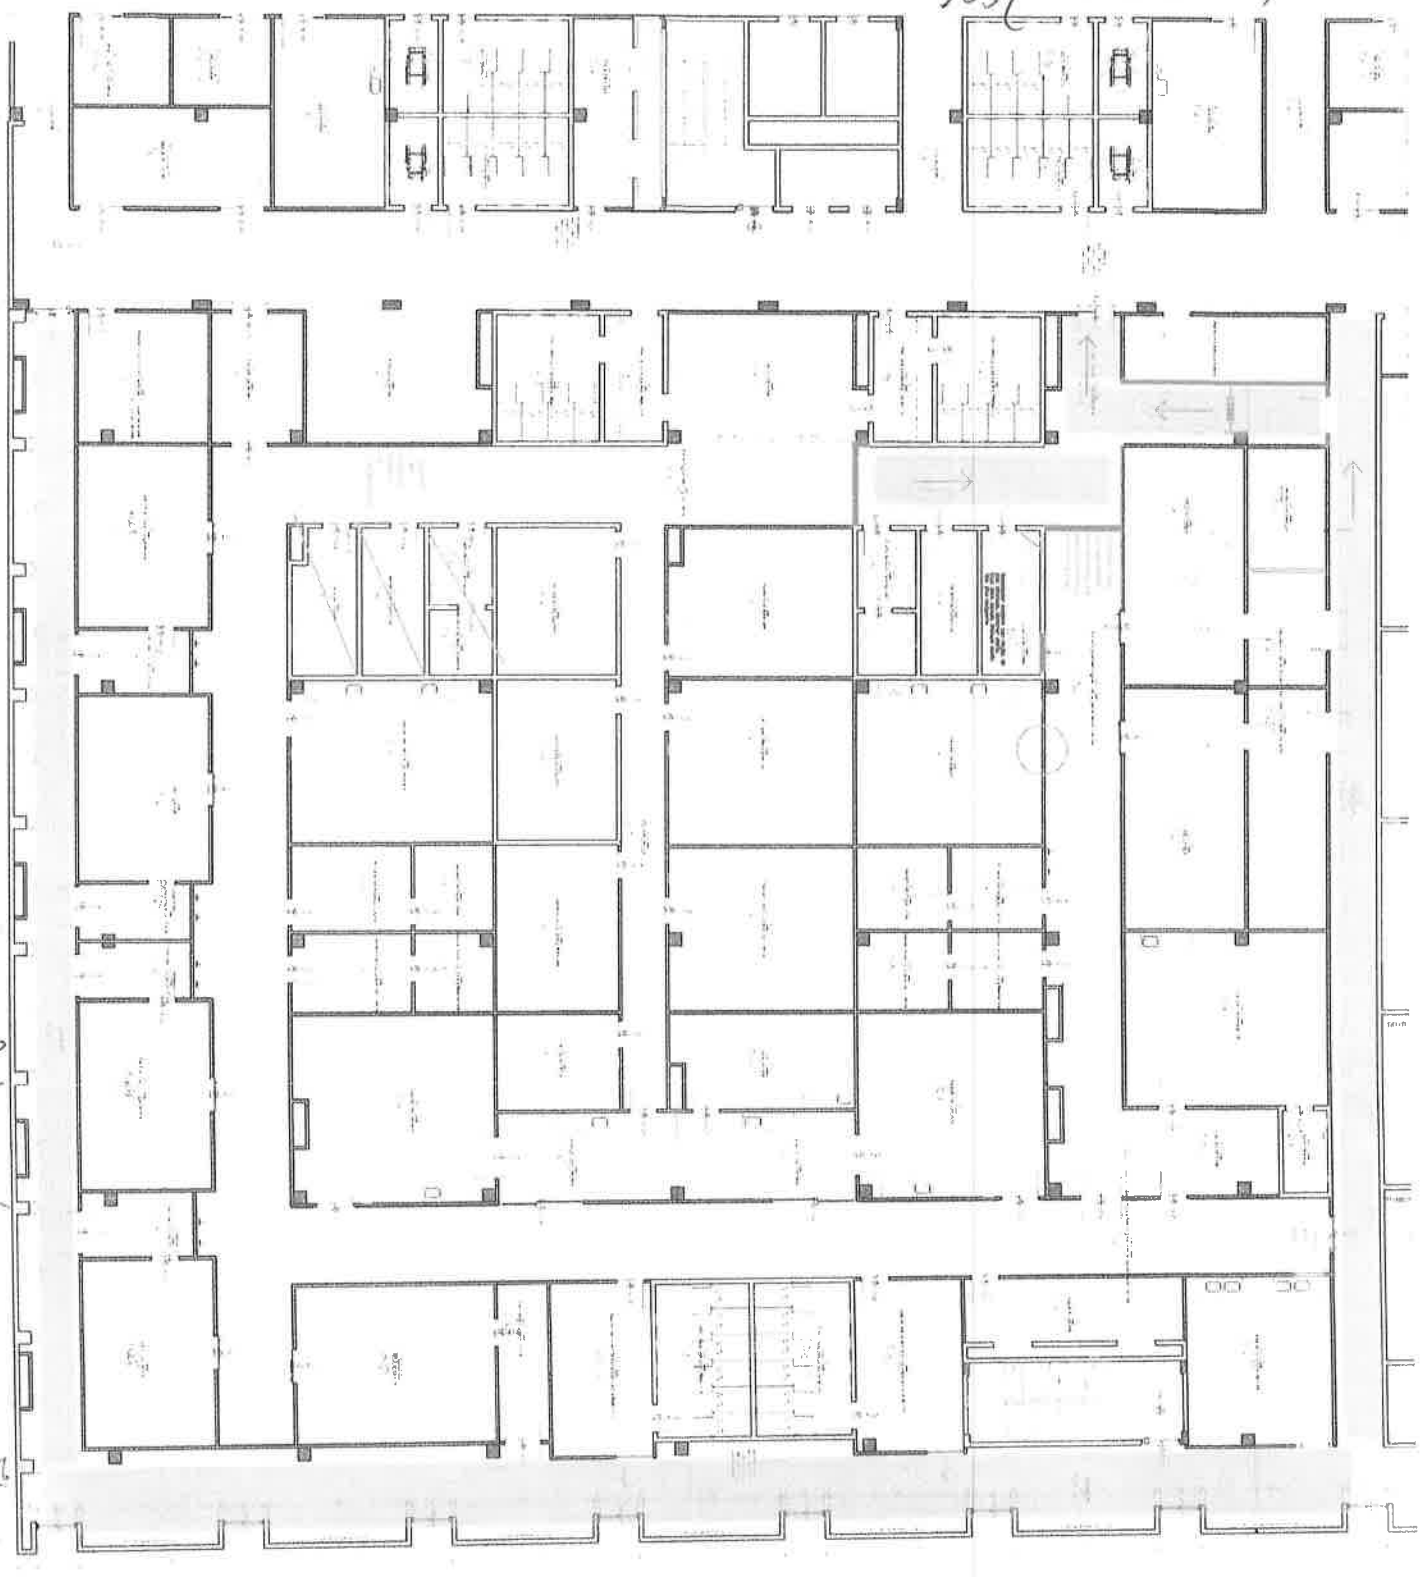

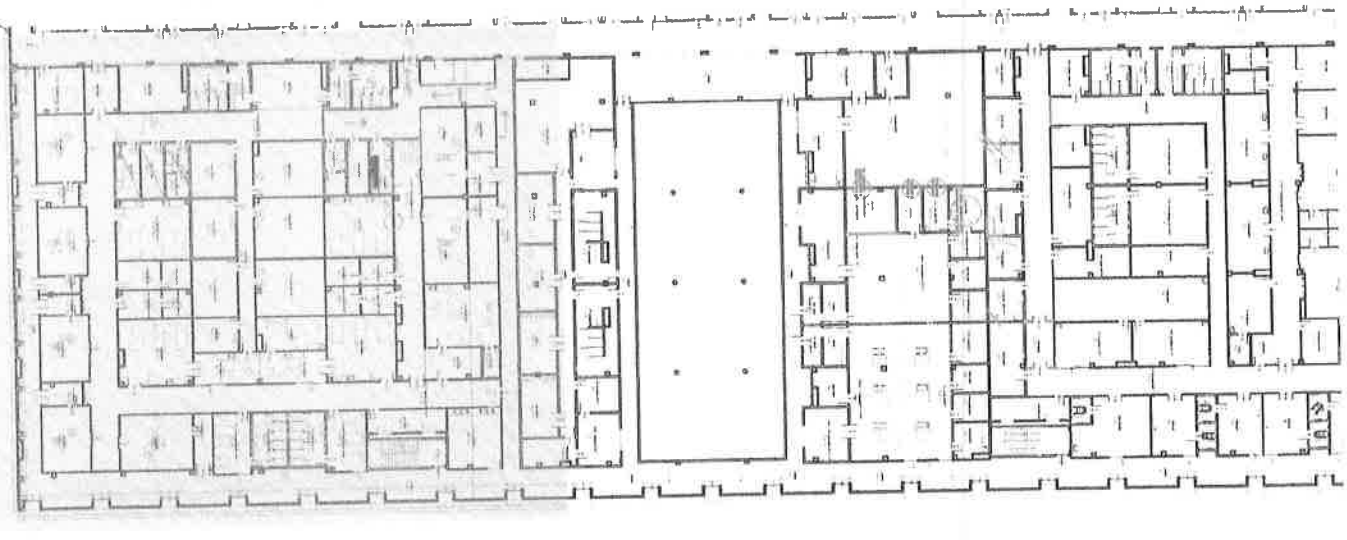

UBICACION

Arq. Olga López F.
D.E.S.A.T.S. M.C.P.E.S.

ARQUIKAREN BANKS
DIRECTOR DE DISEÑOS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

104 (CIENTO CUATRO)

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

Simese Nro: 44661 - / 2024

Fecha de Doc.: 28/02/2024 - Hora: 09:00

REFERENCIA: Simese

Remitente: MSC. ARQ. LETICIA M. HERREROS CATALDI, COORDINADORA UEP IP-VMOPC-MOPC

Dependencia: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC)

P/VAISBS - NOTA UEP IP 71/2024 - RE. LLAMADO MOPC 55/21: LPN P/ EL DISEÑO Y CONSTRUCC. HOSP. DEL GRAN. DEL SUR - ID 399277 - PROPUESTAS DE READECUACIONES FUNCIONALES DE AREAS DE UTI Y QUIROFANOS GHS Y CONSTRUCC. DE CASETAS DE RESIDUOS - ADJ. RESPALDOS.

Recibio: RODOLFO JAVIER ROJAS

SE RECIBE NOTA UEP IP 71/2024 - RE. LLAMADO MOPC 55/21: LPN P/ EL DISEÑO Y CONSTRUCC. HOSP. DEL GRAN. DEL SUR - ID 399277 - PROPUESTAS DE READECUACIONES FUNCIONALES DE AREAS DE UTI Y QUIROFANOS GHS Y CONSTRUCC. DE CASETAS DE RESIDUOS - ADJ. RESPALDOS

Recibio: DIEGO ADRIAN FRANCO APONTE Fecha: 2024-02-28 Hora: 14:02

Recibido por: **Fecha:** **hora:**
Aclaración:
Sello:

Remitido a:
/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/_____/

- ☐ DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
- ☐ DIRECCION FINANCIERA
- ☐ DIRECCION ADMINISTRATIVA
- ☐ DIRECCION DE PRESUPUESTO
- ☐ DEPARTAMENTO DE ASESORIA JURIDICA
- ☐ UNIDAD LOGISTICA INTERNACIONAL
- ☐ OTROS
- ☐ DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
- ☐ DIRECCION DE CONTABILIDAD
- ☑ DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
- ☐ DIRECCION DE GESTION DE MONITOREO Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
- ☐ UNIDAD DE GESTION DEL PERSONAL
- ☐ UNIDAD DE CONTROL TECNICO ADMINISTRATIVO

OBS: A su atención

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS
D.G.A.F.

Al Dpto de Diseño
P/ su atención

MsC. Arq. Cynthia Sugastti
Coordinadora Técnica
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

COORDINACIÓN TÉCNICA
UEP
MESA DE ENTRADA N° 357/24
FECHA 29-02-24
RECIBIDO POR

RECIBIDO
44661/24
29 FEB. 2024
DIRECCION DE RECURSOS FISICOS

Asistente Administrativo
Dirección de Recursos Físicos
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUAI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

103 (CIENTO TRES)

GOBIERNO DEL PARAGUAY

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

VICEMINISTERIO DE ATENCION INTEGRAL A LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

EXP SIMESE N°: 44661/24

SE REMITE A:

☐ DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE SERVICIOS Y REDES DE SALUD	☐ DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA EN SALUD – DIGIES (LIC. TULLO)	☐ DIRECCIÓN NACIONAL ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD
☐ DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD	☐ DIRECCIÓN GENERAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD	☐ INSTITUTO NACIONAL DE ABLACIÓN Y TRASPLANTES - INAT
☐ DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE SALUD	☐ DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN	☐ INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN - INAN
☐ INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL - IBS	☐ DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – DGTIC	☐ DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
☐ DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE	☐ DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN EN SALUD	☐ INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
☐ ASESORIA TECNICA DE GABINETE	☐ DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA	☐ INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS
☐ SECRETARÍA GENERAL	☐ DIRECCIÓN GENERAL DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA	☐ SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL - SENASA
☐ VICEMINISTERIO DE RECTORIA Y VIGILANCIA DE LA SALUD	☐ DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA INTERNA	☐ DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTO Y TECNOLOGÍA DE LA SALUD
☐ DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	☐ DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DINAVISA	☐ PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE
☐ CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE (CENSSA)	☐ RED NACIONAL DE LABORATORIO	☒ DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
☐ SERVICIO DE EMERGENCIA MÉDICA EXTRA HOSPITALARIA (SEME)	☐ LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA	☐ DIRECCION FINANCIERA
☐ DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE HOSPITALES ESPECIALIZADOS	☐ SERVICIO NACIONAL DE ERRADICACION DEL PALUDISMO – SENEPA	☐ DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
☐ DIRECCIÓN DE CORDINACIÓN DE REGIONES SANITARIAS	☐ DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES	☐ INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA

PARA CONOCIMIENTO	☐	CON LA SIGUIENTE PROVIDENCIA:
PARA ANALISIS Y PROPUESTA	☐	
PARA SU ATENCION	☒	
PARA REPRESENTAR	☐	
PARA DESIGNACION	☐	
PARA PARECER TÉCNICO	☐	
PARA TRAMITES PERTINENTES	☐	
ANALIZADO CON EL PARECER FAVORABLE	☐	
VISTO BUENO	☐	
ARCHIVO	☐	
PARA ELABORACION DE NOTA Y/O INFORME	☐	
PARA INFORMAR CONFORME A REQUERIMIENTO	☐	
AGENDAR	☐	
DR. DAVID CARDOZO	☐	
DR. VICTORIANO ACUÑA	☐	
LIC. FANNY SALINAS	☐	
LIC. MALVINA CABALLERO	☐	
LIC. PATRICIA ECHEVERRIA	☐	
SRA. MIRNA DOMINGUEZ	☐	

44661/24

Lic. Diego Fr...

Dr. Miguel Maria Olmedo Leites, Viceministro
Vice Ministerio de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

FECHA: 27/02/2024

102 (CIENTO DOS)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
PARAGUAY

PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA

NOTA UEP IP N° 71/2024

Asunción, 26 de febrero del 2024

Su Excelencia
Dr. MIGUEL M. OLMEDO, Viceministro
VICEMINISTERIO DE ATENCION INTEGRAL A LA SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Presente

REF.: PROPUESTAS DE READECUACIONES FUNCIONALES DE AREAS DE UTI Y QUIROFANOS GHS. y CONSTRUCCION DE CASETAS DE RESIDUOS

Me dirijo a Usted, en el marco del Contrato S.G. Ministro Nº 350/21 - celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Consorcio Hospitalario del Sur para la ejecución del Llamado MOPC Nº 55/21 "Licitación Pública Nacional para el Diseño y Construcción del Gran Hospital del Sur" - ID Nº 399 277.

Al respecto, basándonos en que la ejecución de obra se desarrolla en base a Proyecto aprobado por MSP y BS, el Equipo Técnico de la UEP IP - previo análisis funcional de las Áreas de UTI y Quirófanos - realizan las siguientes observaciones y planteamientos, a modo de propuestas con mínimas intervenciones, con el objetivo de lograr la mayor optimización funcional de dichos sectores, para lo cual se solicita el parecer de la cartera sanitaria en la mayor brevedad posible, bajo la coordinación de la Dirección Gral. de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
SECRETARIA GENERAL
MESA DE ENTRADA
SIMESE N° 44661 FECHA: 27/02/24
HORA: 09:00 FUNC. RESP.
Lic. Rodolfo Rojas
Dpto. Mesa de Entrada
Secretaría General

Sin otro particular, me despido atentamente.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES · UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS · INFRAESTRUCTURA PÚBLICA · V.M.O.P

Msc. Arq. LETICIA M. HERREROS CATALDI
Coordinadora
UEP IP-VMOPC-MOPC

Se adjuntan
Nota MC/10/2024
Planos UTI NEO (1) - UTI PED/AD (1) - QUIROFANOS GRALES (1) - QUIROFANOS GINECO (1)

101 (CIENTO UNO)

NOTA: MC /10/2024

Asunción, 26 de febrero de 2024

Señora
MSC Arq. Leticia Herreros, Coordinadora
UEP Infraestructura Pública – MOPC
Presente

Referencia: Reunión Equipo UEP IP y Representantes del Consorcio GHS
Asunto: Análisis Funcional Área de Quirófano y UTI

Nos dirigimos a usted, en el marco del Contrato S.G. Ministro Nº: 350/2021, entre el Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y el Consorcio Hospitalario del Sur, del Llamado M.O.P.C Nº: 55/21, Licitación Publica Nacional para el Diseño, Construcción y Acceso Vial del Gran Hospital del Sur – ID Nº: 399277.

En referencia a la Reunión realizada conjuntamente con el equipo técnico de la UEP IP y representantes de GHS, previo análisis funcional en las Áreas de UTI Y Quirófanos se realizaron las siguientes observaciones y planteamientos :

Para UTI, se realizan los siguientes planteamientos:

***UTI Neonatal**: Desplazar las esclusas de pacientes.
Separar la circulación del paciente de la zona restringida.
Intercambiar nombres de locales, para concentrar los espacios limpios en la zona blanca.

***UTI Pediátrica y Adulto:**
Uti Pediátrica: Se cierran las puertas de ambientes contaminados que dan al pasillo de circulación de pacientes.
Se genera una nueva esclusa para el paso del área limpia al área sucia.
Uti Adulto: Se eliminan los ambientes de servicios sucios y se comparte el nuevo sector generado con la nueva esclusa (sector compartido entre Uti Pediátrico y Uti adulto)

QUIROFANOS:

***Quirófanos de Cirugías menores**: Se elimina transfer de pacientes, unificando el acceso con el área de quirófanos generales.
Se elimina recepción y control de pacientes de cirugías menores unificándolo con el área de recepción de quirófanos generales
Se genera un pasillo que conecta la circulación sucia con el área de servicio sucio (contaminado).

Fátima Nathalia Núñez Chaparro
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC 3378

Ma. Claudia Ruiz Diaz
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC 3993

100 (CIEN)

NOTA: MC /10/2024

El paquete del cuarto de limpieza, depósito de ropa sucia, cuarto séptico y depósito de residuos sólidos será compartido entre las áreas de cirugía menor y cirugía general.
El paquete de cuarto séptico, depósito de residuos sólidos, depósito de ropa sucia y cuarto de limpieza que se encuentran en zona de acceso de pacientes y médicos deberán re proponerse como áreas no contaminadas.

***Quirófano Ginecobstetricia:**
La esclusa de pacientes se desplaza al final del pasillo de manera a evitar concentrar dentro del área limpia áreas contaminadas.
Se sugiere eliminar **(inodoro/esclusa)** del cuarto de limpieza, depósito de ropa sucia y el área de pre lavado de instrumentos y materiales usados.

***Área de esterilización:**
Se agregan tabiques para separar el área de recepción de ropa sucia del área de entrega.

Se adjuntan los planos correspondientes a las distintas áreas con la re funcionalización de los espacios sugeridos.

Sin otro particular nos despedimos muy atentamente

Arq. Fátima Núñez

Fátima Nathalia Núñez Chaparro
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC 3378

Arq. Claudia Ruiz Diaz

Ma. Claudia Ruiz Diaz
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC 3993

99 (NOVENTA Y NUEVE)

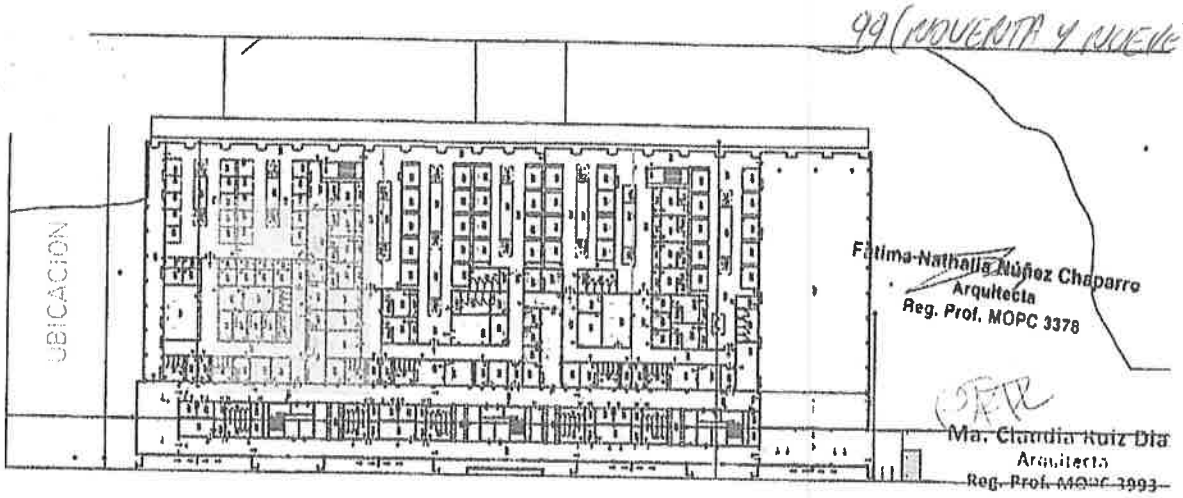

Fátima Nathalia Núñez Chaparro
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC 3378

Ma. Claudia Ruiz Díaz
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC 3993

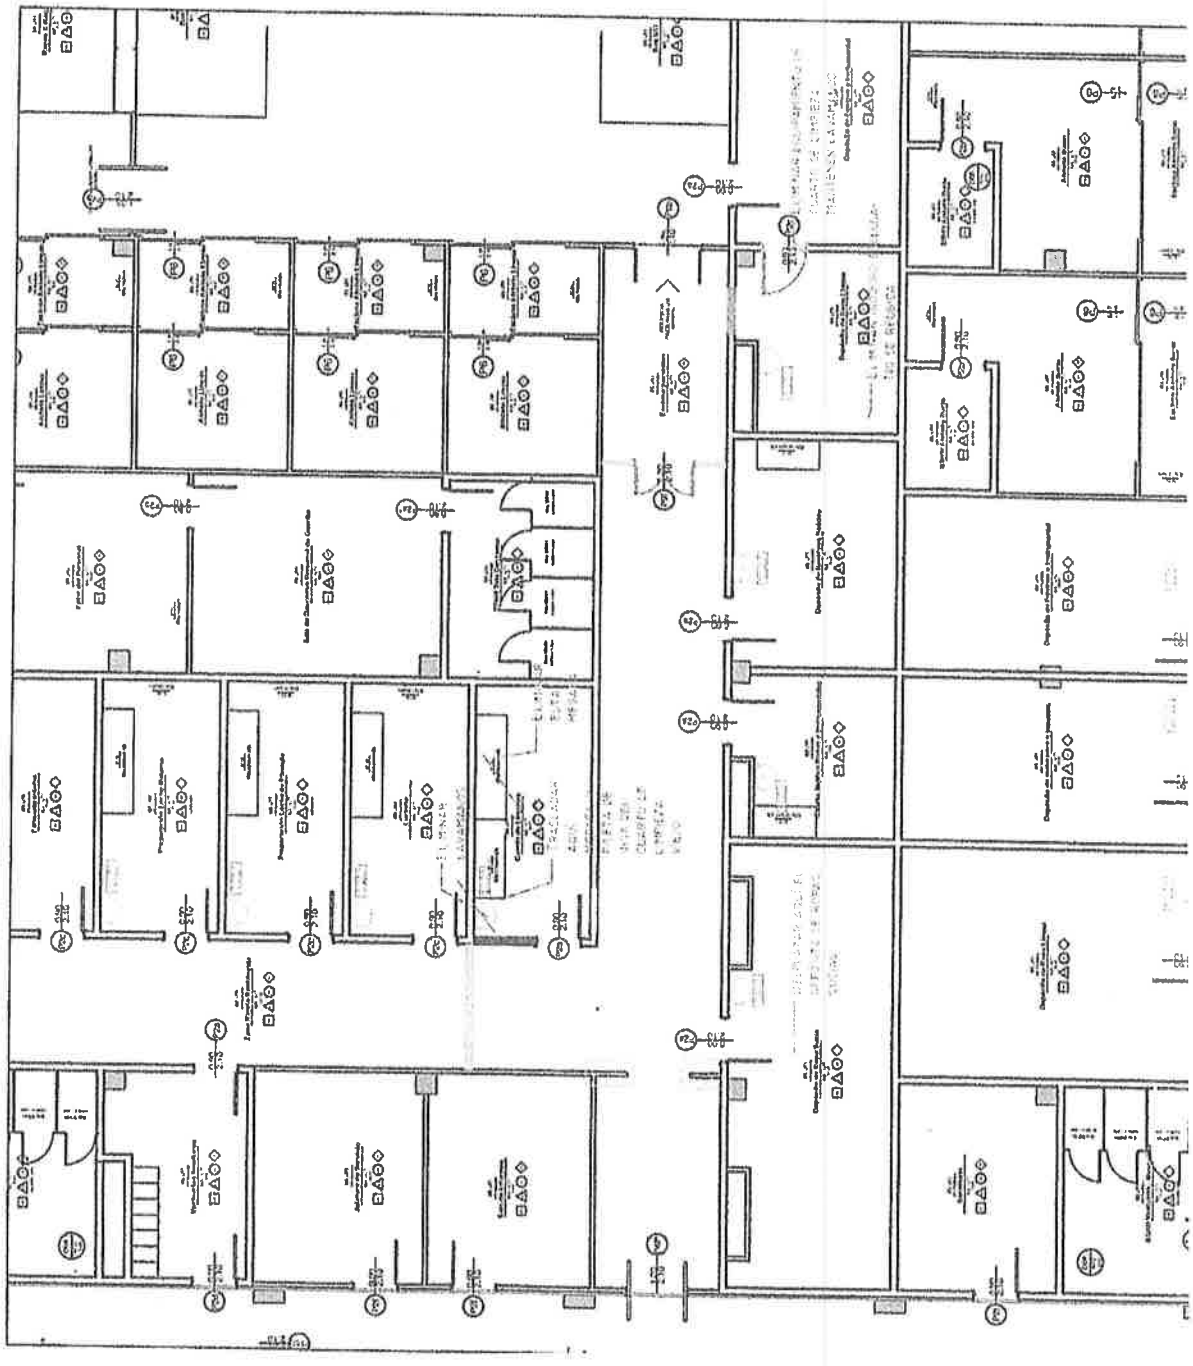

99 (NOVENTA Y OCHO)

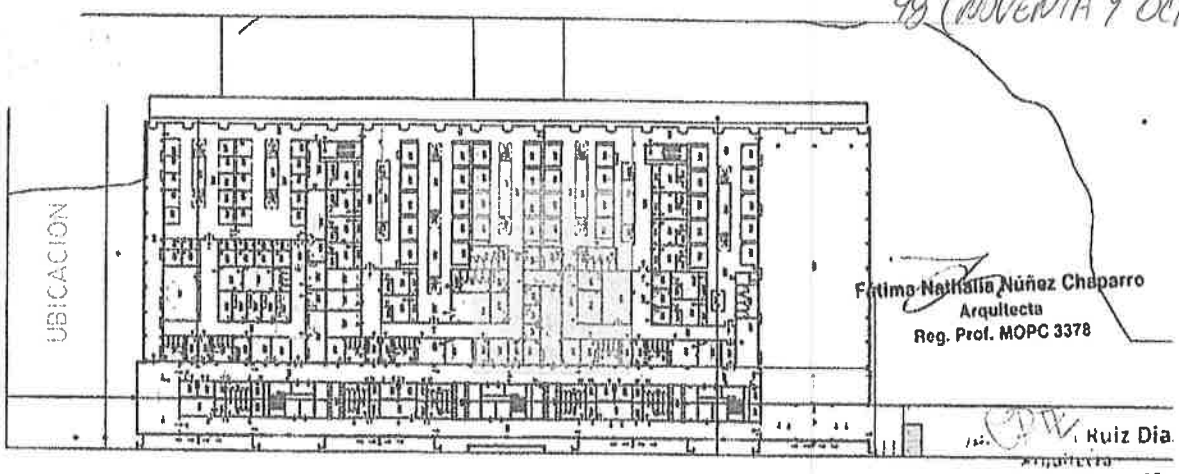

Fátima Nathalia Núñez Chaparro
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC 3378

Ruiz Dia
Reg. Prof. MOPC 3993

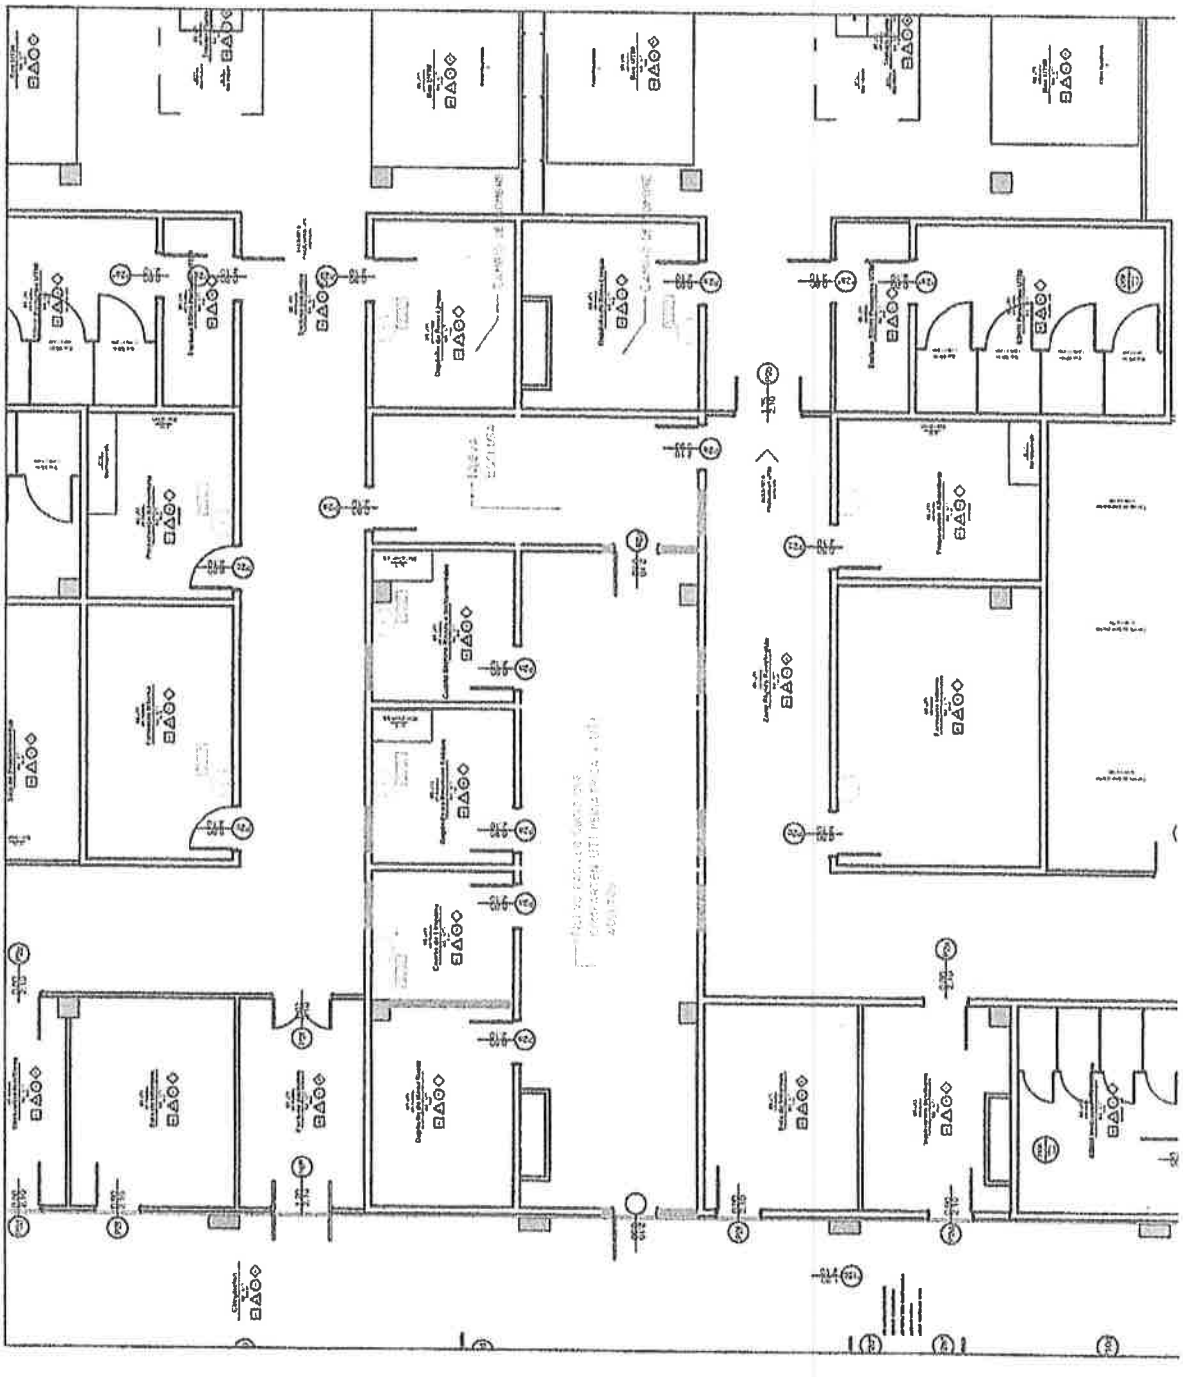

97 (NOVENTA Y SIETE)

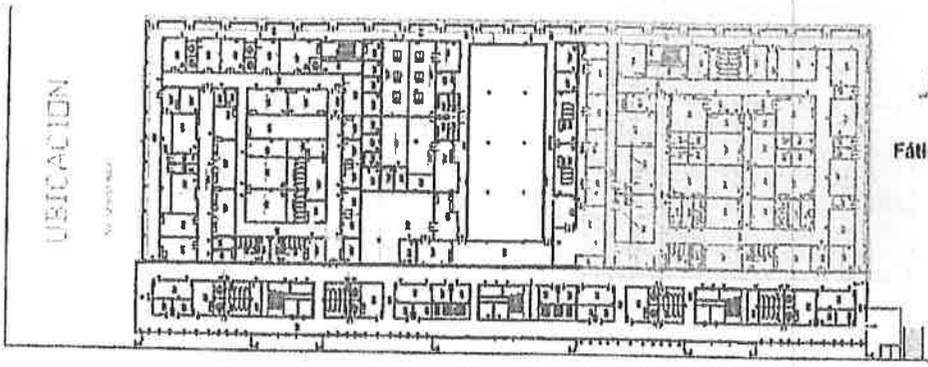

Fátima Náthalia Núñez Chapa
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC 3378

Ma. Claudia Ruiz Di
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC 3993

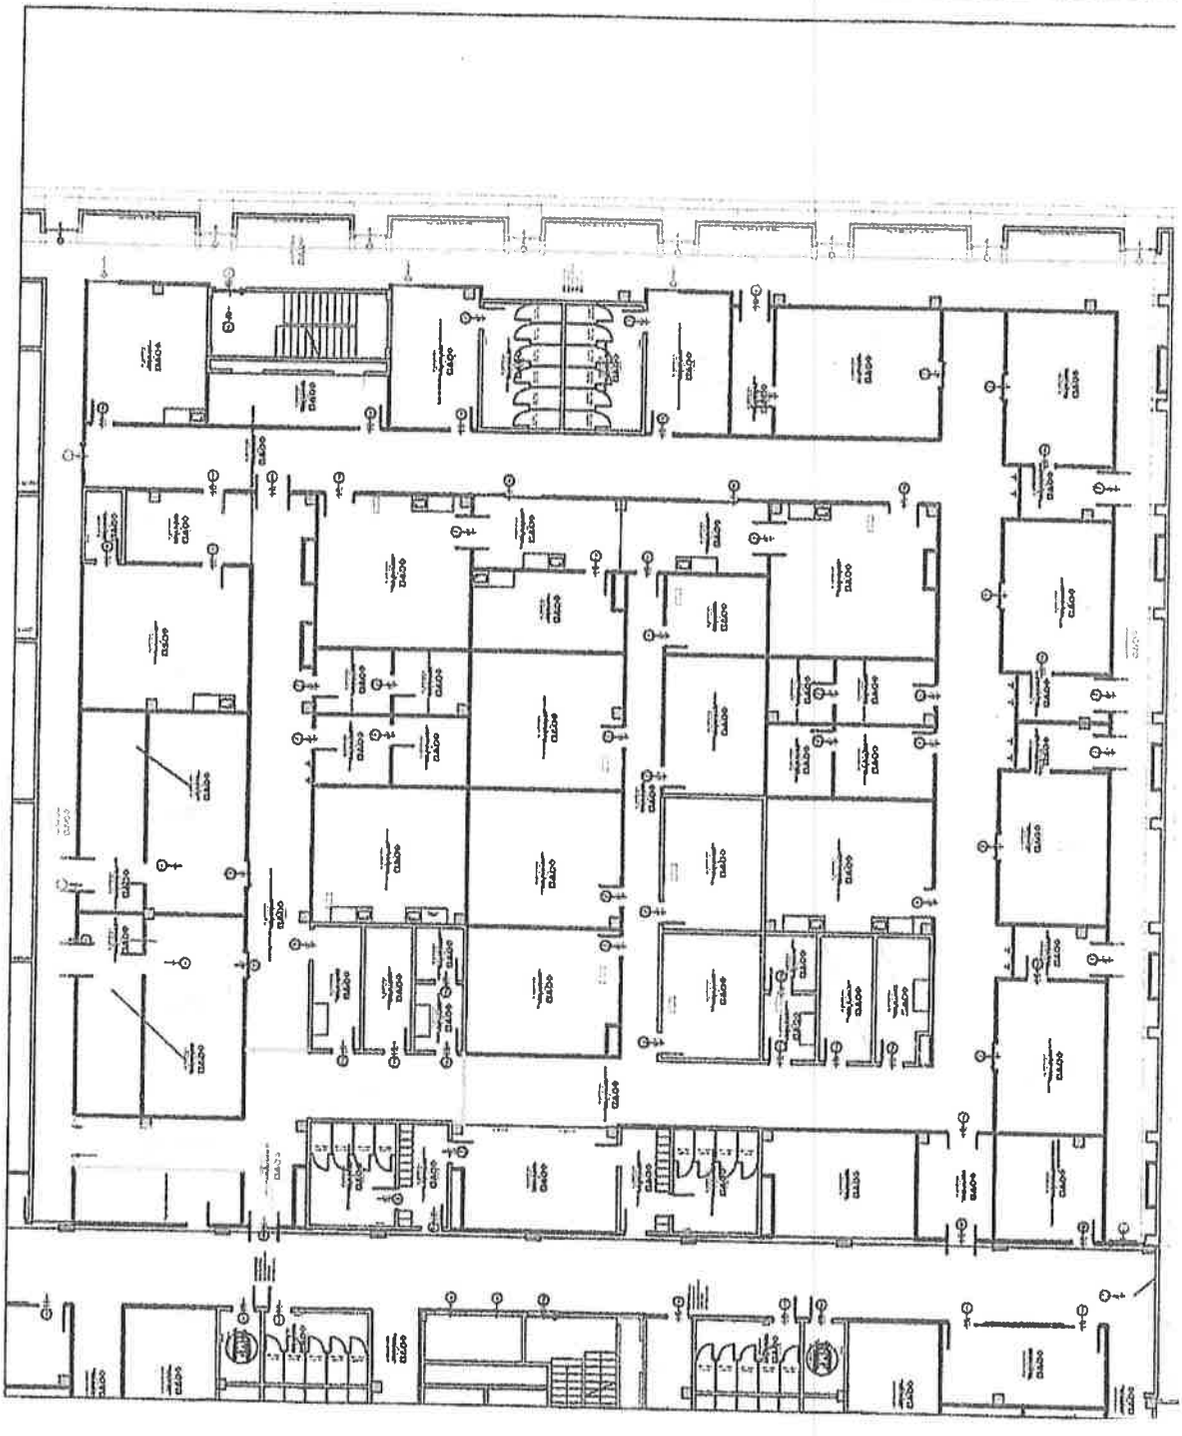

96 (NOVENTA Y SEIS)

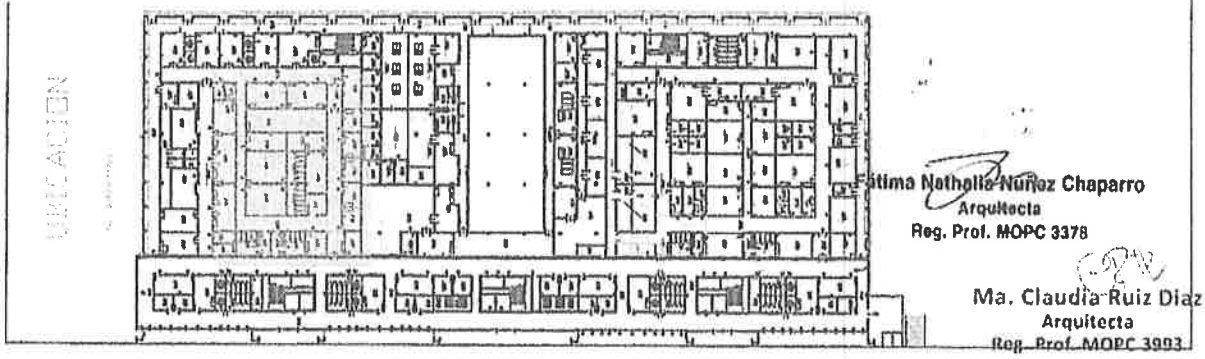

Ma. Claudia Ruiz Diaz
Arquitecta
Reg. Prof. MOPC 3993

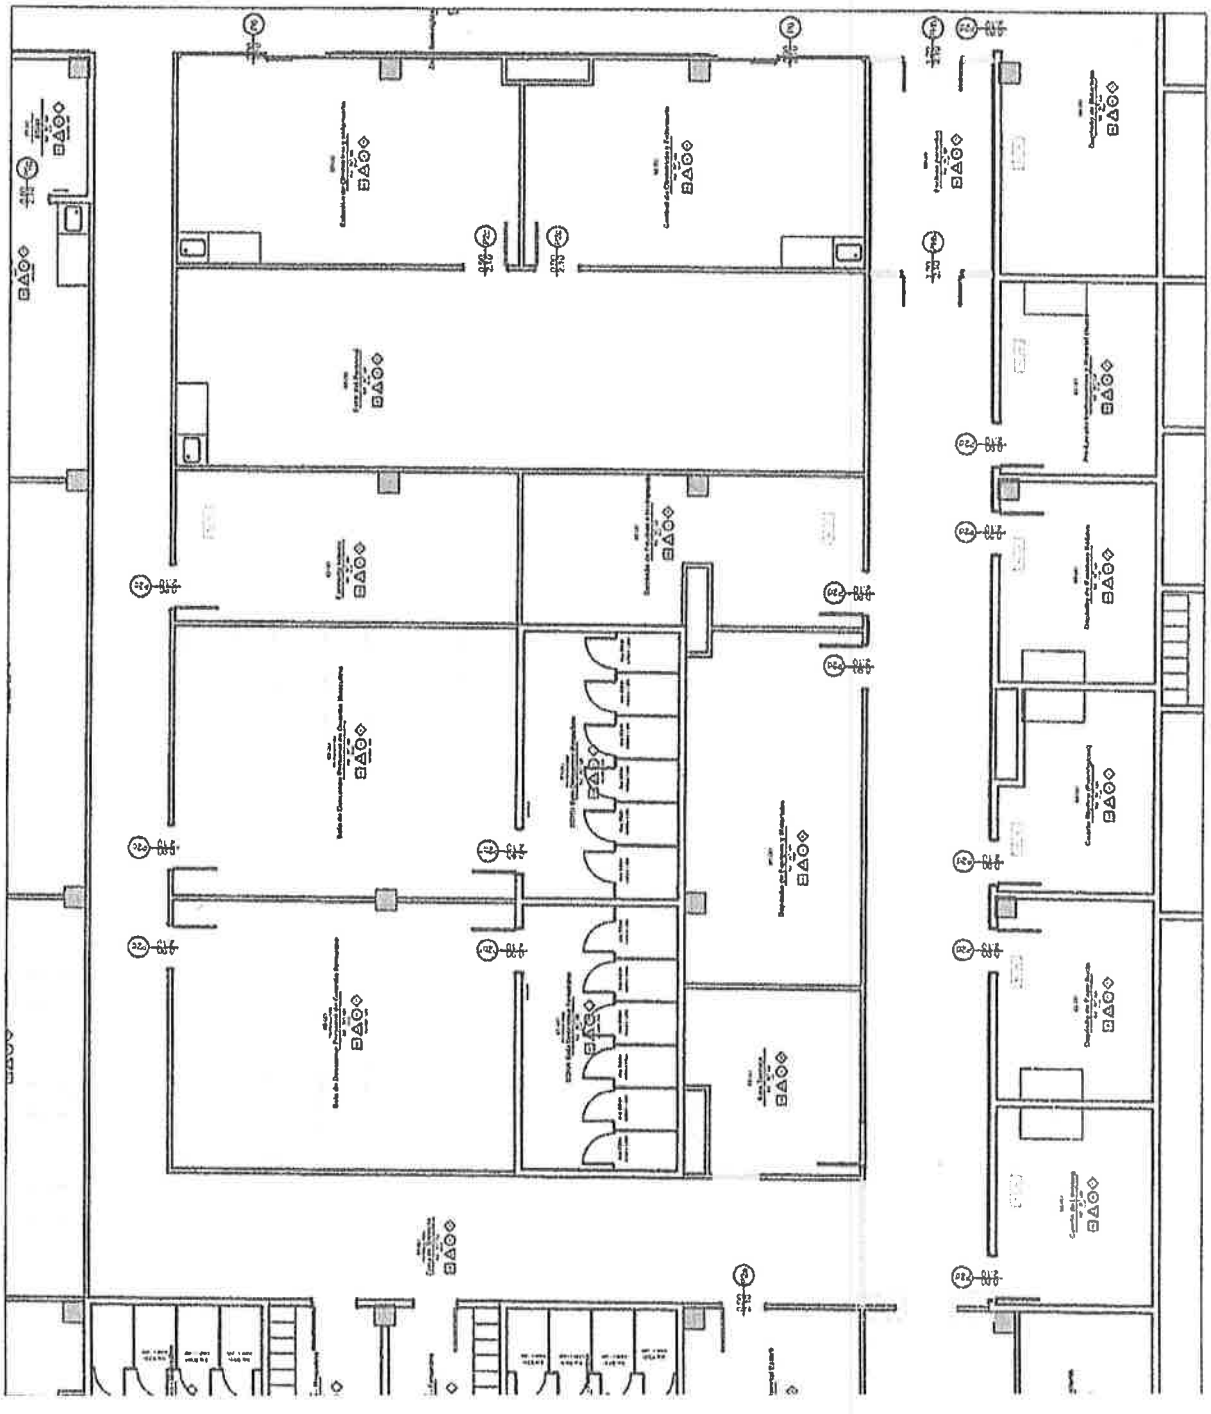

95(NOVENTA Y CINCO)

Consorcio Hospitalario del Sur

Dirección: Parini 1013 casi Tobati *Teléfono:* 021550283/0981550032 *Email:* scchaco@scc.com.py

GHS N° 40/2024

Asunción, 29 de febrero de 2024

Señora
Arq. Leticia María Herreros Cataldi
Coordinadora
UEP – Infraestructura Pública
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Presente

Ref: Contrato S.G. MINISTRO N° 350/2021 - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL GRAN HOSPITAL DEL SUR. ID N° 399377

De mi mayor consideración.

Me dirijo a Usted, en su carácter de Coordinadora de la Unidad Ejecutora de Proyectos de Infraestructura Pública del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en el marco del Contrato de referencia con el objeto de manifestar cuanto sigue:

En atención a la Nota UEP IP No. 69/2024 de fecha 26 de febrero de 2024, comunicamos que, en cumplimiento a la instrucción recibida, fueron suspendidos los trabajos en las Áreas de UTI y Quirófano.

Esta paralización dispuesta de manera unilateral por la contratante tiene efecto directo sobre el plazo único de ejecución de obras pactado, por lo que desde ya solicitamos que el plazo de la obra sea prorrogado en tanto tiempo se mantenga la instrucción de paralización.

La instrucción recibida, además representa una situación que genera costos al consorcio, no previstos en su planificación, pues las obras se encuentran con un avance considerable. Específicamente en las áreas UTI y Quirófanos los trabajos de pisos, revestidos, tabiques, cielorrasos, puertas, instalaciones eléctricas, instalaciones de agua corriente, desagüe cloacal,

Consorcio
Hospitalario Del Sur

94 (NOVENTA Y CUATRO)

Consorcio Hospitalario del Sur

Dirección: Paraguarí 1013 casi Tobatí *Teléfono:* 021550283/0981550032 *Email:* scchaco@scc.com.py

climatización, gases medicinas, PCI y señales débiles se encuentran avanzados y en plena ejecución. La suspensión de actividades en los lugares indicados deja sin frentes de trabajo a numerosas cuadrillas, que para mantenerse a disposición reclaman atención a los costos que esto implica.

El Consorcio hace expresa la reserva de derechos de reclamar los gastos que resulten de esta instrucción, que no estaba prevista en la planificación acordada.

Las obras en ejecución cuentan con las respectivas aprobaciones, y se ejecutan conforme a un cronograma pactado, atendiendo a la complejidad de los trabajos, y a la coordinación que demanda por su diversidad, por lo que rogamos diligencia en el desarrollo de los análisis y definición de propuestas que permitan, previo acuerdo formalizado, continuar con la ejecución de obras.

Atentamente,

Ing. Luis M. Gulino Canese
Representante Legal
Consorcio Hospitalario del Sur

M.O.P.C.
Secretaría General - Mesa de Entrada Única
MEU N°: 10555 / 2024
Fecha: 04 MAR 2024
Receptor 42
Para: ☐ Gabinete del Ministro
☐ VMOP ☐ VMAF ☐ VMT
☐ VMME ☐ Otro:
Observ.:
Fecha 04 MAR 2024
