151 (ciento cincuenta y uno)

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

150 (ciento cincuenta)

508

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

149 (ciento cuarenta y nueve)

597

EDE Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

148 (ciento cuarenta y ocho)

EDB Construcciones
Mariano Pavety Z.
Representante Legal

147 (ciento cuarenta y siete)
505

EDB Construcciones
Mariano Bauvety Z.
Representante Legal

146 (ciento cuarenta y seis)

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

145 (cinco cuarenta y cinco)

523

EDB Construcciones
Mariano Padvety Z.
Representante Legal

144 Ciento cuarenta y cuatro
522

EDB Construcciones
María [illegible] Z.
Representante Legal

143 (ciento cuarenta y tres)

521

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

142 (ciento cuarenta y dos)

520

EDB Construcciones
Mariano Beuvety Z.
Representante Legal

141 (ciento cuarenta y uno)

EDB Construcciones
Mariano Eauvety Z.
Representante Legal

140 (ciento cuarenta)

518

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

139 (ciento treinta y nueve)
17

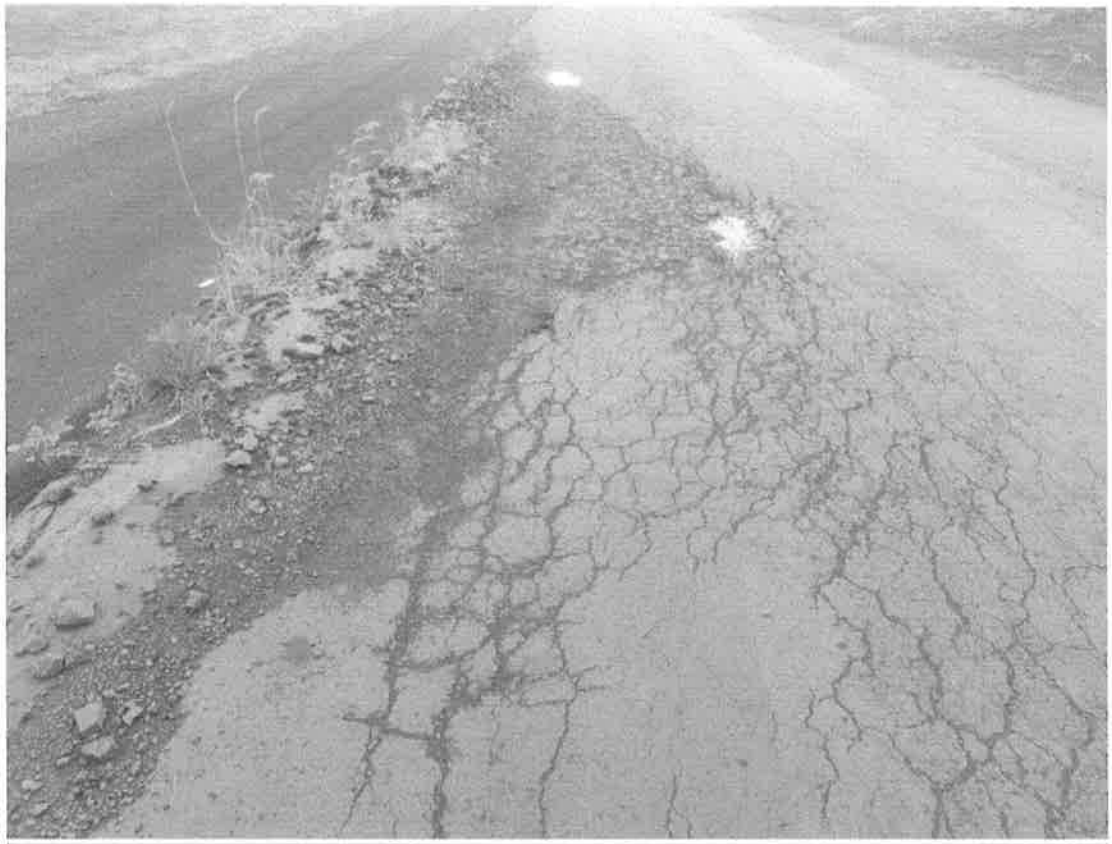

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

137 (ciento treinta y siete)

515

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

136 (ciento treinta y seis)
514

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

135 (ciento treinta y cinco

513

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

134 (ciento treinta y cuatro)
512

EDB Construcciones
Mariano Fuvety Z.
Representante Legal

133 (cinco frente y tras)
541

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

132 (ciento treinta y dos)
f. 10

EDB Construcciones
Mariano Fatovich Z.
Representante Legal

129 (ciento veintinueve
498

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

128 (ciento veintiocho)
497

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

127 (ciento veintisiete)

496

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

126 (ciento veintiseis)

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

125 (CIENTO VEINTICINCO)
494

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

123 (CIENTO VEINTITRES)

192

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

122 (CIENTO VEINTIDOS)

191

EDB Construcciones
Mariano [illegible]y Z.
Representante Legal

124 (CIENTO VEINTIUNO)
490

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

120 (CIENTO VEINTE)

LRC

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

119 (CIENTO DIECINUEVE)

119

EDB Construcciones
Mariano Badvety Z.
Representante Legal

118 (CIENTO DIECIOCHO)
187

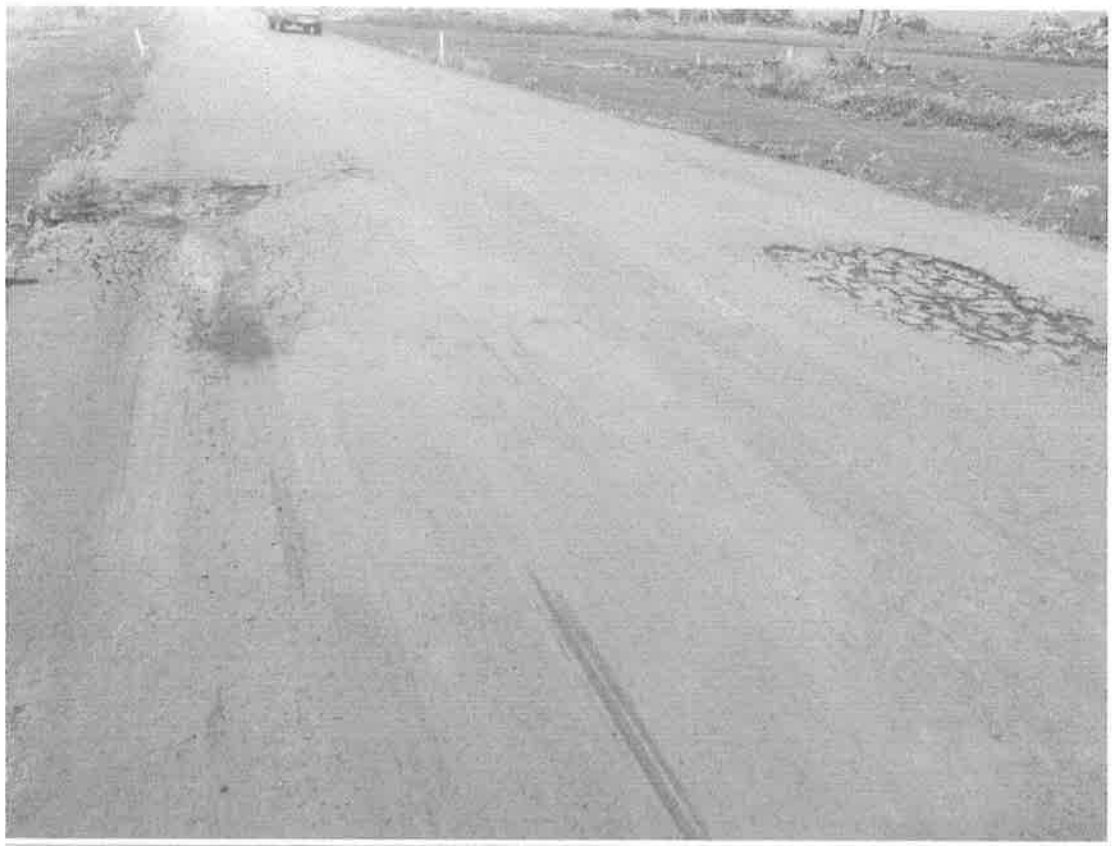

EDB Construcciones
Mariano Rabvety Z.
Representante Legal

117 (agosto diecisiete)

486

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

116 (CIENTO DIECISÉIS)
185

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

115 (CIENTO QUINCE)
LBR

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

114 (CIENTO CATORCE)
483

EDB Construcciones
Mariano Fuvety Z.
Representante Legal

113 (CIENTO TRECE)

182

EDB Construcciones
Mariano Paluoty Z.
Representante Legal

112 (CIENTO DOCE)

481

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

111 (ciento once)

480

EDB Construcciones
Mariano Nauvety Z.
Representante Legal

110 (CIENTO DIEZ)

176

EDB Construcciones
Mariano Fraavety Z.
Representante Legal

109 (CIENTO NUEVE)

479

EDB Construcciones
Mariano Echevety Z.
Representante Legal

108 (ciento ocho)

177

EDB Construcciones
Mariano Pauvety Z.
Representante Legal

107 (CIENTO SIETE)

476

EDB Construcciones
Mariano Louvety Z.
Representante Legal

106 (CIENTO SEIS)

175

EDB Construcciones
Mariana Fauvety Z.
Representante Legal

105 (CIENTO CINCO)

174

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

104 (CIENTO CUATRO)
173

ANEXO 3

103 (ciento tres)

172

Construcciones | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | Consorcio Fiscalizador del Sur

Contrato S.G. Ministro N° 234/2022, Llamado MOPC N° 92/2021 "Licitacion Publica Internacional para la contratacion de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitacion del tramo Empalme Ruta 6 - Empalme Corredor de Exportacion (Kirnex Rt6-Frutika-Carlos Antonio Lopez", con ID N° 402.400. TRAMO 1, LOTE 1: Cruce Kirnex-Kressburgo, Progresivas 0+180 a Progresiva 27+580

FECHA : 1/02/24

PROGRESIVA :	3+815 - 3+841
Capa: Bolsones de Excavacion	
LADO : IZQUIERDO	
LARGO: 26 mts	
ANCHO: 2,80	

LIMITE LIQUIDO

N° DE GOLPES	25	29						
Cápsula N°	1	2						
Peso total húmedo	29,70	29,10						
Peso total seco	23,30	22,50						
Tara cápsula	11,50	10,90						
Peso agua	6,40	6,60						
Peso seco	11,80	11,60						
% humedad	54,2	56,9						
Limite liquido	54,3	58,0						
PROMEDIO:	56,1							

LIMITE PLASTICO

Cápsula N°	3	4						
Peso total húmedo	17,80	17,70						
Peso total seco	16,12	16,00						
Tara cápsula	11,60	11,60						
Peso del agua	1,68	1,70						
Peso seco	4,52	4,90						
% humedad	37,2	34,7						
PROMEDIO:	35,9							

INDICE DE PLASTICIDAD

LIMITE LIQUIDO	56,1							
LIMITE PLASTICO	35,9							
INDICE DE PLASTICIDAD	20,2							
I.G.:	26							
Clas.:	A -7 - 5							

GRANULOMETRIA

TAMIZ		Peso Gr.	%
	TOTAL	285,6	
10	Ret.	0	
	Past.	285,6	100,0
40	Ret.	1,3	
	Past.	284,3	99,5
200	Ret.	24,1	
	Past.	260,2	91,1

OBSERVACION :

LABORATORISTA
Diego Ramirez
Laboratorio

FIZCALIZACION
Adriano Gonzales

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

102 (CIENTO DOS)

171

Construcciones | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | Consorcio Fiscalizador del Sur

Contrato S.G. Ministro N° 234/2022, Llamado MOPC N° 02/2021 "Licitacion Publica Internacional para la contratacion de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitacion del tramo Empalme Ruta 6 - Empalme Corredor de Exportacion (Kimex R6-Frutika-Carlos Antonio Lopez", con ID Nº 402.400. TRAMO 1, LOTE 1: Cruce Kimex-Kressburgo, Progresivas 0+180 a Progresiva 27+580

FECHA: 01/02/24

PROGRESIVA :	3+843 - 3+859
Capa:	Bolsones de Excavacion
LADO :	IZQUIERDO
LARGO:	16 mts
ANCHO:	3,00 mts

LIMITE LIQUIDO

N° DE GOLPES	20	28						
Cápsula N°	2	4						
Peso total húmedo	30,41	30,44						
Peso total seco	23,60	23,70						
Tara cápsula	10,10	10,50						
Peso agua	6,81	6,74						
Peso seco	13,50	13,20						
% humedad	50,4	51,1						
Límite líquido	49,0	51,8						
PROMEDIO:	50,4							

LIMITE PLASTICO

Cápsula N°	3	4						
Peso total húmedo	19,40	20,10						
Peso total seco	17,15	17,97						
Tara cápsula	10,10	11,40						
Peso del agua	2,25	2,13						
Peso seco	7,05	6,57						
% humedad	31,9	32,4						
PROMEDIO:	32,2							

INDICE DE PLASTICIDAD

LIMITE LIQUIDO	50,4							
LIMITE PLASTICO	32,2							
INDICE DE PLASTICIDAD	18,3							
I.G.	20							
Clas.:	A -7 - 5							

GRANULOMETRIA

TAMIZ		Peso Gr.	%
	TOTAL	145,2	
10	Ret.	0	
	Past.	145,2	100,0
40	Ret.	1,1	
	Past.	144,1	99,2
200	Ret.	10,4	
	Past.	133,7	92,1

OBSERVACION :

LABORATORISTA
Diego Ramirez
Laboratorio

FIZCALIZACION
Adriano Gonzales

EDB Construcciones
Mariano Darvety Z.
Representante Legal

101 (CIENTO UNO)
170

edb Construcciones | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | Consorcio Fiscalizador del Sur

Contrato S.G. Ministro N° 234/2022, Llamado MOPC N° 92/2021 "Licitacion Publica Internacional para la contratacion de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitacion del tramo Empalme Ruta 6 - Empalme Corredor de Exportacion (Kimex R6-Frutika-Carlos Antonio Lopez", con ID N° 402.400. TRAMO 1, LOTE 1: Cruce Kimex-Kressburgo, Progresivas 0+180 a Progresiva 27+580

FECHA: 02/02/24

PROGRESIVA :	3+905 - 3+993
Capa: Bolsones de Excavacion	
LADO : IZQUIERDO	
LARGO: 88 mts	
ANCHO: 2,70 mts	

LIMITE LIQUIDO

N° DE GOLPES	20	26						
Cápsula N°	11	14						
Peso total húmedo	35,60	32,10						
Peso total seco	27,60	25,50						
Tara cápsula	10,40	11,10						
Peso agua	8,00	6,60						
Peso seco	17,20	14,40						
% humedad	46,5	45,8						
Límite líquido	45,2	46,1						
PROMEDIO:	45,7							

LIMITE PLASTICO

Cápsula N°	6	17						
Peso total húmedo	21,40	24,50						
Peso total seco	18,80	21,50						
Tara cápsula	10,40	11,80						
Peso del agua	2,60	3,00						
Peso seco	8,40	9,70						
% humedad	31,0	30,9						
PROMEDIO:	30,9							

INDICE DE PLASTICIDAD

LIMITE LIQUIDO	45,7							
LIMITE PLASTICO	30,9							
INDICE DE PLASTICIDAD	14,7							
I.G	17							
Clas.	A -7 - 5							

GRANULOMETRIA

TAMIZ	TOTAL	Peso Gr.	%
10	Ret.	0	
	Past.	302,4	100,0
40	Ret.	1,4	
	Past.	301,0	99,5
200	Ret.	15,6	
	Past.	285,4	94,4

OBSERVACION :

CONTRATISTA
Diego Ramírez
Laboratorio

FIZCALIZACION
Adrián Gonzales

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

100 (UEN)

LRC

edb Construcciones | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | Consorcio Fiscalizador del Sur

Contrato S.G. Ministro N° 234/2022, Llamado MOPC N° 92/2021 "Licitacion Publica Internacional para la contratacion de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitacion del tramo Empalme Ruta 6 - Empalme Corredor de Exportacion (Kimex R6-Frutika-Carlos Antonio Lopez", con ID N° 402.400. TRAMO 1, LOTE 1: Cruce Kimex-Kressburgo, Progresivas 0+180 a Progresiva 27+580

FECHA:03/02/24

PROGRESIVA :	4+282 - 4+295
Capa: Bolsones de Excavacion	
LADO : IZQUIERDO	
LARGO: 13,00 mts	
ANCHO: 2,6 mts	

LIMITE LIQUIDO

N° DE GOLPES	22	29						
Cápsula N°	1	2						
Peso total húmedo	28,90	30,10						
Peso total seco	22,60	23,10						
Tara cápsula	11,50	10,90						
Peso agua	6,30	7,00						
Peso seco	11,10	12,20						
% humedad	56,8	57,4						
Limite liquido	55,8	58,5						
PROMEDIO:	57,2							

LIMITE PLASTICO

Cápsula N°	20	17						
Peso total húmedo	21,10	22,50						
Peso total seco	17,82	19,23						
Tara cápsula	10,50	11,30						
Peso del agua	3,28	3,27						
Peso seco	7,32	7,93						
% humedad	44,8	41,2						
PROMEDIO:	43,0							

INDICE DE PLASTICIDAD

LIMITE LIQUIDO	57,2							
LIMITE PLASTICO	43,0							
INDICE DE PLASTICIDAD	14,2							
I.G.	17							
Clas	A -7 - 5							

GRANULOMETRIA

		Peso Gr.	%
TAMIZ	TOTAL	178,7	
10	Ret.	0	
	Past.	178,65	100,0
40	Ret.	1,1	
	Past.	177,6	99,4
200	Ret.	7,8	
	Past.	169,8	95,0

OBSERVACION :

CONTRATISTA
Diego Ramirez
Laboratorio

FIZCALIZACION
Adriano Gonzales

EDB Construcciones
Mariano Fauvety Z.
Representante Legal

99 (NOVENTA Y NUEVE)

Construcciones | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUÁI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | Consorcio Fiscalizador del Sur

Contrato S.G. Ministro N° 234/2022, Llamado MOPC N° 02/2021 "Licitacion Publica Internacional para la contratacion de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitacion del tramo Empalme Ruta 6 - Empalme Corredor de Exportacion (Kimex R6-Frutika-Carlos Antonio Lopez". con ID N° 402.400. TRAMO 1, LOTE 1: Cruce Kimex-Krasaburgo, Progresivas 0+180 a Progresiva 27+580

FECHA: 03,/02/24

PROGRESIVA :	4+596 - 4+698
Capa: Bolsones de Excavacion	
LADO : IZQUIERDO	
LARGO: 102,20 mts	
ANCHO: 2,50 mts	

LIMITE LIQUIDO

N° DE GOLPES	24	28						
Cápsula N°	20	21						
Peso total húmedo	27,89	29,51						
Peso total seco	22,10	23,30						
Tara cápsula	10,80	11,10						
Peso agua	5,79	6,21						
Peso seco	11,30	12,20						
% humedad	51,2	50,9						
Limite liquido	51,0	51,7						
PROMEDIO:	51,3							

LIMITE PLASTICO

Cápsula N°	16	17						
Peso total húmedo	23,50	22,10						
Peso total seco	20,12	19,25						
Tara cápsula	10,80	11,10						
Peso del agua	3,38	2,85						
Peso seco	9,32	8,15						
% humedad	36,3	35,0						
PROMEDIO:	35,6							

INDICE DE PLASTICIDAD

LIMITE LIQUIDO	51,3							
LIMITE PLASTICO	35,6							
INDICE DE PLASTICIDAD	15,7							
I.G.:	19							
Clas.	A -7 - 5							

GRANULOMETRIA

TAMIZ		Peso Gr.	%
	TOTAL	113,7	
10	Ret.	0	
	Past.	113,65	100,0
40	Ret.	1,5	
	Past.	112,2	98,7
200	Ret.	5,5	
	Past.	106,7	93,8

OBSERVACION :

CONTRATISTA
Diego Ramirez
Laboratorio

FIZCALIZACION
Adriano Gonzales

EDB Construcciones
Mariano Frauvety Z.
Representante Legal

98 (NOVENTA Y OCHO)
467

Construcciones | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES PARAGUAY | PARAGUAI TETÃ REMBIAPO HA MARANDU MOTENONDEHA | Consorcio Fiscalizador del Sur

Contrato S.G. Ministro N° 234/2022, Llamado MOPC N° 92/2021 "Licitacion Publica Internacional para la contratacion de firmas constructoras para el mejoramiento y rehabilitacion del tramo Empalme Ruta 6 - Empalme Corredor de Exportacion (Kimex R6-Frutika-Carlos Antonio Lopez", con ID Nº 402.400. TRAMO 1, LOTE 1: Cruce Kimex-Kressburgo, Progresivas 0+180 a Progresiva 27+580

FECHA: 05/02/24

PROGRESIVA :	**5+419 - 5+431**
Capa: Bolsones de Excavacion	
LADO : IZQUIERDO	
LARGO: 12,30 mts	
ANCHO: 2,00 mts	

LIMITE LIQUIDO

N° DE GOLPES	21	26						
Cápsula N°	7	8						
Peso total húmedo	33,60	30,70						
Peso total seco	26,40	24,50						
Tara cápsula	10,70	10,90						
Peso agua	7,20	6,20						
Peso seco	15,70	13,60						
% humedad	45,9	45,6						
Límite líquido	44,9	45,8						
PROMEDIO:	45,3							

LIMITE PLASTICO

Cápsula N°	1	18						
Peso total húmedo	19,80	20,40						
Peso total seco	17,65	18,15						
Tara cápsula	10,70	11,00						
Peso del agua	2,15	2,25						
Peso seco	6,95	7,15						
% humedad	30,9	31,5						
PROMEDIO:	31,2							

INDICE DE PLASTICIDAD

LIMITE LIQUIDO	45,3							
LIMITE PLASTICO	31,2							
INDICE DE PLASTICIDAD	14,1							
I.G :	16							
Clas.	A -7 - 5							

GRANULOMETRIA

TAMIZ		Peso Gr.	%
	TOTAL	145,6	
10	Ret.	0	
	Past.	145,6	100,0
40	Ret.	1,1	
	Past.	144,5	99,2
200	Ret.	9,7	
	Past.	134,8	92,6

OBSERVACION :

CONTRATISTA
Diego Ramirez
Laboratorio

FIZCALIZACION
Adriano Gonzales

EDB Construcciones
Mariano [illegible] Z
Representante Legal
