GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA: 30 Enero 2020

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno | Llovizna | Lluvia ✓ | Otros

LIBRO DE OBRA

Nº 0000003

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: Ing. Adolfo Irala

FISCAL: Ing. Victor Miranda.

(*) A travez de la presente se informa que el día de hoy Jueves 30 de enero no hubo actividad laboral en la obra debido a la lluvia caida, aproximadamente 100 m.m.

lluvia: 29 y 30

Dpto. de Fiscalización Delegada
Dirección de Arquitectura y Obras
Ministerio de la Defensa Pública

Víctor M. Miranda
Fiscalizador
ING. CIVIL

Firma Delegado
Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1178
Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 31 Enero 2020

ESTADO DEL TIEMPO

Bueno	Llovizna	Lluvia	Otros
	✓		✓

LIBRO DE OBRA

Nº 0000004

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: Ing. Adolfo Iralla

FISCAL: Ing. Victor Miranda.

(*) Se deja constancia que el día de hoy viernes 31 de enero, se tuvo llovizna durante todo el día, consecuentemente mucha humedad; por dicho motivo no pudo realizarse trabajo alguno en la obra. —

Víctor M. Miranda Delgado
ING. CIVIL

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1178

Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 03 02 2020

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno [x] Llovizna [ ] Lluvia [ ] Otros [ ]

LIBRO DE OBRA

Nº 0000006

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: Ing. Adolfo Irala Sanchez.

FISCAL: Ing. Victor Miranda.

Se procedio a la Limpieza del terreno, asiento de la Etapa 2, tambien a la Reparación del Vallado de Obra Existente y colocación, así como la reparación del Obrador existente.
Se procedió al inicio delos trabajos de Reparación y puesta en marcha de la instalación eléctrica.
Se efectuó el replanteo del terreno asiento de la Cafeteria, conforme Plano Topográfico, elaborado por el Lic. Carlos Mieres, quien fué el profesional topógrafo responsable del fraccionamiento del lugar.
Igualmente se efectuó el Replanteo y marcación de Obra: Cafeteria. Se deja constancia que llovio el dia de ayer.

Víctor M. Miranda Delgado
ING. CIVIL
Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.T.M. Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA: 11 Feb 2020

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno ✓ | Llovizna | Lluvia | Otros

LIBRO DE OBRA

Nº 0000009

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: Ing Adolfo Irala

FISCAL: Ing. Victor Miranda S.

(*) Asentamos lo Hecho el 7/02/20.

(*) En el día de hoy se estan realizando trabajos de:
- Electricidad.
- Limpieza.
- Replanteo de Cafetería.
- Aislacion de azotea.

(*) Se autoriza la construcción del Pozo absorvente en el lugar indicado en el plano. desvian de unos metros para salvar el arbol.

DETALLE DEL POZO ABSORVENTE:

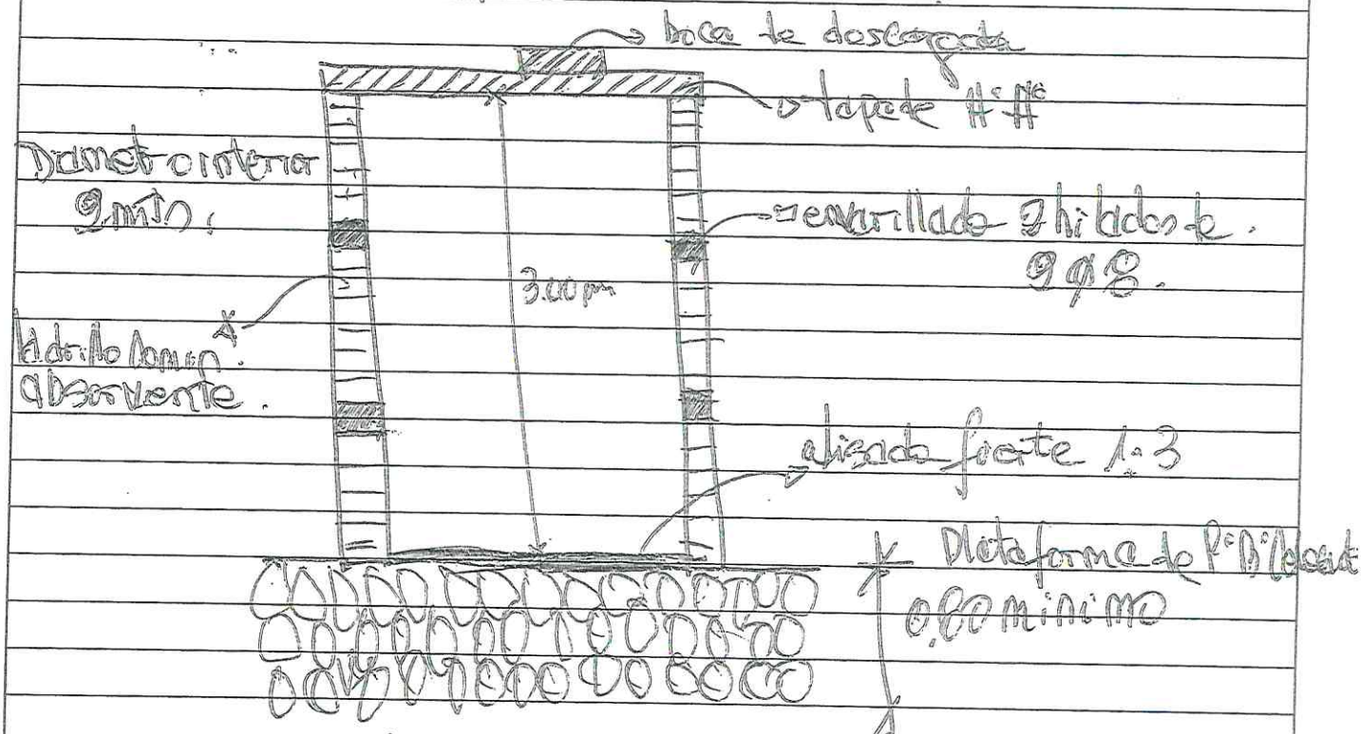

OBS: Se establece la posicion del Pozo absorvente conjuntamente con la Fiscalización y el Residente.

Víctor M. Miranda Delgado
ING. CIVIL
Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1178
Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 19 Feb. 2020

ESTADO DEL TIEMPO

Bueno	Llovizna	Lluvia	Otros
		✓	

LIBRO DE OBRA

Nº 0000016

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: Ing. Adolfo Irala

FISCAL: Ing. Victor MIRANDA.

(*) Dia de lluvia. Sin Actividad en la Obra.-

Víctor M. Miranda Delgado
Ingeniero Civil
Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1178
Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 20 Feb. 2020

ESTADO DEL TIEMPO

Bueno	Llovizna	Lluvia	Otros
	✓		✓

LIBRO DE OBRA

Nº 0000017

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: Ing. Adolfo Irala.

FISCAL: Ing. Victor Miranda.

(*) Dia Humedo - Llovizna Permanente - A la tarde lluvia.

Víctor M. Miranda Delgado
ING. CIVIL
Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 4173
Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 680 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 02 05 2020

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno | Llovizna | Lluvia | Otros

LIBRO DE OBRA

Nº 0000038

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: ING. ADOLFO TRALA.

FISCAL: ING. VICTOR MIRANDA.

SE CONTATA LLUVIA EL DIA 1º-05-20.

CONTINUAN TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE REVOQUE EN PAREDES ONDULADAS Y MAL APLOMADAS. INICIAN TRABAJOS DE REVOQUE DE LOS MISMOS

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MARCOS Y PUERTAS EN BAÑOS DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA.

CONTINÚAN TRABAJOS DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMÚN EN PLANTA ALTA Y AZOTEA.

CONTINUAN TRABAJOS DE LADRILLO PRENSADO EN FACHADA LATERAL.

EL PROYECTO DE DESAGUE PLUVIAL DE LOS PATIOS EN EL AREA CONTIGUA AL AREA DE SERVICIO Y CAFETERIA CULMINAN EN EL BARRIO CON MAYOR DESNIVEL CON RELACIÓN A LA CALLE, ESTANDO ESTA ÁREA CON TERRENOS LINDEROS PRIVADOS, NO PUDIÉNDOSE CONECTAR A LA RED PÚBLICA DICHO DESAGUE SEGÚN EL PROYECTO. CONSIDERAMOS QUE DICHO PROYECTO DEBE SER MODIFICADO POR NO SER VIABLE. ADEMÁS SE ENCUENTRA CONTIGUO A LA CÁMARA SÉPTICA Y EL POZO CIEGO, POR LO QUE SOLICITAMOS DIRECTIVAS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA. DEL MDP, DICHA INDEFINICIÓN PARALIZA LOS TRABAJOS PARA REALIZAR LOS NIVELES DE RAMPAS, PARQUE INFANTIL, EXPLANADAS, AREA DE ESTACIONAMIENTO.

LA INDEFINICIÓN DE NIVELES PARALIZAN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PRETILES, COMO ASÍ LA PINTURA DE LOS ALUMBRADOS DE PARQUES.

OBS: Se adjunta todo lo pedido en esta hoja.
Se le pide al Residente Hector: mejorar su letra, que sea mas legible. Se registro lluvia el 1º de Mayo. Fazzio

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO TRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1172
Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA: 05 | 05 | 2020.

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno [ ] Llovizna [ ] Lluvia [✓] Otros [ ]

LIBRO DE OBRA

Nº 0000041

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: Ing. Adolfo Irala.

FISCAL: Ing. Victor Miranda.

(F) Lluvia en el día de hoy

Continuan trabajos de colocación de marcos y puertas en baños de planta alta y planta baja.

Continuan trabajos de lavadero semi terminado en fachada lateral.

Continua la colocación de piso granito.

Continua la colocación de revestimiento (azulejos) en baños de planta alta y planta baja.

En el lugar de ubicación del poste de entrega de ande de media tensión y la bajada en línea subterránea, se encuentra impedido por 3 (tres) árboles, por lo cual solicitamos una definición a esta situación planteada, debido a que debe colocarse en el medio un secciónador dentro de la propiedad comunicándose al transformador mayor dentro del bloque de servicio y además, en el mismo sitio debe construirse una plataforma (nicho) para colocación del medidor de ande.

Se solicita una definición a la dirección de infraestructura del MDP, para la entrada de señales de cables (internet y telefonía) al no encontrarse detallado en los planos provistos, y su ubicación dentro de la plataforma (nicho). El artefacto luminaria debe reubicarse por los trabajos que estos ocupan, lo cual solicitamos una definición de su reubicación.

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1178
Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA: 11 | 05 | 2020

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno | Llovizna | Lluvia ✓ | Otros

LIBRO DE OBRA

Nº 0000046

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: Ing. Adolfo Irala.

FISCAL: Ing. Víctor Miranda.

Lluvia en el día de hoy.

Continúan trabajos de mampostería de ladrillo semiprensado en fachada lateral.

Continúan trabajos de colocación de cerámicas en fachada lateral.

Continúan trabajos de colocación de piso granito en planta alta.

Continúa la colocación de revestimiento en baños de planta baja y planta alta.

Continúan trabajos de encofrado del tanque de agua interior.

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1178

Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA: 21 | 06 | 2020

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno | Llovizna | Lluvia (V) | Otros

LIBRO DE OBRA

Nº 0000052

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: Ing. Adolfo Irala

FISCAL: Arq. Victor Villanueva.

Inician trabajos de muro de piedra brita colorada. Sin tendido de fondo del área de cafetería.

Continuan trabajos de colocamiento de bolares de Nº 4 del área de cafetería. Continuan los trabajos de muro de piedra brita colorada en lado izquierdo y fondo. Inician trabajos de replanteo y marcación de obra para el bloque de servicio. Inician trabajos de excavación de zapatas del bloque de servicios.

Continuan trabajos de colocación de piso granito en planta alta.

Preparación de contrapeso de cascotes para nivelación de azotea.

Inician trabajos de sacar una interior para muralla 2do desarrollo y fondo.

Continuan los trabajos de instalaciones para perforación de encuadro del bloque lavandería.

(*) llovio en el dia de hoy.

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ingº Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1178

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 22 05 2020.

ESTADO DEL TIEMPO

Bueno	Llovizna	Lluvia	Otros
		✓	

LIBRO DE OBRA

Nº 0000053

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: ING. ADOLFO IRALA

FISCAL: ING. VICTOR MILANES.

SE INICIARON TRABAJOS DE REPLANTEO Y PREPARACIÓN PARA CATERIAS DE ACONDICIONADORES DE AIRE.

CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTOS EN BAÑOS DE PLANTA ALTA.

CONTINUA LA PREPARACIÓN DE ENCOFRADO PARA LA HORMIGONADO DE COLUMNAS DE H° A° EN PLANTA ALTA.

CONTINUAN TRABAJOS DE INSTALACIONES DE CATERIAS PARA PERFILACIÓN DE ENCANDO.

(*) Se registro lluvia en la fecha

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1178

Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA: 01 | 04 | 2020

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno | Llovizna | Lluvia ✓ | Otros

LIBRO DE OBRA

Nº 0000063

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: ING. ADOLFO IRALA

FISCAL: ING. VICTOR MIRANDA.

CONTINUARON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS DE PLANTA ALTA.

CONTINUARON LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE CAÑERIAS DE DESAGÜE EN PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA.

CONTINUARON TRABAJOS DE ZUNCHADO DE CAÑERIAS PARA ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN BLOQUE PRINCIPAL.

CONTINUARON LOS TRABAJOS DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO SEMIPRENSADO EN FACHADA LATERAL CON TERMINACIÓN EN SECADERO.

CONTINUARON TRABAJOS DE CONTRAPISO DE CASETONES Y CARPETA EN AZOTEA.

CONTINUARON LOS TRABAJOS DE CARGAMENTO DE VIGAS DE FUNDACIÓN Y ADOBES EN BLOQUE DE SEGURIDAD.

CONTINUARON TRABAJOS DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMÚN Y CARGAMENTO DE Nº 4 EN PILARES DE MURALLA.

INICIARON TRABAJOS DE CONTRAPISO DE CASETONES EN PLANTA PRINCIPAL.

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1179

Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 03 06 2020

ESTADO DEL TIEMPO

Bueno	Llovizna	Lluvia	Otros
		✓	

LIBRO DE OBRA

Nº 0000065

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: ING. ADOLFO IRALA

FISCAL: ING. VICTOR MIRANDA.

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS DE PLANTA ALTA —

CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE CAÑERIAS DE PERMUTACIÓN EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA. —

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE CAÑERIAS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE EN EL BLOQUE PRINCIPAL. —

SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL MDP, LA UBICACIÓN DE LUGARES PARA COLOCACIÓN DE LEDAS, ADEMÁS DEL TIPO DE MEDIDAS DE CAÑOS HORIZONTALES Y VERTICALES, CON SU CORRESPONDIENTE SEPARACIÓN —

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1172
Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 04 | 06 | 2020.

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno | Llovizna | Lluvia ✓ | Otros

LIBRO DE OBRA

Nº 0000066

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: ING. ADOLFO IRALA

FISCAL: ING. VICTOR MIRANDA.

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTOS EN BAÑOS DE PLANTA ALTA.

CONTINUA LA COLOCACIÓN DE CAÑERIAS DE VENTILACIÓN EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA.

CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ASSO CERRADO EN PLANTA ALTA

COMENZARON TRABAJOS DE INSTALACIONES DE CAÑERIAS PARA RECONDICIONAMIENTO DE AGUA DEL BLOQUE PRINCIPAL

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 4179
Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 05 06 2020

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno | Llovizna | Lluvia ✓ | Otros

LIBRO DE OBRA

Nº 0000067

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: ING. ADOLFO IRALA

FISCAL: ING. VICTOR MORALES.

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO EN BAÑOS DE PLANTA ALTA.

COLOCARON TRABAJOS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA CORRIENTE DEL TANQUE SUPERIOR A BAÑOS DE PLANTA ALTA, PLANTA BAJA, SALA DE LACTANCIA CON CAÑERIAS Y ACCESORIOS DE TERMOFUSIÓN.

SE SOLICITA A LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL MDP, LA DEFINICIÓN SOBRE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE ASCENSOR EN FACHADA LATERAL, COMO ASI TAMBIÉN LA RAMPA PARA ACCESO LATERAL PARA EMPLEADOS Y ÓSEOS AL NO ENCONTRARSE EN PLANILLA DE CONTRATO. Y LAS ABERTURAS CORRESPONDIENTE AL LUGAR SEÑALADO.

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1172

Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 14 06 2020

ESTADO DEL TIEMPO

Bueno	Llovizna	Lluvia	Otros
		✓	

LIBRO DE OBRA

Nº 0000075

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: Ing. Adolfo Traia

FISCAL: Ing. Victor Molinda.

DIA CON LLUVIAS PROLONGADAS.

CONTINUAN LOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE PISO GRANITO EN PLANTA ALTA.

Hora al día 13 Junio 2020

Ing. Victor Miranda Delgado
Director de Infraestructura y Obras
Ministerio de la Defensa Pública

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO TRAIA SANCHEZ
Ing. Civil

Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 26 06 2020

ESTADO DEL TIEMPO

Bueno	Llovizna	Lluvia	Otros
		✓	

LIBRO DE OBRA

Nº 0000086

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: ING. ADOLFO IRALA

FISCAL: ING. VICTOR MIRANDA

SE REALIZA EL CARGAMENTO DE Hº Aº EN VIGAS SUPERIORES Y LOSA DEL BLOQUE DE CAFETERÍA

Ing. Víctor Miranda Delgado
Dirección de Infraestructura y Obras
Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1178
Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 680 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 06 07 2020

ESTADO DEL TIEMPO

Bueno	Llovizna	Lluvia	Otros

LIBRO DE OBRA

Nº 0000091

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: ING. ADOLFO IRALA

FISCAL: ING. VICTOR MIRANDA

SE REGISTRA lluvia día anterior (5 Julio 2020)

CONTINUAN TRABAJOS DE REPARACIÓN DE DAÑOS POR CORROSIÓN Y DESORDENAMIENTOS EN VIGAS Y LOSAS

CONTINUAN TRABAJOS DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA INTERIOR Y SANITACIÓN DEL RESERVORIO DE AGUA POTABLE SUPERIOR

Víctor Miranda Delgado
Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1179
Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.J. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 12 07 2020

ESTADO DEL TIEMPO

Bueno	Llovizna	Lluvia	Otros

LIBRO DE OBRA

Nº 0000094

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: ING. ADOLFO IRALA

FISCAL: ING. VICTOR MIRANDA

Se ha registrado lluvia el día 7 de Julio - 2020.

CONTINUAN TRABAJOS DE REPARACION DE DAÑOS EN LOSAS Y VIGAS

CONTINUAN TRABAJOS PARA VEREDA CON CORDONES DE H°A° CARGADO EN SITU Y CORDÓN CUNETA

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1173

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0001/00100 - Enero - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy N° 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 12 | 06 | 2020.

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno | Llovizna | Lluvia ✓ | Otros

LIBRO DE OBRA

N° 0000116

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato N° 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: ING. ADOLFO IRALA

FISCAL: ING. VICTOR MIRANDA

CONTINUAN TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE BOMBA PARA PREVENCIÓN DE INCENDIO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

INICIAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MEDIDOS PARA PARQUE INFANTIL

CONTINUAN TRABAJOS DE CONTRAPISO Y CARPETA PARA ACCESO A PARQUE INFANTIL, EXPLANADA.

CONTINUAN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS PLUVIALES EN EL EXTERIOR.

INICIAN TRABAJOS DE REVESTIMIENTO EN BAÑO DEL BLOQUE DE CARRETERA.

AL DÍA DE LA FECHA AÚN NO SE CUENTAN CON DEFINICIONES SOBRE FACHADA PRINCIPAL, BACHAS EN BAÑOS DEL BLOQUE PRINCIPAL, UBICACIÓN DE BARANDAS EN ACCESO LATERAL, UBICACIÓN DE PIEDRA LAJA, PRODUCIÉNDOSE ATRASO EN LAS OBRAS. SE SOLICITA NUEVAMENTE DIRECTIVAS.

Se dió inicio a los trabajos del tendido de línea en Media Tensión, se plantaron 2 columnas de H°A° de 12m con sus respectivos accesorios. De acuerdo a planos de ANDE los materiales fueron fiscalizados por la ANDE antes de su colocación.

Víctor Miranda Delgado
Ingeniero
Director de Infraestructura y Obras
Ministerio de la Defensa Pública

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. N° 1178

Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. N° 1.039 - Sauce N° 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Junio - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 14 03 2020

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno | Llovizna | Lluvia ✓ | Otros

LIBRO DE OBRA

Nº 0000118

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: ING. ADOLFO ZALA

FISCAL: ING. VICTOR MIRANDA

EL DIRECTOR DE OBRAS DEL MDP ING. VICTOR MIRANDA, DEFINIÓ LA UBICACIÓN DE LAS BARANDAS A COLOCARSE EN RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDAD DIFERENTE, SIN COLOCACIÓN DE CORDÓN DE H°, TAMBIÉN DEFINIÓ LA UBICACIÓN DEL REVESTIMIENTO DE PIEDRA LAJA EN PARTE INFERIOR DE FACHADA DE CAFETERIA Y PARTE INFERIOR DE FACHADA PRINCIPAL DEL BLOQUE PRINCIPAL.

DEFINIÓ ADEMÁS EL ÁREA DE REVESTIMIENTO DE AZULEJOS A SER COLOCADO DENTRO DE LA COCINA DEL BLOQUE CAFETERIA, COMO ASÍ TAMBIÉN LA UBICACIÓN Y LONGITUD DE LA MESADA DE GRANITO NATURAL.

EL DIRECTOR DE OBRAS DEFINIÓ LA CANTIDAD DE BACHAS DE LOZA EMBUTIDA EN BAÑOS DE PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA DEL BLOQUE PRINCIPAL DE LA SIGUIENTE MANERA:

SEGÚN PLANOS PROYECTADOS POR EL MDP

- EN BAÑOS DONDE SE ENCONTRABAN CON TRES (3) BACHAS SE DISMINUYEN A DOS (2) UNIDADES Y:
- EN BAÑOS DONDE SE ENCONTRABAN CON DOS (2) BACHAS SE DISMINUYEN A UNO (1) BACHA.

CON SUS RESPECTIVAS GRIFERIAS, SIFÓN CROMADO Y DESAGUE PARA SANITARIOS, DISMINUYEN ADEMÁS LAS CANTIDADES DE MESADA DE GRANITO NATURAL, ZÓCALOS DE GRANITO NATURAL Y POLLERA.

SE INFORMA QUE LA CANTIDAD EN PLANILLA DE CONTRATO SE ENCUENTRAN TRECE (13) UNIDADES Y CON ESTA DEFINICIÓN SE COLOCAN DIEZ Y NUEVE (19) BACHAS EN TOTAL.

CONTINÚA EN HOJA 0000119 DEL LIBRO DE OBRA.

Ing. Víctor Miranda Delgado
Director de Infraestructura y Obras
Dirección General de Inversión Pública
Firma Representante del Ministerio de la Defensa Pública

ADOLFO ZALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1178
Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Junio - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 15 08 2020

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno | Llovizna | Lluvia ✓ | Otros

LIBRO DE OBRA

Nº 0000120

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: ING. ADOLFO IRALA

FISCAL: ING. VICTOR MIRANDA

EL DIRECTOR DE OBRAS DEL MDP ING. VICTOR MIRANDA, DEFINIÓ LA UBICACIÓN DEL PORTÓN BASCULANTE PARA ACCESO VEHICULAR, ADEMÁS VERIFICÓ LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAN PARA EL PARQUE INFANTIL, CON LOS DRENAJES CORRESPONDIENTES.

POR DIRECTIVAS DEL DIRECTOR DE OBRAS SE MODIFICAN LAS LUMINARIAS EN PATIOS, REUBICÁNDOSE EN VÉRTICES DE PILARES DE FACHADA FRENTE PAI

Ing. Víctor Miranda Delgado
Director de Infraestructura y Obras
Ministerio de la Defensa Pública

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

ADOLFO IRALA SANCHEZ
Ing. Civil
Reg. M.O.P.C. Nº 1178

Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Junio - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 18 08 2020

ESTADO DEL TIEMPO

Bueno	Llovizna	Lluvia	Otros
		✓	

LIBRO DE OBRA

Nº 0000123

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: ING. ADOLFO PLAZA

FISCAL: ING. HECTOR MIRANDA

CONTINUAN TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE MEDIOLOS EN PERÍMETRO DEL ESPACIO DEL PARQUE INFANTIL.

Ingeniero Víctor Miranda Delgado
Dirección de Infraestructura y Obras
Ministerio de la Defensa Pública

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Junio - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO

GCA S.A.
INGENIERIA INTEGRAL
Aparipy Nº 1444 c/ Caaguazú
Tel.: 021 552 207- 562 062 - 562 063
E-mail: ing.gcasa@gmail.com
Asunción - Paraguay

FECHA 19 | 06 | 2020

ESTADO DEL TIEMPO: Bueno | Llovizna | Lluvia ✓ | Otros

LIBRO DE OBRA

Nº 0000124

OBRA: Construcción de Sede MDP - Horqueta - Contrato Nº 58/2019

RESIDENTE POR LA EMPRESA: ING. ADOLFO LEALA

FISCAL: ING. VICTOR MIRANDA

INICIAMOS TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE VIDRIOS EN FACHADA LATERAL, BLOQUE DE SERVICIOS Y CARPETERIA.

Ing. Víctor Miranda Delgado
Director de Infraestructura y Obras
Ministerio de la Defensa Pública

Firma Representante del Ministerio de La Defensa Pública

Firma Representante de GCA S.A.

IMPRENTA CONTINENTAL - C.H.I. Nº: 1.039 - Sauce Nº 1494 (15 Proyectadas) c/ Morelos
RUC: 479082-0 - Tel.: 021 371 630 / 0981 665 920 - 02 Tal. 50x3 - 0101/00200 - Junio - 2020

ORIGINAL
DUPLICADO - TRIPLICADO
