Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°06/2023 ID Nº 430.057

DISTRITO BENEFICIARIO:

CAAGUAZÚ – DTO. DE CAAGUAZU

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

ARQ. ROSANNA PATRICIA VÁZQUEZ

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2023 -

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

OBRA ANALIZADA:

CONTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LA CIUDAD DE CAAGUAZÚ - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N° 06/2023 ID Nº 430.057.-

FECHA:

02 DE JUNIO DE 2023

CIUDAD:

CAAGUAZÚ. -

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 10/05/2023 con un plazo de ejecución de 150 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº 1**, adjudicadas a la empresa **BOGADO CONSTRUCCIONES**

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de ejecución, he aquí el informe de obras respectivo. -

OBSERVACIONES

Ninguna. -

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 1.-

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Ítem	Descripción del Bien	CANTIDAD CERTIFICADA		
		% Presente Certificado	% Acum hasta el Certificado Anterior	% Porcentaje Acum. Hasta Presente Certificado
1	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° 8 de Diciembre**	100%	0%	100%
2	Replanteo y marcación	40%	0%	40%
3	Nivelación y Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	40%	0%	40%
4	Construcciones Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	40%	0%	40%
5	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	40%	0%	40%
6	Pavimento tipo empedrado	40%		
7	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
8	Limpieza de obra	0%	0%	0%
9	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Ciudad Nueva**	100%	0%	100%
10	Replanteo de obra	100%	0%	100%
11	Nivelación y Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	100%	0%	100%
12	Construcciones Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	100%	0%	100%
13	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	100%	0%	100%
14	Pavimento tipo empedrado	100%	0%	100%
15	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
16	Limpieza final de obra	0%	0%	0%
17	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Constitución**	0%	0%	0%
18	Replanteo y marcación	0%	0%	0%
19	Nivelación y Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	0%	0%	0%
20	Construcciones Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	0%	0%	0%
21	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
22	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%
23	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
24	Limpieza final de obra	0%	0%	0%
25	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Senavitat Costa Rosado**	0%	0%	0%
26	Replanteo y marcación	0%	0%	0%
27	Nivelación y Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	0%	0%	0%
28	Construcciones Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	0%	0%	0%
29	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
30	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%
31	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras Públicas
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

32	Limpieza final de obra	0%	0%	0%
33	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Empalado**	100%	0%	100%
34	Replanteo de obra	100%	0%	100%
35	Nivelación y Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobras	100%	0%	100%
36	Construcciones Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	100%	0%	100%
37	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	100%	0%	100%
38	Pavimento tipo empedrado	100%	0%	100%
39	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
40	Limpieza final de obra	0%	0%	0%
41	**Cartel de Obra 1.80 X 2.00 - B° Florida**	0%	0%	0%
42	Replanteo de obra	0%	0%	0%
43	Nivelación y Regularización de terreno para empedrado. Construcción de caja y retiro de sobrasno	0%	0%	0%
44	Construcciones Cordon de H° de 50cm x 30 cm x 10cm	0%	0%	0%
45	Relleno de Arena o tierra roja (Base de empedrado)	0%	0%	0%
46	Pavimento tipo empedrado	0%	0%	0%
47	Provisión colocación de triturada 6ta terminación	0%	0%	0%
48	Limpieza final de obra	0%	0%	0%
			PORCENTAJE CERTIFICACION	**34,51**

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

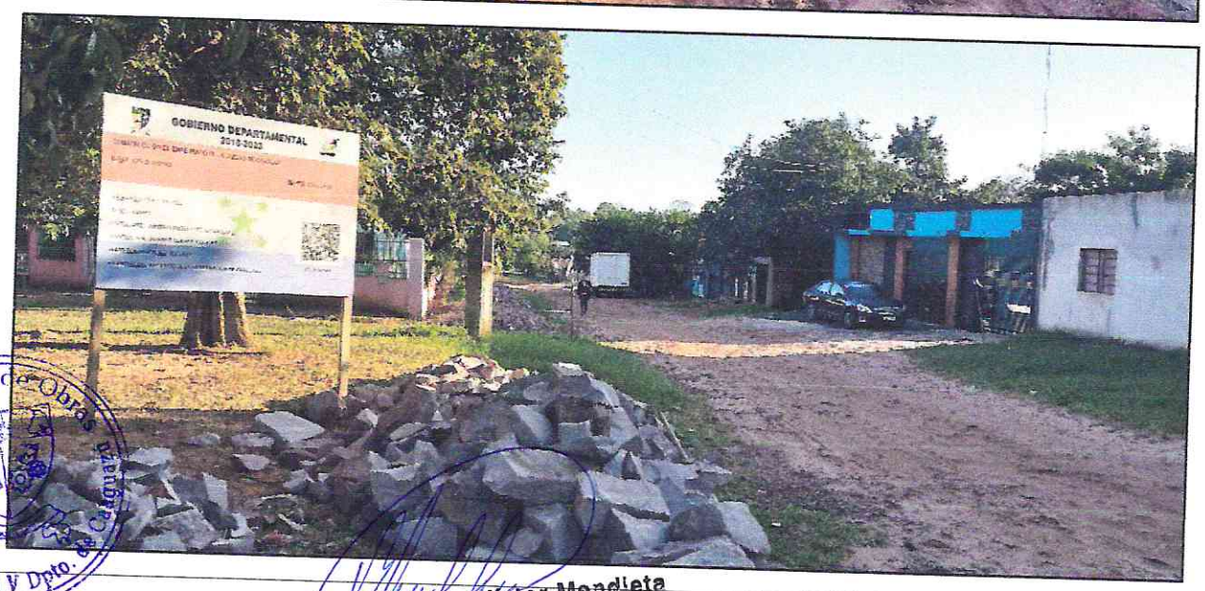

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto.

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú
