MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: Km 25 Acaray - Frente a plaza Cristo Rey

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01

						CERTIFICADOS ACTUAL		
Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit	Total	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares							
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	496.500	1.787.400	3,60	100	1.787.400
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	959,80	2.420	2.322.716	959,80	100	2.322.716
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	959,80	3.190	3.061.762	959,80	100	3.061.762
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada							
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	115,20	26.185	3.016.512	115,20	100	3.016.512
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	959,80	36.790	35.311.042	959,80	100	35.311.042
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	959,80	3.820	3.666.436	959,80	100	3.666.436
	Cordón de Hº							
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	96,00	39.444	3.786.624	96,00	100	3.786.624
8	Cordón cuneta	ml	144,00	109.382	15.751.008	144,00	100	15.751.008
9	Cordón cuneta de (0,10x0,40m)	ml	20,00	101.758	2.035.160	20,00	100	2.035.160
	Muro de PBC							
10	Construcción de muro de piedra bruta colocada (Según EE.TT.)	m3	24,00	431.810	10.363.440	24,00	100	10.363.440
	Compactación							
11	Compactación preliminar	m2	959,80	2.950	2.831.410	959,80	100	2.831.410
12	Compactación final	m2	959,80	3.180	3.052.164	959,80	100	3.052.164
	Limpieza final							
13	Limpieza final	m2	959,80	1.590	1.526.082	959,80	100	1.526.082
TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 45/2023				Total	₲ 88.511.756	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 88.511.756

un unidad
m metro
m2 metro cuadrado
m3 metro cúbico

Monto de Certificado	88.511.756
Descuento de Anticipo	
Fondo de Reparo	4.425.588
Total a Pagar por Certificado	84.086.168

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021 - 2026

Miguel Cáceres
Director de Obras

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 8 Bº Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

MUNICIPALIDAD DE
MINGA GUAZÚ

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras

Avda. Mcal. Estigarribia Esq. Bernardino Caballero– Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA Nº 1

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 25 ACARAY FRENTE DE LA PLAZA CRISTO REY DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 45 /2.023-ID: N° 435.047.

.

CONTRATISTA: SR. JUAN CARLOS BERNAL – ELIAN CONSTRUCCIONES -RUC: 880202-5.

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los Veintiocho días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de Director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL KM 25 ACARAY FRENTE DE LA PLAZA CRISTO REY DISTRITO DE MINGA GUAZU - CONTRATO N° 45 /2.023-ID: N° 435.047."** para la RECEPCION PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **SR. JUAN CARLOS BERNAL – ELIAN CONSTRUCCIONES -RUC: 880202-5.**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente.

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 5 Bº Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Elián CONSTRUCCIONES

de: Juan Carlos Bernal Rodríguez

Construcciones de Edificios
Comercio al por menor de otros Materiales de Construcción
Tales como ladrillos, madera y equipos sanitarios

CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVILES * PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y CALZADAS

Av. Fortín Toledo y Bolivia · Tel:.(061) 574 293 / (0983) 400 102 · Ciudad del Este · Alto Paraná · Paraguay

TIMBRADO Nº 16673164
R.U.C.: 880202 - 5
Fecha Inicio Vigencia 13/09/2023
Fecha Fin Vigencia 30/09/2024

FACTURA

001 - 001 0001465

Fecha de Emisión: 28 de Diciembre de 2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazu

R.U.C.: 80010478-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Tel.:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	I.V.A.5%	I.V.A. 10%
1	Certificado de Obras Nº 1	84.086.168			84.086.168
	Contrato Nº 45/23 Construccion				
	de Pavimento Tipo Empedrado en el				
	Km 25 Acaray Frente de la plaza				
	Cristo Rey del Distrito de Minga Guazu				
	ID: 435047				
Sub Total					84.086.168

Total a Pagar: GS. [X] U$. [ ] (En Letras) Ochenta y cuatro millones ochenta y seis mil ciento sesenta y ocho 84.086.168

Liquidación del IVA: 5% 10% 7.644.197 Total IVA 7.644.197

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrian Jara Y Pa i Perez. entre Banco Vision Y Banco Atlas Nº 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia el mas Vencedor" - RUC 80052469/1- Telefax: 061-512551 - 02 Tal 50x3 del 0001401 al 0001500 - 09/2023 - Cédula de Habilitación de Imprenta Nº 1663

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 8802025 JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ

Teléfono/s : 061-574293 **Website** :

Fax : 061-574293 **Email Corp.:** elianconstruciones@hotmail.com

Dirección : AVENIDA, AV. FORTIN TOLEDO Y LA BLANCA - ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 014867

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 18/10/2024

Otorgado en Asunción, el 18/10/2018

Renovado el 03/11/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

8802025

13042023 1448 8802025 8802025

014867

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 880202

NRO. CERTIFICADO: 414074

FECHA EMISION: 18-12-2023

VENCIMIENTO: 14-01-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 880202

Nro. Certificado: 414074

Razon Social: BERNAL RODRIGUEZ JUAN CARLOS

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES

Fecha de Inscripcion: 14-11-2003

Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0505-84-0479 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Informe de Servicios Personales - FIS

Proveedor Adjudicado

JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ

RUC

880202-5

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 435047 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 25 ACARAY - FRENTE DE LA PLAZA CRISTO REY DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU

Monto del contrato

88.511.756

Año: 2023 **Periodo:** Diciembre

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Funciones Exclusivas	Remuneración	Relación	Estado
1	Altagracio Iran	Bernal Rodriguez	Cumplio	1855638	Contratista	Activo

Usuario Impresión: elianconstruciones

Fecha Impresión: 18/12/2023

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNCP DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Formulario de Identificación del Personal - FIP

Proveedor Adjudicado

JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ

RUC

880202-5

Entidad Contratante

Municipalidad de Minga Guazú

Descripción del llamado / Contrato

ID: 435047 / CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 25 ACARAY - FRENTE DE LA PLAZA CRISTO REY DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU

Monto del contrato

88.511.756

Empleados vinculados al contrato

Nro.	Nombres	Apellidos	Nro. Documento	Dedicación	Relación	Fecha desvinculación
1	Altagracio Iran	Bernal Rodriguez	1207290	EXCLUSIVA	LABORAL	

Usuario Impresión: elianconstruciones

Fecha Impresión: 18/12/2023

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS **NUMERO 4270167490040**

FORM.427-1 **FECHA 16/12/2023**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	880202	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	BERNAL RODRIGUEZ JUAN CARLOS

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 15/01/2024 NÚMERO DE CONTROL : A7CA090D

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

4271880202A7CA090D

Elián CONSTRUCCIONES

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 25 ACARAY - FRENTE DE LA PLAZA CRISTO REY DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU. ID Nº: 435.047

Contrato Nº 45/23 - Monto: 88.511.756.

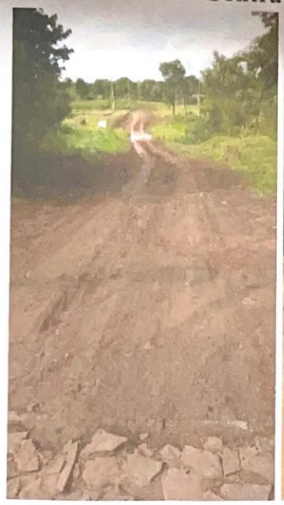

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Elián CONSTRUCCIONES

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Licitación 435047 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO KM 25 ACARAY - FRENTE DE LA PLAZA CRISTO REY DEL DISTRITO DE MINGA GUAZU.
Contrato Nº 45/23 - Monto: 88.511.756.

ELIAN CONSTRUCCIONES
TELEF.:574 293
KM 6 Bº Don Bosco-Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este- Paraguay

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo empedrado
Contratante: Municipalidad de Minga Guazú
Fiscalización: Dirección de Obras
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Km 25 Acaray - Frente a la Plaza Cristo Rey

DESCRIPCIÓN

A los efectos de realizar un control de Obras se establece la necesidad de Contar Con un libro de Obras que quedara en Custodia y responsabilidad del Contratista Cuyas páginas Seran enumeradas y Cada una de ellas firmadas por el Fiscal designado por la municipalidad.
En dicho Libro de Obras Se dejara Constancia y control de todos los trabajos realizados desde la preparación de la Obra hasta la recepción definitiva.
Por lo tanto en el dia de la fecha nos constatamos en el lugar de la Obra ~~hasta~~ Correspondiente al Contrato Nº 45/2023 adjudicado a la Empresa Elian Construcciones
Así, habiendo realizado la apertura del Libro de Obras se ha realizado los trabajos de preparación de Obra.

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Dirección Obras y Servicios Municipalidad de Minga Guazú Período 2021-2025

.....
Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de Pavimento tipo Empedrado
Contratante: Municipalidad de Minga Guazú
Fiscalización: Dirección de Obras
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Km 25 Acaray - Frente a la plaza Cristo Rey

DESCRIPCIÓN

Semana.
* Trabajos de preparación de Suelo con motoniveladora (cajeo de zanja)
* Acopio de Materiales (Piedra bruta basaltica) (Cordón prefabricado 10x50x30cm)
* Acopio de Materiales (Cordón Cuneta) (Cordón Cuneta 0,10x0,40m)
* Acopio de Materiales (Cemento y arena para colocación de cordones)
* Preparación de suelo de tierra colorada para Colchón, colocación de Cordón (10x50x30cm) c/protección Lateral, Colocación de piedra a mano y martillo
* Colocación de Cordón Cuneta
* Esparcido de tierra colorada sobre empedrado para relleno
* Fiscal de Obras verifica los trabajos realizados y toma varias fotografías

Semana
* Preparación de tierra colorada para Colchón, colocación de Cordón (10x50x30cm) c/protección Lateral, Colocación de piedra a mano y martillo
* Colocación de Cordón Cuneta
* Esparcido de tierra colorada sobre empedrado para relleno
* Fiscal de Obras verifica los trabajos realizados y toma varias fotografías

Semana
* Preparación de tierra colorada para Colchón, Colocación de Cordón (10x50x30cm) c/protección Lateral, Colocación de piedra a mano y martillo
* Colocación de Cordón Cuneta
* Esparcido de tierra colorada sobre empedrado para relleno
* Fiscal de Obras verifica los trabajos realizados y toma varias fotografías

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras y Servicios
Período 2021-2025

.....
Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de pavimento tipo empedrado
Contratante: Municipalidad de Minga Guazú
Fiscalización: Dirección de Obras
Contratista: Elián Construcciones
Ubicación de la Obra: Km 25 Acaray - Frente a la plaza Cristo Rey

DESCRIPCIÓN

Semana
* Preparación de suelo de tierra colorada para colchón, Colocación de cordones (10x50x300m) c/ protección lateral, Colocación de piedra a mano y pisó martillo
* Colocación de Cordón Cuneta
* Colocación de Cartel de Obra
* Esparcido de tierra colorada sobre empedrado para relleno

Semana
* Preparación de suelo de tierra colorada para colchón, Colocación de cordones (10x50x300m) c/ protección lateral, Colocación de piedra a mano y martillo
* Colocación de Cordón Cuneta
* Colocación de Cordón Cuneta (0,10x0,40 m)
* Se realizan trabajos de Construcción de Muro de piedra bruta colocado
* Esparcido de tierra colorada sobre empedrado para colchón
* Fiscal de Obras verifica los trabajos realizados y toma varias fotografías

Semana
* Preparación de suelo de tierra colorada para colchón, Colocación de cordones (10x50x300m) c/ protección lateral, Colocación de piedra a mano y martillo
* Colocación de Cordón Cuneta
* Colocación de Cordón Cuneta (0,10x0,40 m)
* Se realizan trabajos de Construcción de Muro de piedra bruta colocado
* Esparcido de tierra colorada sobre empedrado para relleno
* Fiscal de Obras verifica los trabajos realizados y toma varias fotografías

ELIÁN CONSTRUCCIONES
Tel: 574293
B° Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2025

Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista

Elián CONSTRUCCIONES

LIBRO DE OBRA
Nº

Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Obra: Construcción de pavimento Empedrado
Contratante: Municipalidad de Minga Guazú
Fiscalización: Dirección de Obras
Contratista: Elían Construcciones
Ubicación de la Obra: Km 25 Acaray - Frente a la Plaza Cristo Rey

DESCRIPCIÓN

Semana
* Preparación de Suelo de tierra Colorada para Colchón, Colocación de cordones (10x50x30cm) c/protección Lateral, Colocación de piedra a mano y ~~colocación~~ martillo
* Colocación de Cordón Cuneta
* Colocación de Cordón Cuneta (10x40x10cm)
* Trabajos de Construcción de Muro de Piedra bruta Colocada
* Esparcido de tierra Colorada Sobre empedrado para relleno
* Trabajos de Compactación Pro eliminar
* Fiscal de obras Verifica los trabajos realizados y toma Varias Fotografías

Semana
* Preparación de Suelo de tierra Colorada para Colchón, Colocación de cordones (10x50x30cm) c/protección Lateral, Colocación de piedra a mano y martillo
* Colocación de Cordón Cuneta
* Se realiza Trabajos de Compactación con rodillo mecanico, 4 pasadas
* Acopio de Triturada VI (sexta) y esparcido sobre empedrado
* Se realiza mediciones de la obra a los efectos de solicitar las certificaciones
* Tomas fotograficas para la documentación correspondiente

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección de Obras y Servicios
Período 2021-2025

Por el Contratante

Fecha:

1º Vía: Contratante - 2º Vía: Contratista
