Informe a la Gobernación de Amambay

Obras: Terminación de Escuelas

Reforma Hospital Juan Pablo II -

Reforma Sede Gubernativa -

Pavimento Tipo empedrados.

Mes mayo del 2020.

Profesional:

Ing. Félix Gómez Coronel.
RP. M.O.P.C. N° 2478.

Mayo - 2020

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME A LA SECRETARÍA DE OBRAS DE LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Sr. Carlos Ortiz, Secretario de obras de la Gobernación de Amambay.

Obras: Terminación de Escuelas Faltantes del Contrato N° 26/2019.

Informe de: Ing. Felix Gomez Coronel – Fiscal de Obras.

ESCUELA BASICA N° 4.668 – SAN ISIDRO – BELLA VISTA – CONTRATO N° 26/2019 – CONSTRUCCIÓN DE 1(UN) AULA PARA NIVEL INICIAL

En esta escuela se están realizando los últimos trabajos para su culminación, en este caso se está realizando los trabajos de colocación de vidrios, pinturas, colocación de ventiladores, colocación de luminarias, instalaciones eléctrica e instalaciones hidrosanitarias.

OBS: Obra terminada.

ESCUELA BASICA N° - MARIA AUXILIADORA- CONTRATO N° 26/2019

En esta escuela también se realizan los trabajos finales, se estan realizando los trabajos de colocación de vidrios, colocación de luminarias, colocación de ventiladores, parte final de pinturas y de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarias.

OBS: Obra terminada.

COLEGIO NACIONAL SANTA CLARA – CONSTRUCCIÓN DE UN 1(un) SANITARIO DIFERENCIADO E INCLUSIVO – CONTRATO N° 26/2019

Este baño diferenciado ya está en fase de culminación se está realizando los trabajos de colocación de vidrios, colocación de aberturas, terminación de la pinturas y de las instalaciones eléctricas y las instalaciones hidrosanitarias.

OBS: Obra terminada – todos los trabajos se adecuaron a las exigencias de las especificaciones técnicas del PBC.

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME A LA SECRETERÍA DE OBRAS DE LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Sr Carlos Ortiz, secretario de obras del Gobierno Departamental

Obras: Reformas y mejoras del Hospital Juan Pablo II(Barrio Obrero) y de la Construcción de pavimentos tipo empedrado en Callejón mafussi y calle José Santos Lugo – Sede Gubernatva

HOSPITAL JUAN PABLO II – REFORMAS Y MEJORAS – BARRIO OBRERO

En este hospital continua los trabajos de reformas para mejorar el atendimiento a las personas que diariamente frecuentan este local, por tal motivo se está realizando algunas mejoras y reformas del local de acuerdo a las exigencias del MSP. Los trabajos realizados son el cambio total del techo, cambio de forros, demolición de paredes para una mejor ventilación y circulación de personas y pacientes, refuerzos en algunos pilares, instalación nueva de desagüe pluvial, colocación de lavatorios para las manos (nueva exigencia), colocación de ladrillos de vidrio para mejor iluminación, cambios de luminarias, manutención de las instalaciones hidrosanitarias, cambios y colocación de aberturas, pinturas en general.

OBS: Obra terminada.

OBRA: SALÓN DE ACTOS POLIDEPORTIVO – CONTRATO N° 24/2019

En el polideportivo continúan los trabajos de la construcción del salón de actos se han realizando los trabajos de fundación (pilotes,cabezales) vigas de H°A°, pilares de H°A°, losa pré fabricada, actualmente se inicia a levantar las paredes y revoques para luego empezar a realizar los trabajos de techos y las instalaciones eléctricas.

OBS: Obras en fase de terminación.

TEATRO EMILIANO R. FERNANDEZ – MEJORAS- CONTRATO N°24/2019

En este salón de actos han comenzado las mejoras de este inmueble con los trabajos de manutención de las instalaciones eléctricas e hidrosanitarios y de las pinturas en general, ya se realizó los reparación de techos y cambios de rufos y canaletas

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

INFORME A LA SECRETARÍA DE OBRAS DE LA GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

Para: Carlos Ortiz, Secretario de Obras del Gobierno Departamental

Obras: Pavimento tipo empedrado – Contrato N° 03/2020

Local: Callejón Mafussi y Calle Jose Santos Lugo

Informe de: Ing. Civil Felix Gomez Coronel, Fiscal de Obras

CALLEJON MAFUSSI – Contrato N° 03/ 2020

Sigue avanzando los trabajos del pavimento tipo empedrado sobre este callejón, los trabajos ejecutados son:

- Marcación.
- Nivelación.
- Perfilación para caja.
- Colocación de cordones.
- Colchón de arena
- Colocación de las piedras basáltica.
- Colocación de polvo de piedra.
- Compactación.

TRABAJOS EJECUTADOS HASTA LA FECHA

N°	LOCAL	UNIDAD	CANTIDAD
01	CALLEJÓN MAFUSSI	ML	1.700,00

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

EMPEDRADO CALLE JOSE SANTOS LUGO BARRIO OBRERO – CONTRATO N° 03/2020

Sobre esta calle también se está realizando los trabajos de pavimentación tipo empedrado y los trabajos ejecutados son:

- Marcación.
- Nivelación.
- Perfilado para caja.
- Colocación de cordones.
- Colocación de colchón de arena.
- Colocación de las piedras basáltica.
- Colocación de polvo de piedras.
- Compactación

TRABAJOS EJECUTADOS HASTA LA FECHA

N°	LUGAR	UNIDAD	CANTIDAD
01	JOSE SANTOS LUGO	ML	600,00

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P. [illegible]
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

ESCUELA SAN ISIDRO- BELLA VISTA

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

ESCUELA MARÍA AUXILIADORA - COLONIA MARÍA AUXILIADORA

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

COLEGIO SANTA CLARA - COLONIA SANTA CLARA

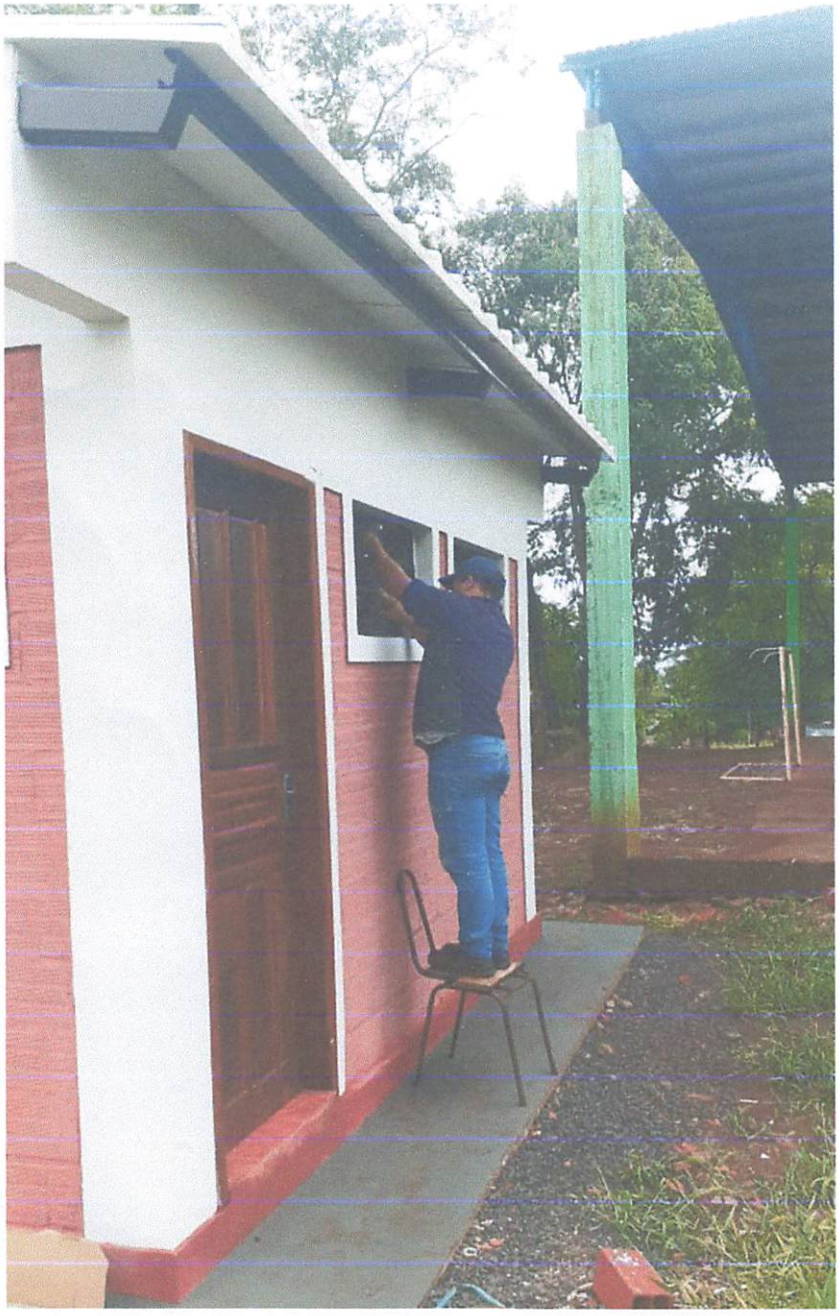

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2479
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

HOSPITAL JUAN PABLO II

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL

PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES

Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.

Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní

Pedro Juan Caballero - Paraguay

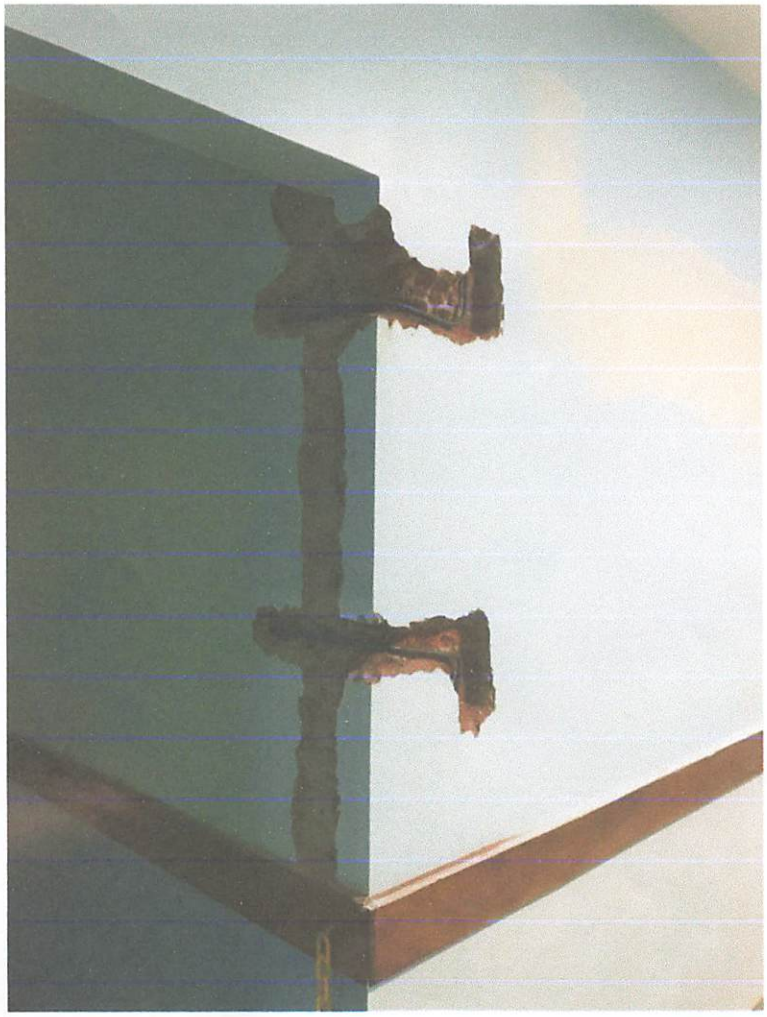

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

TEATRO EMILIANO R. FERNÁNDEZ

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C. P 7475
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

SALÓN DE ACTOS POLIDEPORTIVO

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

CALLEJÓN MAFUSSI

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 4475
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY

INGENIERO CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES - TASACIÓN DE INMUEBLES URBANOS Y RURALES
Teléfonos: (0336) 270 756 / (0971) 558 859 / (067) 9952-4134 Br.
Lomas Valentinas esq. Gral. Diaz Nº 1210 - Bº Guaraní
Pedro Juan Caballero - Paraguay

CALLE JOSÉ SANTOS LUGO

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF M.O.C.P 247
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACIÓN DE AMAMBAY
