Encarnación, 6 de Setiembre del 2023

Señor:
Intendente Municipal de Encarnación
ALFREDO LUIS YD SANCHEZ
Presente

Oferente: *San Pablo Metalúrgica - Construcciones.-*
Convocante: *Municipalidad de Encarnación.-*
Modalidad: *Licitación Concurso de Oferta Nº 02/2023.-*
Id del Llamado Nº: *422.786.-*
Nombre del Llamado: *Reparación y cambio de techo del Hospital Pediátrico Municipal*

Tengo el Agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a donde corresponda, a los efectos de solicitar la aceptación y aprobación del Certificado de Obra N° 4 con relación al Contrato Nº 16/2023" **Reparación y cambio de techo del Hospital Pediátrico Municipal ".-**

Acompaña la presente solicitud los siguientes documentos.-.

1.- Acta de Medición N° 4
2.- Certificado de Obra N° 4 / 2023
3.- Factura correspondiente al Certificado de Obra
4.- Certificado de Cumplimiento Tributario
5.- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social
6.- Imágenes Fotográfica de los Trabajos

Sin Otro particular y en espera de una respuesta favorable le saludo muy atentamente.

San Pablo Metalúrgica - Construcciones"
Miguel A. Golasik
Representante Legal

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2 986 184-5

ACTA DE MEDICION

OBRA: C.O. N° 02/2023 ¨ Reparación y cambio de techo del Hospital Pediátrico Municipal con ID: 422.786.-

CONTRATISTA: Miguel Ángel Golasik - San Pablo Metalúrgica Construcciones

En el Distrito de Encarnación, Departamento de Itapuá, República del Paraguay, a los 6 días del mes de Setiembre de 2023, se reúnen en representación de la Municipalidad de Encarnación, el Arq. Edgar Fernández, como Fiscal de Obra y el Sr Miguel Ángel Golasik como representante legal de San Pablo Metalúrgica - Construcciones empresa contratista de la obra ¨ **Reparación y cambio de techo del Hospital Pediátrico Municipal.-**¨

Suscriben el presente Acta los representante arriba mencionados, los mismo han procedidos a la verificación de los trabajos ejecutados. En la Verificación realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Contrato y los resultados se anexan en la planilla de Certificación Obra N° 4 /2023.

De plena conformidad de las partes, se suscriben el presente Acta en tres (3) ejemplares de un mismo tenor y aun solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba.

Miguel A. Golasik
Representante Legal
San Pablo Metalúrgica - Construcciones

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Dirección de Desarrollo Urbano y Territorial

Arq. Edgar Fernández
Fiscal de Obra
Municipalidad de Encarnación

Arq. Edgar Fernandez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

EMPRESA CONTRATISTA: *San Pablo Metalurgica - Construcciones*

RESUMEN DE CERTIFICADO BASICOS DE OBRAS

CERTIFICADO OBRA N° 4

OBRA: *Reparación y cambio de techo del Hospital Pediátrico Municipal - CIUDAD DE ENCARNACION*

CONTRATO N°: 16 / 2023

ID N°: 422.786

PERIODO: 07 / 2023

MONTO DEL CONTRATO: 541.050.354 Gs.-

DESCRIPCION	CANTIDADES A EJECUTAR				MONTO EN GUARANIES		
	Monto del Contrato	*% Acumulada Anterior*	*% Ejecutado en el periodo*	*Acumulada Actual*	*Certificado Acumulado Anterior*	*Certificado Actual*	*Certificado Acumulado*
Certificado Obra N° 4	541.050.354	66,87%	15,58%	82,44%	361.779.739	84.269.615	446.049.354
					ESTE CERTIFICADO	***84.269.615***	

RESUMEN

	Monto del Contrato	*Certificado Acumulado Anterior*	*Certificado Actual*	*Certificado Acumulado*
A) Deduciones de anticipo	108.210.071	18.088.987	4.213.481	22.302.468
B) Multas según Clausulas del Contrato	0	0	0	0
Total Deduciones (A + B)				4.213.481
MONTO DE CERTIFICADO				80.056.134
C) Retencion para fondo de reparo (5%)	27.052.518	18.088.987	4.213.481	22.302.468
MONTO DE FACTURA				75.842.654
RETENCIONES ACUMULADA PARA FONDO DE REPAROS				22.302.468

Arq. Edgar Fernandez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Dirección de Desarrollo Urbano y Territorial

Miguel Angel Golasik B.
San Pablo Metalurgica y Construcciones
Contratista

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Contratista: Miguel Angel Golasik B. - San Pablo Metalurgica - Construcciones

Fecha: 06/09/2023

Reparación y cambio de techo del Hospital Pediátrico Municipal con ID: 422786

Ítem	Descripción del Bien	CONTRATO				CANTIDAD EJECUTADA			MONTO			PORCENTAJE		
		Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado
1	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1,00	4.785.950	4.785.950	1,00	0,00	1,00	4.785.950	0	4.785.950	100%	0%	100%
2	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	1.190,37	24.460	29.116.450	1.190,37	0,00	1.190,37	29.116.450	0	29.116.450	100%	0%	100%
3	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	1.190,37	204.430	243.347.339	1.190,37	0,00	1.190,37	243.347.339	0	243.347.339	100%	0%	100%
4	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros	20,00	78.330	1.566.600	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
5	Servicio de instalación de canaletas de descarga	Metros cuadrados	213,00	70.070	14.924.910	180,00	0,00	180,00	12.612.600	0	12.612.600	85%	0%	85%
6	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada	Metros cuadrados	85,00	63.400	5.389.000	85,00	0,00	85,00	5.389.000	0	5.389.000	100%	0%	100%
7	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	13,50	178.530	2.410.155	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
8	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	65,00	275.370	17.899.050	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
9	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.027.460	1.027.460	0,50	0,00	0,50	513.730	0	513.730	50%	0%	50%
10	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	805,00	26.700	21.493.500	245,00	360,00	605,00	6.541.500	9.612.000	16.153.500	30%	45%	75%
11	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	805,00	205.770	165.644.850	245,00	360,00	605,00	50.413.650	74.077.200	124.490.850	30%	45%	75%
12	Servicio de instalación de canaletas de descarga	Metros cuadrados	72,00	71.410	5.141.520	72,00	0,00	72,00	5.141.520	0	5.141.520	100%	0%	100%
13	Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada	Metros cuadrados	60,00	65.300	3.918.000	60,00	0,00	60,00	3.918.000	0	3.918.000	100%	0%	100%
14	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	10,50	187.870	1.972.635	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
15	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	16,50	187.870	3.099.855	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
16	Construccion/Colocacion de techo/tinglado	Metros cuadrados	75,00	242.030	18.152.250	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0%	0%	0%
17	Limpieza de obra	Unidad Medida Global	1,00	1.160.830	1.160.830	0,00	0,50	0,50	0	580.415	580.415	0%	50%	50%
Precio Total					541.050.354	**MONTO BRUTO**			84.269.615		446.049.354	66,87%	15,58%	82,44%
						Descuento 5% por Anticipo			4.213.481					
						Descuento 5% Retencion Fondo Reparo			4.213.481					
						Monto Neto a Cobrar			***75.842.654***					

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
Dirección de Desarrollo Urbano y Territorial

Arq. Edgar Fernandez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

Miguel Angel Golasik B.
San Pablo Metalúrgica y Construcciones
Contratista

Metalúrgica y Construcción San Pablo

de Miguel Angel Golasik B.

Metalúrgicas: - Aberturas de Chapa Plegada - Aberturas Metálicas - Barandas y Pasamanos - Carpinterías Metálicas - Chapas Plegadas - Corte y Doblado de Chapas - Cortinas Metálicas - Cortinas Metálicas, Accesorios - Dobleces de Chapa - Escaleras Metálicas - Estructuras Metálicas. **Herrerías:** - Herrería de Obras - Rollos para Cortinas de Arrollar - Portones - Tinglados. **Construcciones en General. Anexo:** Construcción de Proyectos de Servicios Públicos

Cel. (0984) 454 105 — Avda. Los Lapachos Barrio San José km 11 - Natalio - Itapúa - Py

Nº DE TIMBRADO 16.277.448
FECHA INICIO VIGENCIA 13 DE MARZO DE 2023
FECHA FIN DE VIGENCIA 31 DE MARZO DE 2024
R.U.C. 2986184 - 5

FACTURA

Nº 001-0010000646

FECHA: 6 DE Setiembre DE 2023 — CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☒

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Municipalidad de Encarnación

R.U.C. 3990054-8 — NOTA DE REMISIÓN Nº:

DIRECCIÓN: — TEL.:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTAS EXENTAS	5%	10%
01	Pago por certificado de Obra N 4 en relación al contrato Nº 16/2023 Refacción y cambio de techo del Hospital Pediátrico Municipal				75.842.654.-
SUBTOTAL:					75.842.654.-

TOTAL A PAGAR: Setenta y cinco millones ochocientos cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y cuatro — GS. 75.842.654.-

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 6.894.787.- — TOTAL IVA: 6.894.787.-

Imprenta Gráfica

Nº HABILITACIÓN IMPRENTA: 2151
DE ROBIN DAVID HUT HEIL - R.U.C. 3791433 - 2
KURUPAYTY CAS. AVDA. CABALLERO ALVAREZ
NATALIO - ITAPÚA - PY - CEL. (0985) 706608

CANTIDAD IMPRESA: 601 AL 750

ORIGINAL: COMPRADOR
DUPLICADO: ARCHIVO TRIBUTARIO
TRIPLICADO: CONTABILIDAD - No válido para crédito fiscal

IMÁGENES FOTOGRAFICAS

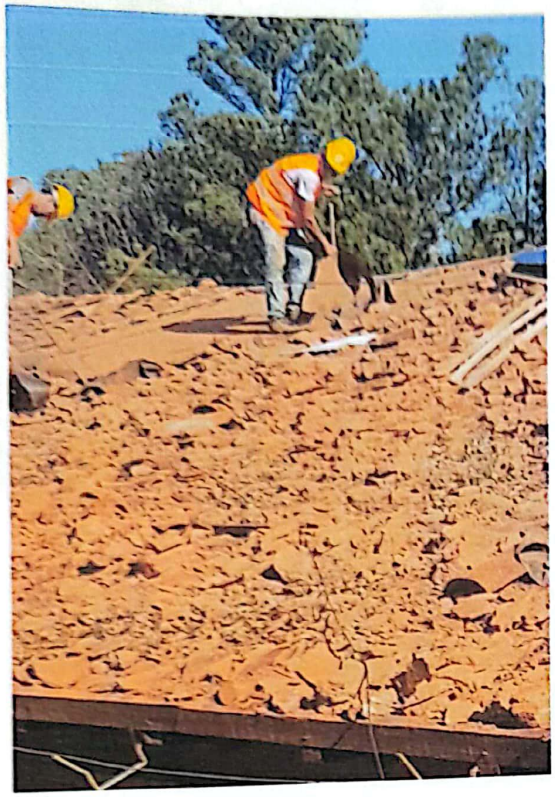

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Telf. (595) 984 464106
E-mail: miguelgolasik184@gmail.com
Natalio - Itapúa

IMÁGENES FOTOGRAFICAS

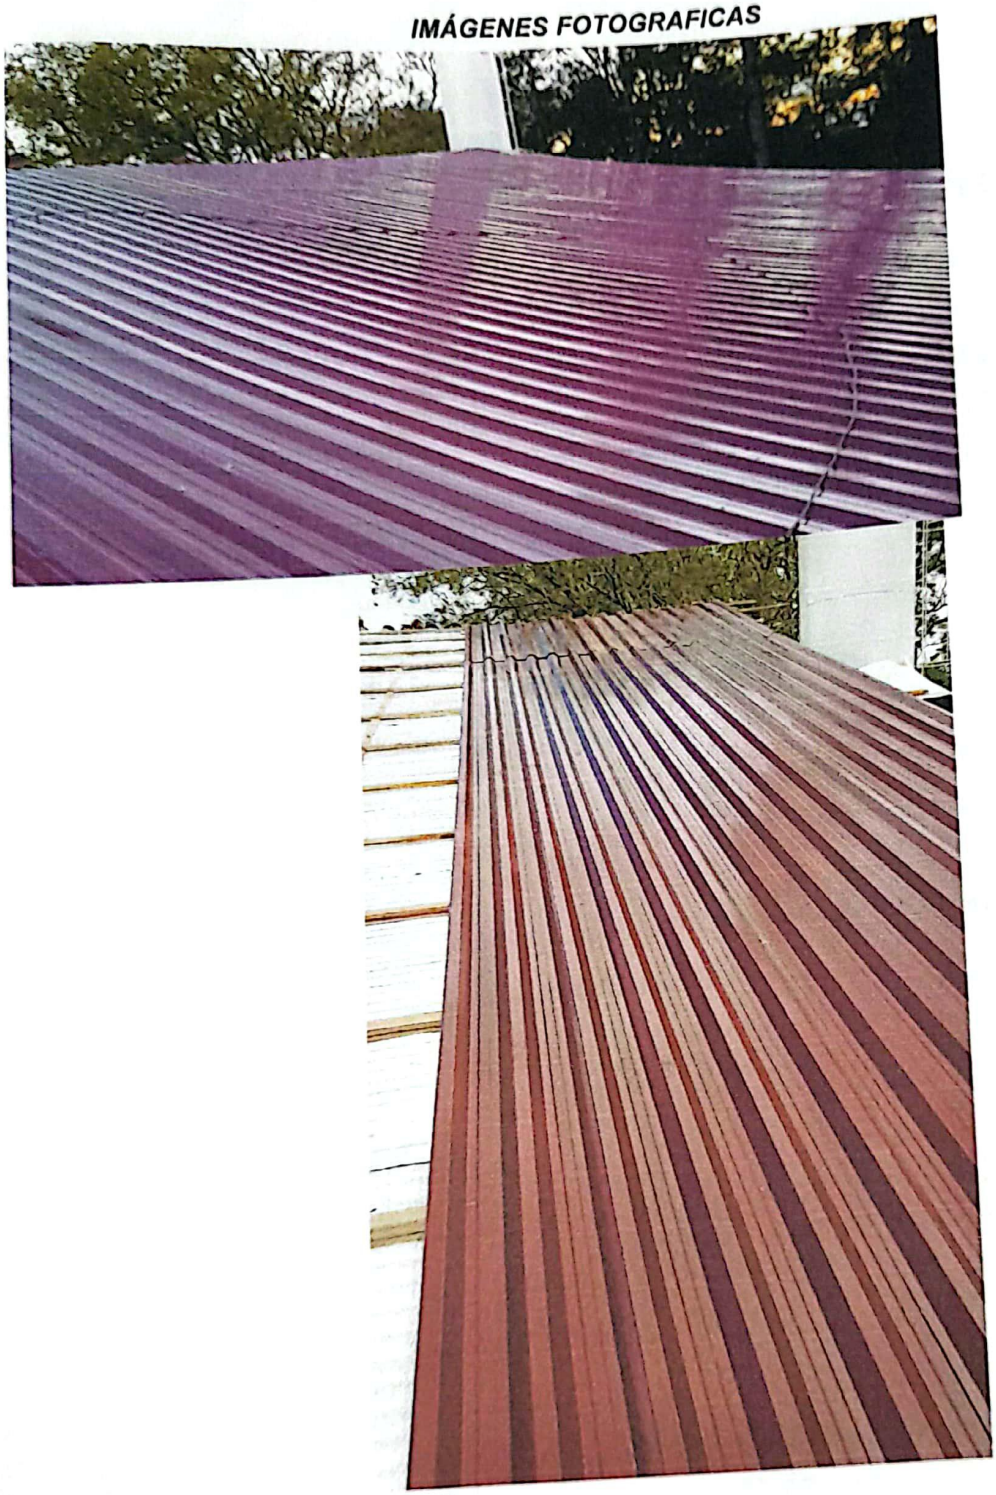

San Pablo
Metalúrgica - Construcci
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Telf. (595) 984 454105
E-mail: miguelgolasik184@gmail.com
Natalio - Itapúa
