Encarnación, 18 de diciembre de 2023

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
MESA DE ENTRADA
Expte N°: 9755
Fecha: 21 DIC 2023 Hora: 11:21
Firma: R Fojas:

Señor.
Francisco Javier Pereira Rieve
Gobernador del Departamento de Itapúa.
Presente.

REFERENCIA: Licitación por Contratación Directa N° 42/2022 - Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 421021.

De mi mayor consideración.
Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de presentar el Certificado de Obras N° 02 del Contrato N° 09/2023 de referencia, correspondiente al mes de noviembre del corriente año.
Para el efecto adjunto a la presente nota todos los documentos con las mediciones y resúmenes correspondientes.
El monto neto del presente certificado es de guaraníes, **17.652.000** (Diecisiete millones seiscientos cincuenta y dos mil).

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

.....
Rolando Javier Cano Benítez
CONTRATISTA
Rolando Cano
Tec. en Construcción Civil
C.I. 3.470.757

GOBERNACION DE ITAPÚA

Resúmen del Certificado Básico Nº 02

Mes: Noviembre

Contratación Directa N° 42/2022 - Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID:

Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
			Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
	%	(1)	% Avance de Obra	(2)	% Avance de Obra	(3)	% Avance de Obra	(2+3)
Certificaciones de Obra Ejecutada por Precio Unitario								
' 1 - Refacción en la Junta de niento del Barrio Kurupayty del de Encarnación	100,00%	75.250.000	70,68%	53.185.000	29,32%	22.065.000	100,00%	75.250.000
or Contrato	**100,00%**	**75.250.000**	70,68%	**53.185.000**	29,32%	**22.065.000**	100,00%	**75.250.000**

ciones a la fecha			Hasta Certificado Anterior	Presente Certificado	Total Certificado a la Fecha
ción de Anticipo	*20,00%*	15.050.000	10.637.000	4.413.000	15.050.000
ondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
Deducciones		**15.050.000**	**10.637.000**	**4.413.000**	**15.050.000**
e Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				17.652.000	
				0	
rte Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				**17.652.000**	

Certificado Básico Nº 02
Mes: Noviembre
Contrato N°: 09/2023
Monto Básico: 75.250.000 gs
Contratista: Rolando Javier Cano Benitez
Fecha de Inicio: 19/Octubre/2023
Plazo de Ejecución: 120 dias
Fecha de Terminación: 16/Febrero/2024

ANIES: Diecisiete millones seiscientos cincuenta y dos mil.

etario de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Ing. Fernando Oreggioni
Secretario Departamental de Obras Públicas y Transporte
Gobernación de Itapúa

Arq. Maria Lidia Plano de Egea
Fiscal de Obras
Gobernacion de Itapúa

Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

Rolando Javier Cano Benitez
Contratista

ACTA DE MEDICIÓN

CERTIFICADO BASICO N° 02

CONTRATO N° 09/2023

REFERENCIA: Licitación por Contratación Directa N° 42/2022 - Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 421021.

CONTRATISTA: Rolando Javier Cano Benítez

En la Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los 15 días del mes de diciembre del año 2023, se reúnen en representación de la Gobernación de Itapúa, la Arq. Arq. María Lidia Plano de Egea, encargado de la Verificación y Fiscalización de las Obras, y el sr. Rolando Javier Cano Benítez, Representante legal de la empresa Rolando Javier Cano Benítez, para la;

- **Lote N° 1 -** Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación.

Quienes suscriben la presente Acta, han procedido a la verificación y medición de los trabajos ejecutados durante el mes de noviembre del presente año.

En la verificación y medición realizada se observó que las obras se encuentran de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y los resultados se anexan en las planillas correspondientes.

De plena conformidad de las partes, se suscribe el presente Acta en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba. -

Rolando Javier Cano Benítez
Representante Legal
Rolando Cano
Téc. en Construcción C...
C.I. 3.470.787

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
Gobernación de Itapuá

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 02

PLANILLA DE MEDICIÓN Y CERTIFICADO

tación Directa N° 42/2022 - Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio
o de Encarnación - Plurianual con ID: 421021

ndo Javier Cano Benitez	**CONTRATO N°:** 09/2023
TA: 75.250.000 gs	**PLAZO:** 120 dias
	FECHA: 15/12/2023

n la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty			Rolando J. Cano		Incidencia del Rubro sobre el Total	PLANILLA DE MEDICIÓN N° 02						PLANILLA DE CERTIFICADO BÁSICO N° 02					
						EN PORCENTAJE			EN INCIDENCIA			CANTIDAD EJECUTADA			CANTIDAD EJECUTADA EN GS.		
Descripción del Bien	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**		ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL	ACUMUL. ANTERIOR	PRESENTE	ACUMUL. TOTAL
hormigon armado	Unidad																
gón armado de 0,10 m, alisado con k=210 kg/cm2	Costo por Mil	188	230.000	43.240.000	0,575	100%	0%	100%	0,575	0,000	0,575	188	0,00	188,00	43.240.000	0	43.240.000
pisos - contrapisos	Unidad																
obre estructura de madera	Unidad	60	236.000	14.160.000	0,188	0%	100%	100%	0,000	0,188	0,188	0	60,00	60,00	0	14.160.000	14.160.000
	Unidad																
	Unidad	255	39.000	9.945.000	0,132	100%	0%	100%	0,132	0,000	0,132	255	0,00	255,00	9.945.000	0	9.945.000
ntura	Unidad																
or al latex	Unidad	255	31.000	7.905.000	0,105	0%	100%	100%	0,000	0,105	0,105	0	255,00	255,00	0	7.905.000	7.905.000
Precio Total				**75.250.000**	**100%**				**70,68%**	**29,32%**	**100,00%**				**53.185.000**	**22.065.000**	**75.250.000**

Rolando Javier Cano Benitez
CONTRATISTA
Rolando Cano
Ing. en Construcción Civ.
C.I. 3.470.767

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

María Lidia Plana de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 02

Licitación por Contratación Directa N° 42/2022 - Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del Distrito de Encarnación - Plurianual con ID: 421021

Contrato N°: 09/2023	
Monto del Contrato: 75.250.000 gs	**Term. Prevista:** 16/Febrero/2024
Plazo Contractual: 120 dias	**Ampliaciones:**
Inicio de Obra: 19/Octubre/2023	**Mes:** Noviembre

CUADRO DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

Contrato N°: 09/2023

MES	PREVISTO GS.		EJECUTADO GS.		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OCTUBRE 19/10/2023	9.945.000	9.945.000	53.185.000	53.185.000	13,22%	13,22%	70,68%	70,68%
NOVIEMBRE	43.240.000	53.185.000	22.065.000	75.250.000	57,46%	70,68%	29,32%	100,00%
DICIEMBRE	14.160.000	67.345.000			18,82%	89,50%		
ENERO	5.270.000	72.615.000			7,00%	96,50%		
FEBRERO 16/02/2024	2.635.000	75.250.000			3,50%	100,00%		

CURVA DE AVANCE PREVISTO Y EJECUTADO

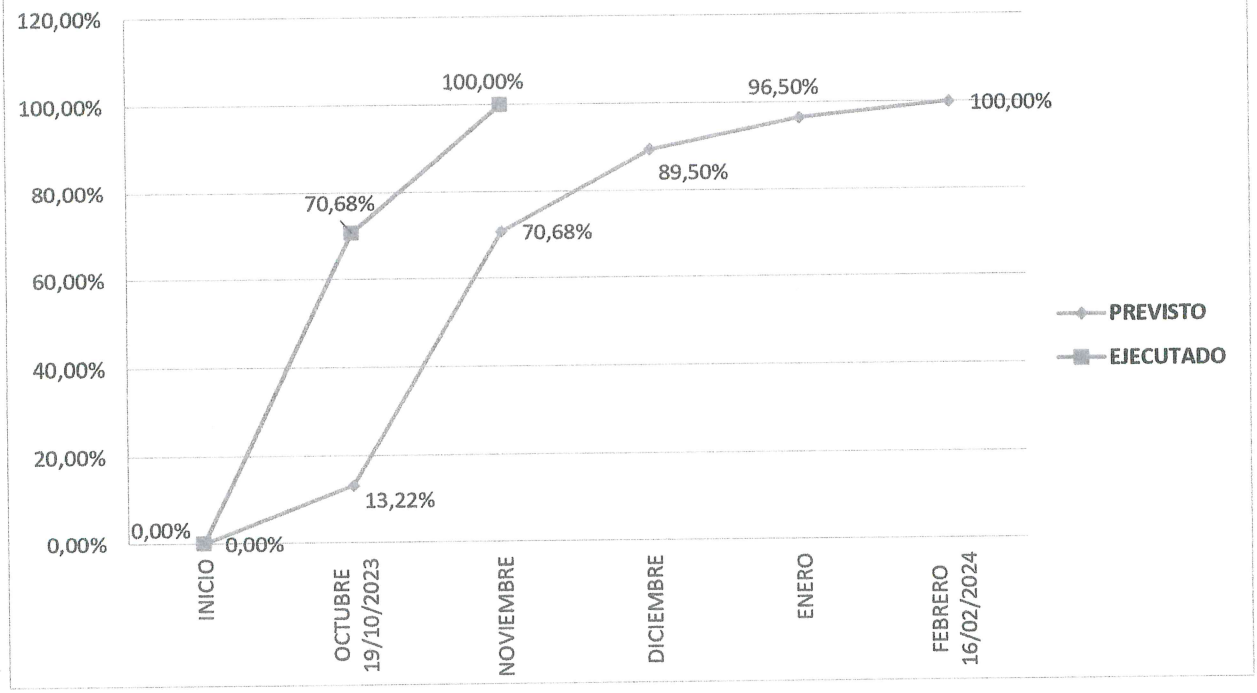

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS N° 02
CRONOGRAMA FISICO FINANCIERO

ın por Contratación Directa N° 42/2022 - Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty del
de Encarnación - Plurianual con ID: 421021

ATISTA: Rolando Javier Cano Benitez	**CONTRATO N°:** 09/2023
) DE LA OFERTA: 75.250.000 gs	**PLAZO:** 120 dias
°: 1	**FECHA:** 15/12/2023

Refacción en la Junta de Saneamiento del Barrio Kurupayty			Rolando J. Cano		PLAZO DE EJECUCIÓN: 120 dias					TOTAL
Descripción del Bien	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**OCTUBRE** 19/10/2023	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	**ENERO**	**FEBRERO** 16/02/2024	
Colocacion de hormigon armado	Unidad									
Piso de hormigón armado de 0,10 m, alisado con helicóptero fck=210 kg/cm2	Costo por Mil	188	230.000	43.240.000		43.240.000				100%
Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad									
Piso vinilico sobre estructura de madera	Unidad	60	236.000	14.160.000			14.160.000			100%
Revoques	Unidad									
Revoque	Unidad	255	39.000	9.945.000	9.945.000					100%
Servicio de pintura	Unidad									
Pintura interior al latex	Unidad	255	31.000	7.905.000				5.270.000	2.635.000	100%
Precio Total				**75.250.000**						

TO MENSUAL EN GUARANIES	9.945.000	43.240.000	14.160.000	5.270.000	2.635.000	75.250.000
TO MENSUAL EN PORCENTAJE	13,22%	57,46%	18,82%	7,00%	3,50%	100%

Rolando Javier Cano Benitez
CONTRATISTA
Rolando ...
Tec. en Construcc...
C.I. 3.470.767

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Fiscal de Obras
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

María Lidia Plano de Exeza
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa
