CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física
Dpto. de Obras y Proyectos

Compromiso con la gente

INFORME TECNICO

TOMAS FOTOGRAFICAS DE TRABAJOS REALIZADOS SEGÚN ORDEN DE TRABAJO N°04/2021

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) N° 01/2021 – CONTRATO N° 18/2021 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS SEDES DE LOS JUZGADOS DE PAZ Y PRIMERA INSTANCIA DE ALTO PARAGUAY – CONTRATO ABIERTO" ID 392289.-

JUZGADO DE PAZ DE PUERTO GUARANÍ – CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE ALTO PARAGUAY

Concluyeron los trabajos previstos para el mantenimiento del edificio del Juzgado de Paz dentro del marco del referido contrato, se describen a continuación los trabajos realizados en forma general:

1. Reparación de pisos, previo demolición de los sectores de pisos con asentamiento y posterior relleno y compactación del mismo.
2. Reparación de ladrillos en fachada, se procedió a la sustitución integral de todas las piezas faltantes y/o deterioradas en las fachadas del edificio.
3. Reaparición integral de la muralla perimetral, se realizó una submuracion, se agregaron pilares y zapatas de hormigón armado para reforzar la estructura existente, además del envarillado de los mismos.
4. Reparación de fisuras en paredes, se realizó una inspección general de todas las paredes, detectando y sub sanando todas las fisuras existentes en el edificio por medio de varillas y posterior revoque.
5. Mantenimiento del sistema eléctrico e iluminación, se realizó una inspección integral del sistema eléctrico, se sustituyeron cables que no poseían el diámetro adecuado para la carga del edificio, se sustituyeron las los artefactos de iluminación interior y exterior del edificio.
6. Mantenimiento general de equipos de acondicionadores de aire y cambio de desagües de los mismos.
7. Impermeabilización de losas frontal y posterior y aislaciones en general.
8. Mantenimiento y sustitución de puerta de acceso principal, cambio de frenos de piso.
9. Tratamiento de limpieza y pintura de paredes de ladrillos vistos en fachada exterior.
10. Pintura integral de las paredes interiores del edificio, muralla y carpintería metálica.

Es mi informe.-

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

D.I.F.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física
Dpto. de Obras y Proyectos

Compromiso con la gente

PROCESO DE TRABAJOS REALIZADOS Y CULMINADOS

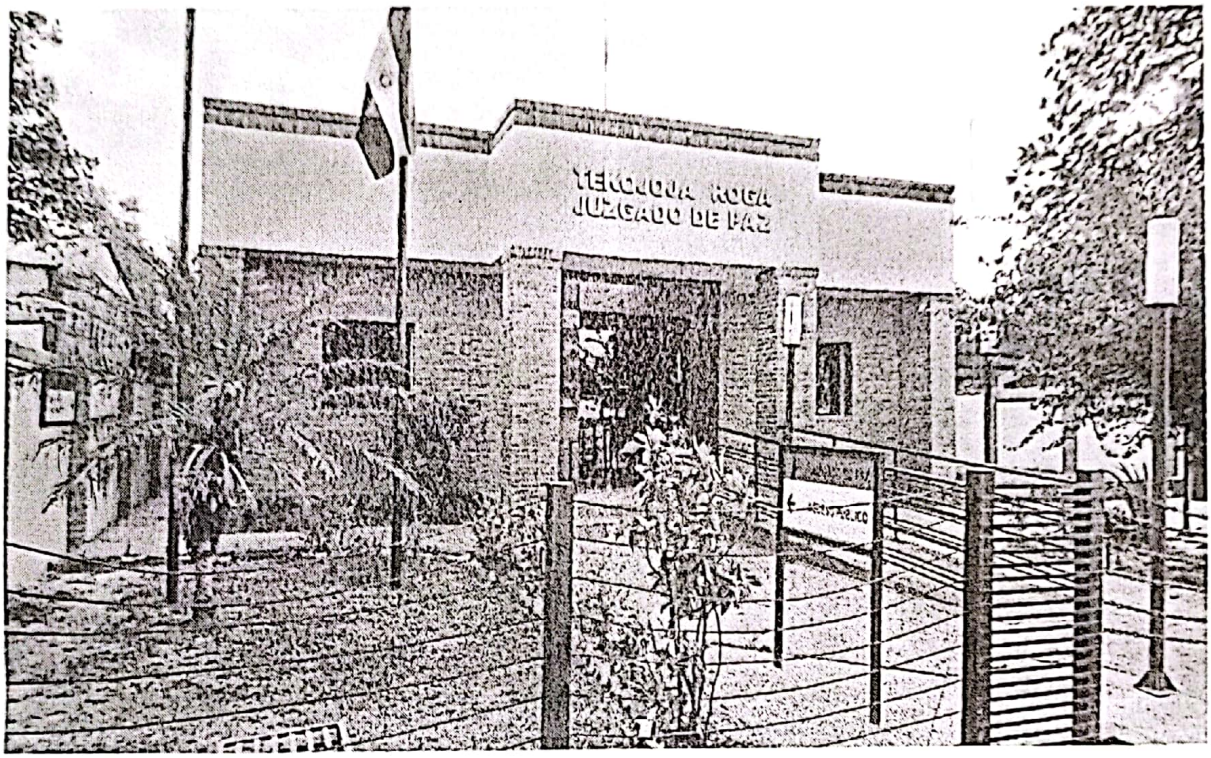

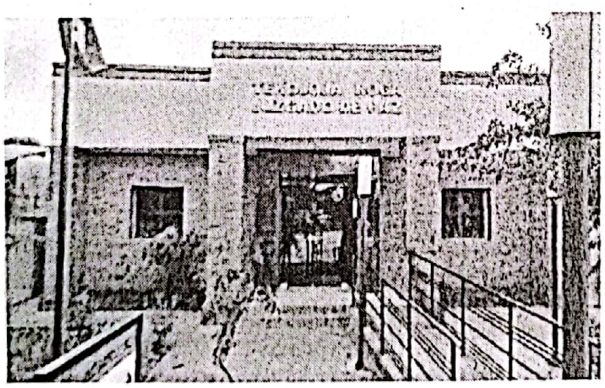

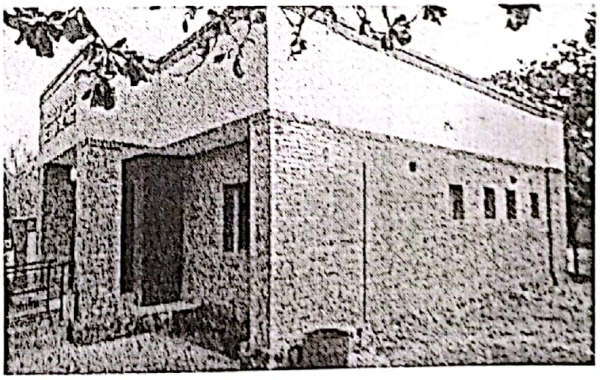

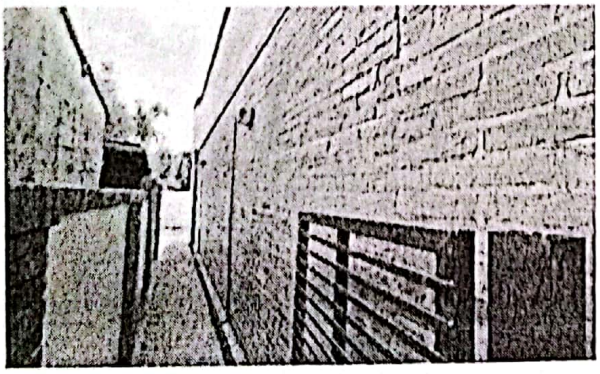

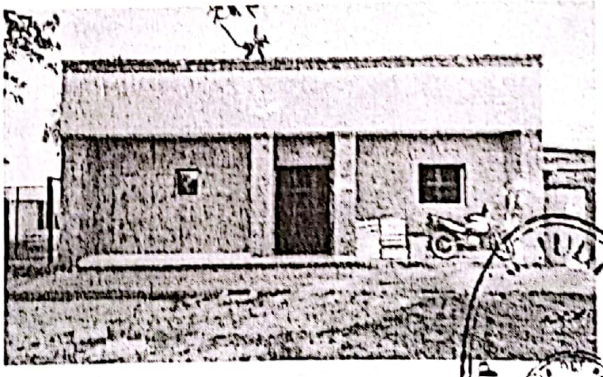

Diego Báez Vega

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física
Dpto. de Obras y Proyectos

Compromiso con la gente

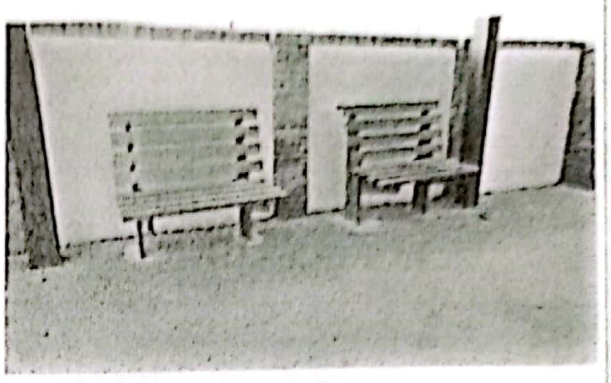
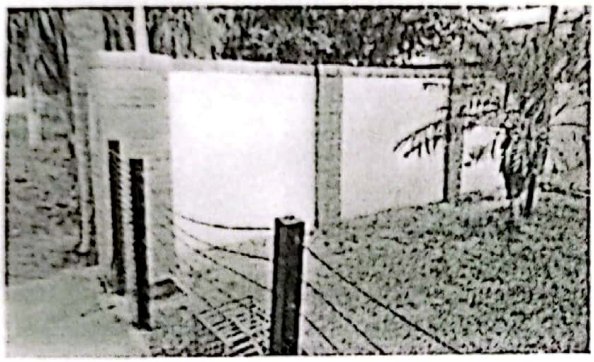
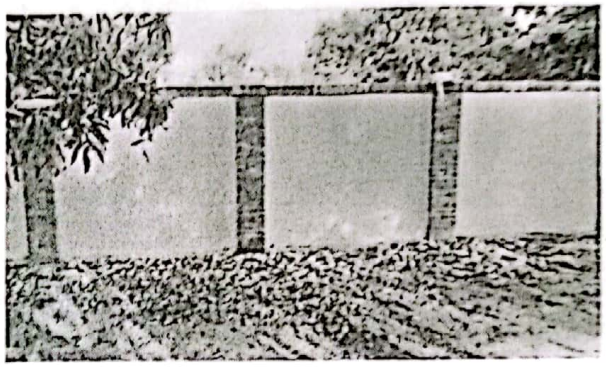
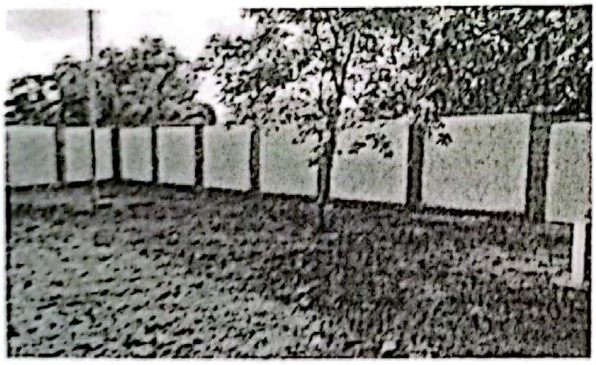
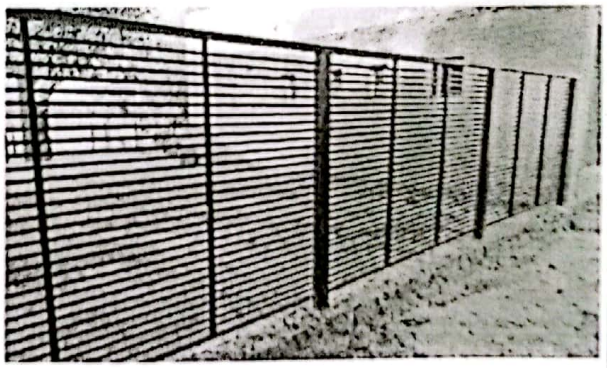
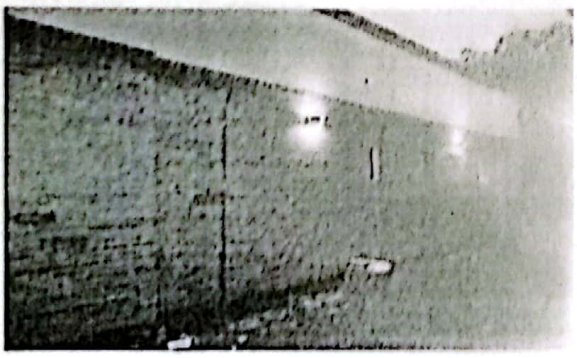


Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física
Dpto. de Obras y Proyectos

Compromiso con la gente

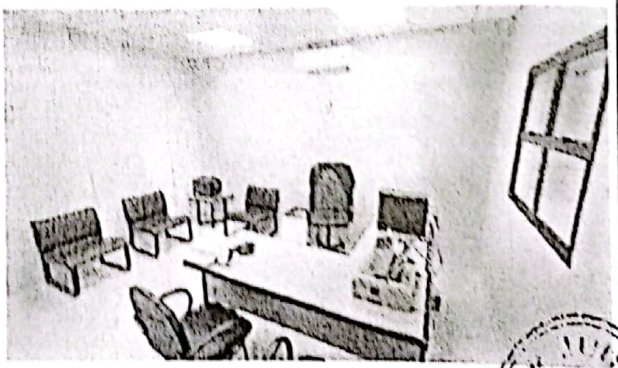

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Infraestructura Física
Dpto. de Obras y Proyectos

Compromiso con la gente

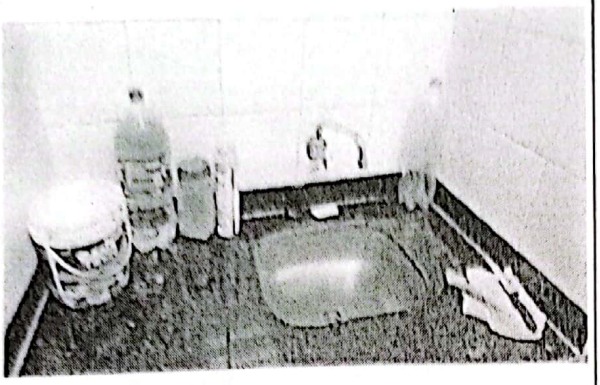

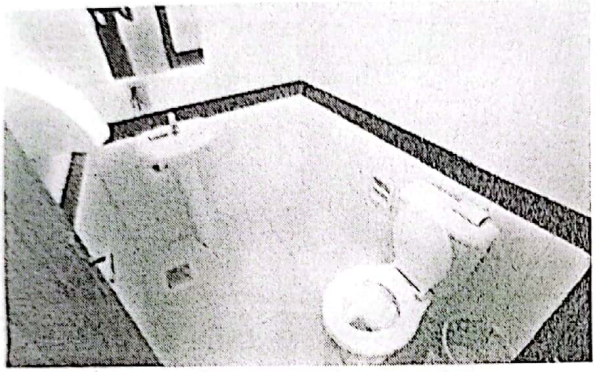

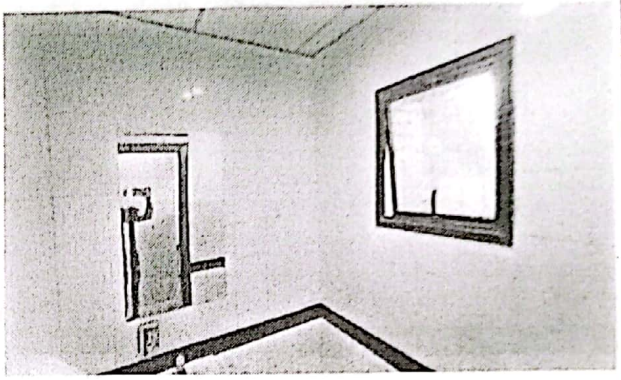

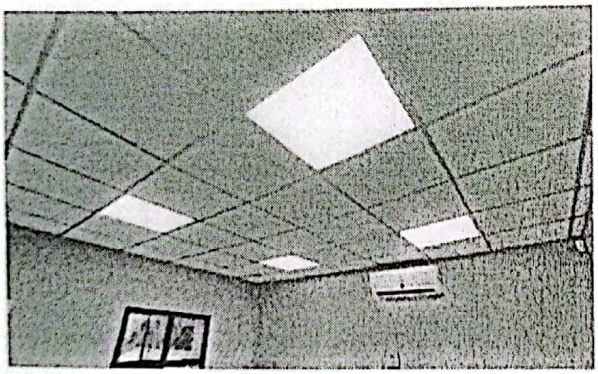

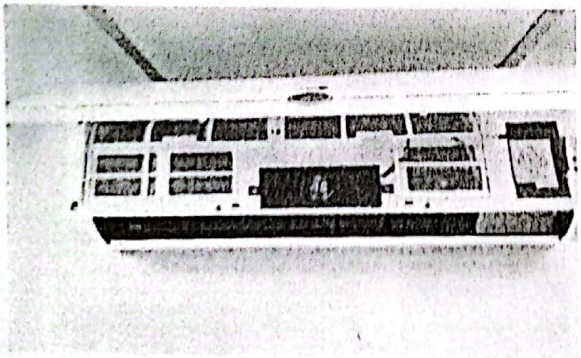

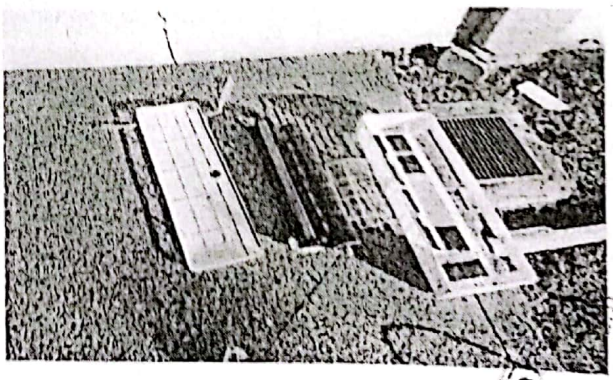

Fecha: 05/07/2022.-

Diego Báez Vega
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.
