Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°05/2023 ID Nº 430.432

DISTRITO BENEFICIARIO:

COMPAÑÍA SAN ANTONIO – CORONEL OVIEDO – DTO. DE CAAGUAZU

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

ARQ. ROSANNA PATRICIA VÁZQUEZ

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2023 -

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

OBRA ANALIZADA:

CONTRUCCIÓN DE TINGLADO - LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N° 05/2023 ID Nº 430.432.-

FECHA:

29 DE MAYO DE 2023

CIUDAD:

CORONEL OVIEDO. -

RESUMO

Realizo las visitas de inspección a los sitios especificados en el contrato con orden de inicio de las mismas en fecha 09/05/2023 con un plazo de ejecución de 150 días. Procedo a las observaciones de los procesos constructivos. Estas verificaciones in situ corresponden a la **CERTIFICACION DE OBRAS Nº 1**, adjudicadas a la empresa **INNOVARQ**

Presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Una vez realizadas las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de ejecución, he aquí el informe de obras respectivo. -

OBSERVACIONES

Ninguna. -

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

Certificado de obras Nº 1.-

Arq. Victor Menedeta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Ítem	Descripción del Bien	CANTIDAD CERTIFICADO		
		% Presente Certificado	% Acumulado hasta el Certificado anterior	% Acumulado hasta presente Certificado
1	Demolición y retiro de Estructura Preexistente	100%	0%	100%
2	Marcación y Replanteo	100%	0%	100%
3	Relleno y compactación	100%	0%	100%
4	Cartel de Obra de 1.2 x 1.8 con marco metálico y plotter	100%	0%	100%
5	Zapatas H° Aisladas	100%	0%	100%
6	Pilares H° de 30x40 con acabado de Hormigón a la vista	50%	0%	50%
7	Vigas H° de Arriostramiento Inf.	100%	0%	100%
8	Piso de Hormigón Armado Acabado Helicoterado	15%	85%	100%
9	Cubierta superior de chapa zinc tipo acanalada sobre estructura metalico de Perfil y angulos con columnas de varilla conformada 20x40 (Varillas de 20mm - 10mm - 8mm) con 2 arcos metalicos	20%	0%	20%
10	Circuito de Alimentación Eléctrica	0%	0%	0%
11	Circuito de Distribución Eléctrica	0%	0%	0%
12	Colocación de Artefactos Luminicos tipo reflector Led	0%	0%	0%
13	Tablero Electrico Principal	0%	0%	0%
14	Pintura de marcación para pista	0%	0%	0%
15	Pintura tipo recina acrilica para pista	0%	0%	0%
16	Pintura Acrilica a dos manos en columnas de H°A°	0%	0%	0%
17	Canaleta pluvial de chapa galvanizada Nro. 26	0%	0%	0%
18	Ductos de bajada pluvial	0%	0%	0%
19	Ductos de desague pluvial subterrano	100%	0%	100%
20	Canaleta de hormigón a cielo abierto	100%	0%	100%
21	Limpieza Final	0%	0%	0%
Precio Total				
		PORCENTAJE CERTIFICACION		33,60

SE ADJUNTA RESPALDO FOTOGRAFICO

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

Arq. Víctor Menchieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

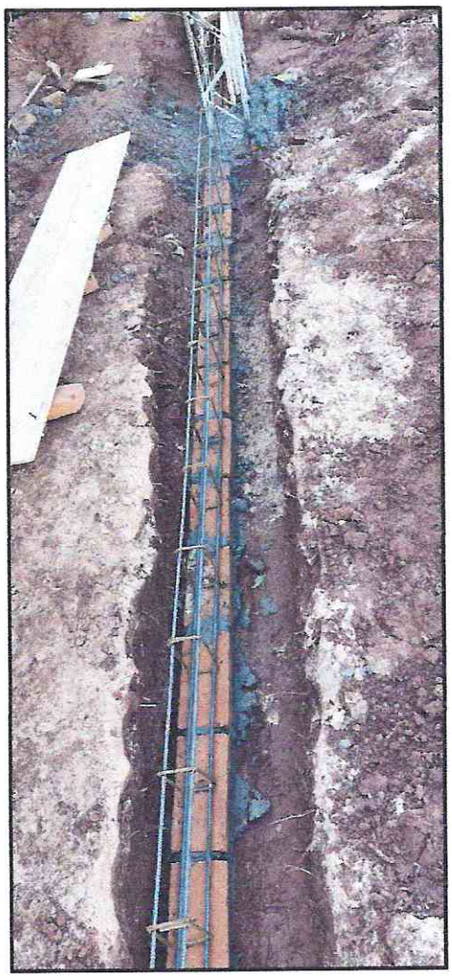

Arq. Víctor Menéndez
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú
