Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

Obra: Consruccion de aula Inicial

Lugar: Escuela Basica Nº6265 Cristo Rey

LOC: Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01 — CERTIFICADO ACTUAL

N.º	RUBRO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTOS
1	Cartel de Obra	un	3,6	649.264	2.337.350	0	0	0
2	Preparación de la obra a- Limpieza y preparación del terreno	m2	85	9.289	789.565	85	100	789.565
3	Destronque de arboles	un	1	245.304	245.304	1	100	245.304
4	Preparación de la obra b- Replanteo	m2	85	8.284	704.140	85	100	704.140
5	Excavación y carga de cimiento de PBC.	m3	18	310.077	5.581.386	18	100	5.581.386
6	Estructura de H° A° : a- Zapatas, pilares y encadenados de H° A°	m3	6,69	1.706.765	11.418.258	6,69	100	11.418.258
7	Muros de nivelación : a- De 0,45 cm.	m2	7	202.270	1.415.890	7	100	1.415.890
8	Muros de nivelación :b- De 0,30 cm.	m2	21	139.841	2.936.661	21	100	2.936.661
9	Relleno y apisonado de interiores	m3	35	104.881	3.670.835	35	100	3.670.835
10	Aislación asfaltica horizontal:a- De paredes	m2	14	24.971	349.594	14	100	349.594
11	Muros de elevación :a- De 0,30 para revocar	m2	21	139.841	2.936.661	21	100	2.936.661
12	Muros de elevación :b- De 0,15 para revocar	m2	46	94.892	4.365.032	46	100	4.365.032
13	Muros de elevación :a- De 0,30 visto una cara de ladrillo comun	m2	30	159.818	4.794.540	30	100	4.794.540
14	Muros de elevación :c- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comun c/ cantero - parapeto	m2	25	81.907	2.047.675	25	100	2.047.675
15	Muros de elevación :d- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	43	18.978	816.054	43	100	816.054
16	Pilares :a- De 0,30 x 0,45 para revocar	ml	9	119.864	1.078.776	9	100	1.078.776
17	Cubierta de chapa termoacústica, trapezoidal superior color teja panel inferior liso color blanco y con núcleo de poliuretano inyectado, espesor 40 mm. Sobre correa de perfil rectangular 80x40x2 mm.	m2	130	510.878	66.414.140	0	0	0
18	Revoque :a- De paredes interior y exterior a una capa	m2	164	30.465	4.996.260	82	50	2.498.130
19	Revoque :b- De pilares	m2	10,8	30.465	329.022	10,8	100	329.022
20	Revoque :c- De nivelacion	m2	18	30.465	548.370	18	100	548.370
21	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	73	35.959	2.625.007	73	100	2.625.007
22	Piso ceramico	m2	73	94.892	6.927.116	0	0	0
23	Zocalo ceramico	ml	40	20.976	839.040	0	0	0
24	Aberturas de maderas :a de marco 0,15 y puerta de 0,70 x,210 tablero	un	1	958.913	958.913	0	0	0
25	Aberturas de maderas :b- de marco de 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x1,20	un	2	781.114	1.562.228	0	0	0
26	Aberturas metalicas :a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,50(dos hojas) con marco y herrajes	un	1	898.980	898.980	0	0	0
27	Aberturas metalicas :b-Ventanas balancines 1,50x1,70	m2	10,2	299.660	3.056.532	0	0	0
28	Aberturas metalicas :b-Ventanas balancines 1,50x1,00 p/ sshh	m2	6	307.651	1.845.906	0	0	0
29	Revestimiento de azulejo	m2	21,5	88.899	1.911.329	0	0	0
30	Camara de inspeccion 0,60x0,60m (Según EE.TT.)	un	2	374.575	749.150	2	100	749.150
31	Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 metros	gl	1	3.113.138	3.113.138	1	100	3.113.138
32	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 m	un	1	3.816.329	3.816.329	1	100	3.816.329

Municipalidad de Minga Guazú — Dirección Obras y Servicios — Período 2021-2025

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

33	Provisión y colocación de Lavatorio con griferia (Según EE.TT.)	un	4	649.264	2.597.056	0	0	0
34	Mesada de granito (Según EE.TT.)	m2	1,56	749.150	1.168.674	0	0	0
35	Provisión y colocación de Inodoro	un	2	869.014	1.738.028	0	0	0
36	Alfeizar en aberturas :a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	49	24.971	1.223.579	0	0	0
37	Alfeizar de ventanas :b- De ladrillos comunes tipo sardinel	ml	3,5	61.929	216.752	0	0	0
38	Pinturas :a- De parededes al latex	m2	146	23.972	3.499.912	0	0	0
39	Pinturas :b- De abertura de madera c/ barniz	m2	3,36	28.967	97.329	0	0	0
40	Pinturas :c-de mamposteria visto comun latex	m2	60	24.472	1.468.320	0	0	0
41	Pinturas :d- de revoque comun al latex	m2	58	24.472	1.419.376	0	0	0
42	Pinturas :e- De estructura metalica de techo con pintura sintetica	m2	49	30.964	1.517.236	0	0	0
43	Pinturas :f- De aberturas metalicas balancines y puerta de acceso	m2	21	29.995	629.895	0	0	0
44	Colocacion de Vidrios	m2	16	119.864	1.917.824	0	0	0
45	Desague Pluvial- Canaleta y caño de bajada	ml	28,8	80.908	2.330.150	0	0	0
46	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	38,8	79.909	3.100.469	0	0	0
47	Instalacion electrica, conexiones y artefactos de iluminacion	gl	1	6.952.119	6.952.119	0	0	0
48	Instalacion sanitaria, agua corriente y desague cloacal	gl	1	8.590.262	8.590.262	0	0	0
49	Rampa (incluye baranda metalica según especificaciones tecnicas)	gl	1	609.309	609.309	1	100	609.309
50	Limpieza Final	un	1	1.076.779	1.076.779	0	0	0
MONTO TOTAL					186.232.250	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		57.438.826

Monto de Certificado	57.438.826
Descuento de Anticipo	18.623.225
Fondo de Reparo	2.871.941
Total a Pagar por Certificado	35.943.660

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Elián CONSTRUCCIONES

de: Juan Carlos Bernal Rodríguez

Construcciones de Edificios
Comercio al por menor de otros Materiales de Construcción
Tales como ladrillos, madera y equipos sanitarios

CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVILES * PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y CALZADAS

Av. Fortín Toledo y Bolivia · Tel:.(061) 574 293 / (0983) 400 102 · Ciudad del Este · Alto Paraná · Paraguay

TIMBRADO Nº 17017235
R.U.C.: 880202 - 5
Fecha Inicio de Vigencia 08/02/2024
Fecha Fin de Vigencia 28/02/2025

FACTURA

0001510

001-001

Fecha de Emisión: 06 de Marzo de 20 24 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazu

R.U.C.: 800104 78-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Km 16 Minga Guazu Tel.: 064429666

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Ventas Exentas	5%	10%
1	Certificado de Obras Nº 01. Construccion de aula inicial. Escuela Basica Nº 6265 Cristo Rey. Contrato Nº 36/23. Lote Nº 01 ID Nº 435976	35.943.660			35.943.660
	Sub Total				35.943.660
	Total a Pagar: Treinta y cinco millones novecientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta.				35.943.660

Liquidación del IVA: 5% 10% 3.267.605 **Total IVA** 3.267.605

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrian Jara Y Pa i Perez. entre Banco Vision Y Banco Atlas Nº 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia el mas Vencedor" - RUC 80052469/1- Telefax: 061-512551 - **02 Tal 50x3 del 0001501 al 0001600 - 02/2024** - Cédula de Habilitación de Imprenta Nº 1663

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad (Sin Valor Fiscal)

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc	: 8802025	JUAN CARLOS BERNAL RODRIGUEZ	
Teléfono/s	: 061-574293	**Website**	:
Fax	: 061-574293	**Email Corp.:**	elianconstruciones@hotmail.com
Dirección	: AVENIDA, AV. FORTIN TOLEDO Y LA BLANCA - ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)		
Estado	: Activo		

Se registró en REPSE bajo el N° 014867

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 18/10/2024

Otorgado en Asunción, el 18/10/2018

Renovado el 03/11/2022

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

8802025

13042023 1448 8802025 8802025

014867

Lote 5674878086 , Cons.: 7

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270171954268

FECHA 06/03/2024

FORM.427-1

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	880202	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	5	BERNAL RODRIGUEZ JUAN CARLOS

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. N° 194 DE LA LEY N° 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY N° 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 05/04/2024

NÚMERO DE CONTROL : 98A7090A

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427188020298A7090A

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 880202

NRO. CERTIFICADO: 420803

FECHA EMISION: 15-02-2024

VENCIMIENTO: 14-03-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 880202

Nro. Certificado: 420803

Razon Social: BERNAL RODRIGUEZ JUAN CARLOS

Actividad(es): CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS FÉRREAS, PUENTES Y TÚNELES

Fecha de Inscripcion: 14-11-2003

Cantidad de Asegurados: 1

Nro. Patronal(es): 0505-84-0479 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N) EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:
http://servicios.ips.gov.py/constancia/

Elián CONSTRUCCIONES
Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Licitación 435976 - CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/23 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AULA NIVEL INICIAL Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024

Contrato Nº 36/23 Lote 02 - Construcción de Aula Nivel Inicial Escuela Básica Nº 6265 Cristo Rey

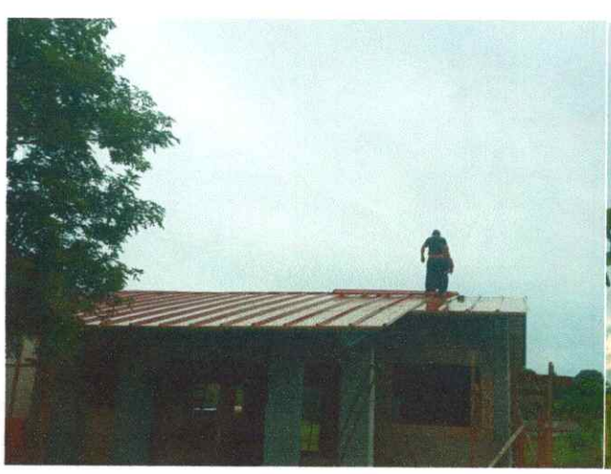

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Elián CONSTRUCCIONES
Av. Fortín Toledo y La Blanca – Km. 6 – Barrio Don Bosco Ciudad del Este
Tel.: (061) 574 293 – Cel. :(0983) 400 102.-

Licitación 435976 - CONCURSO DE OFERTAS Nº 08/23 CONSTRUCCIÓN DE AULAS, AULA NIVEL INICIAL Y PISTA EN DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. PLURIANUAL EJERCICIOS 2023/2024

Contrato Nº 36/23 Lote 3 - Construcción de Pista Esc. Bas. Nº. 7855 Juan Pablo II - Km 30 Monday - Asentamiento Primavera

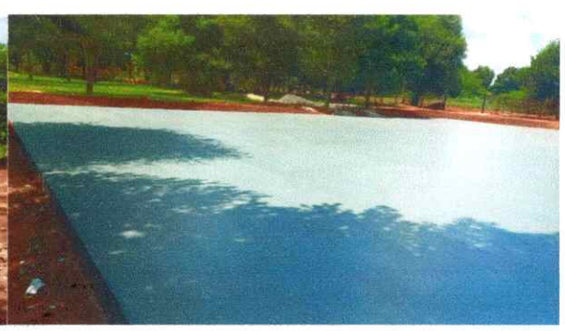

CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay
